
Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration

Daniel Massa

01.11.2026

Inhaltsverzeichnis

Abschlussprüfung Sommer 2026	4
Certified IT Business Manager (IHK)	4
Projektarbeit im Rahmen der Prüfung zum Certified IT Business Manager (IHK)	4
SPERRVERMERK	5
VORWORT	5
I. Einleitung	5
II. Projektumfeld	6
III. Meine Tätigkeiten im Unternehmen	6
IV. Allgemeine Informationen	6
INHALTSVERZEICHNIS	6
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	8
TABELLENVERZEICHNIS	9
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	10
1 Projektinitiierung	12
1.1 Projektumfeld	12
1.2 Ausgangssituation	12
1.3 Ist-Analyse	13
1.4 SWOT-Analyse	14
1.5 Problemstellung	15
1.6 Rahmenbedingungen	15
1.6.1 Zeitliche Rahmenbedingungen	16
1.6.2 Finanzielle Rahmenbedingungen	16
1.6.3 Technische Rahmenbedingungen	16
1.6.4 Organisatorische Rahmenbedingungen	17
1.6.5 Rechtliche Rahmenbedingungen	17
1.7 Soll-Konzept	18
1.8 Projektziele nach SMART	18
1.9 Projektbegründung	19
1.10 Projektabgrenzung	19
1.11 Projektschnittstellen	19
1.12 Projektauftrag	20
2 Projektplanung	20
2.1 Vorgehensmodell	20
2.2 Projektphasen	21

2.3 Projektstrukturplan (PSP)	21
2.4 Arbeitspakete	22
2.5 Meilensteinplanung	23
2.6 Ressourcenplanung	24
2.7 Kostenplanung	25
2.8 Kommunikationsplanung	25
2.9 Risikoanalyse	25
2.10 Qualitätsplanung	26
2.11 Abweichungen vom Projektantrag	26
3 Analyse und Konzeption	27
3.1 Anforderungsanalyse	27
3.2 Lastenheft / Fachkonzept	28
3.3 Stakeholderanalyse	28
3.4 Make-or-Buy-Entscheidung	29
3.5 Machbarkeitsanalyse	30
3.6 Wirtschaftlichkeitsanalyse	30
3.7 Nutzwertanalyse	31
3.8 Zero-Trust-Konzept	32
3.9 RBAC-Modell	33
3.10 Lenkungsausschuss	33
3.11 Rolle des Projektleiters	34
3.12 Datenschutz- und Sicherheitskonzept	34
4 Technischer Entwurf	34
4.1 Zielplattform	34
4.2 Architekturdesign	35
4.3 GitHub-Workflow-Integration	36
4.4 Self-Service-Prozess	37
4.5 Datenmodell	38
4.6 Geschäftslogik	39
4.7 Audit-Logging	40
4.8 Schnittstellen	41
4.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung	41
4.10 Pflichtenheft / Datenverarbeitungskonzept	41
5 Umsetzung	42
5.1 Aufbau der Entwicklungsumgebung	42
5.2 Implementierung der Datenstrukturen	42

5.3 Implementierung des RBAC-Modells	42
5.4 Implementierung der Benutzeroberfläche	43
5.5 Implementierung der GitHub-Automatisierung	43
5.6 Implementierung der Geschäftslogik	44
5.7 Implementierung der Audit-Protokollierung	44
5.8 Implementierung der Qualitätssicherung	44
5.9 Entwicklerdokumentation	44
6 Test und Abnahme	45
6.1 Testkonzept	45
6.2 Funktionstests	45
6.3 Integrationstests	46
6.4 Security-Tests	46
6.5 Datenschutzprüfung	46
6.6 Testfallmatrix	47
6.7 Fehleranalyse	47
6.8 Soll-Ist-Vergleich	48
6.9 Abnahme	50
7 Einführung und Dokumentation	51
7.1 Einführungskonzept	51
7.2 Pilotbetrieb	51
7.3 Schulung	51
7.4 Change Management	51
7.5 Benutzerdokumentation	52
7.6 Betriebsdokumentation	52
7.7 Übergabe	52
8 Projektabschluss	52
8.1 Projektergebnis	52
8.2 Soll-Ist-Vergleich (wirtschaftlich)	52
8.3 Wirtschaftliche Bewertung	53
8.4 Lessons Learned	53
8.5 Risiken nach Projektabschluss	53
8.6 Ausblick	54
8.7 Persönliches Fazit	54
LITERATURVERZEICHNIS	55
Normen & Standards	55

Fachliteratur	55
Projektmanagement	55
IT-Security & Compliance	55
EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG	56
ANHANG	57
A1 Detaillierte Zeitplanung	57
A2 Lastenheft-Auszug	60
A3 Use-Case-Diagramm	62
A4 Pflichtenheft-Auszug	63
A5 Datenmodell	65
A6 EPK-Prozessbeschreibung	66
A7 Oberflächenentwürfe (Wireframes)	70
A8 Screenshots der Anwendung	71
A9 Entwicklerdokumentation	76
A10 Testfall Konsole	78
A11 Schnittstellenübersicht	79
A12 Klassendiagramm	80
A13 Benutzerdokumentation	81
A14 Datenschutz-Checkliste	82
A15 Abnahmeprotokoll	84

Abschlussprüfung Sommer 2026

Certified IT Business Manager (IHK)

Projektarbeit im Rahmen der Prüfung zum Certified IT Business Manager (IHK)

Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration

Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-basierter Workflow-Integration

Abgabedatum: Stuttgart, den 01.11.2026

Prüfungsbewerber: Daniel-Alfonsin Massa Prüflingsnummer: 615951 Hackstraße 41
70190 Stuttgart

Ausbildungsbetrieb: Verein zur Förderung der Berufsbildung e.V. Kurfürstenstraße 6
71636 Ludwigsburg

Betreuer im Betrieb: Carsten Vordermeier

IHK-Betreuer: Frau Dr. Sabine Wagner, IHK Stuttgart

SPERRVERMERK

Die vorliegende Projektdokumentation mit dem Titel

Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration

enthält vertrauliche Informationen und Daten des Vereins zur Förderung der Berufsbildung e.V. (VFB). Die Weitergabe oder Vervielfältigung – auch in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Unternehmens und des Verfassers nicht gestattet. Die Einsichtnahme durch Dritte bedarf der vorherigen Genehmigung und ist ausschließlich für den Prüfungsprozess der IHK Region Stuttgart gestattet.

VORWORT

I. Einleitung

Die vorliegende Projektarbeit entstand im Rahmen der Prüfung zum **Certified IT Business Manager (IHK)** der IHK Region Stuttgart. Sie dokumentiert die Planung, Konzeption und prototypische Umsetzung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-basierter Workflow-Integration beim Verein zur Förderung der Berufsbildung e.V. (VFB) in Ludwigsburg.

II. Projektumfeld

Der VFB ist ein regionaler Bildungsträger mit rund 50 Beschäftigten und mehreren hybriden Lernplattformen. Als zertifizierter Weiterbildungsanbieter unterliegt der VFB besonderen Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit. Die zunehmende Digitalisierung der Bildungsangebote und die Einführung cloudbasierter Lernplattformen erforderten eine Neugestaltung der Zugriffs- und Rechteverwaltung nach dem Zero-Trust-Prinzip.¹

III. Meine Tätigkeiten im Unternehmen

Als Projektleiter und angehender IT Business Manager war ich für die eigenständige Planung, Durchführung und Dokumentation des gesamten Projekts verantwortlich. Meine Aufgaben umfassten die Ist-Analyse, die Konzeption des RBAC-Modells, die technische Umsetzung des Prototyps, die Testdurchführung sowie die Erstellung der vollständigen Projektdokumentation. Die Zusammenarbeit mit dem IT-Administrator, dem Datenschutzbeauftragten und der Geschäftsführung erfolgte in regelmäßigen Abstimmungen.

IV. Allgemeine Informationen

In dieser Projektarbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die Arbeit umfasst einen Zeitraum von 14 Wochen mit einem Gesamtaufwand von 70 Stunden.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	I Einleitung	II Projektumfeld
III Meine Tätigkeiten	IV Allgemeine Informationen	V SPERRVERMERK
VI ABBILDUNGSVERZEICHNIS	VII TABELLENVERZEICHNIS	

¹Vgl. Kindervag, J. (2010). "No More Chewy Centers: Introducing the Zero Trust Model of Information Security." Forrester Research; sowie Rose, S. et al. (2020). "Zero Trust Architecture." NIST Special Publication 800-207.

.....	VIII	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		IX	1	Pro-	
jektinitiierung		1	1.1	Projektumfeld		2	1.2
Ausgangssituation		3	1.3	Ist-Analyse		4	1.4
Problemstellung		5	1.5	Soll-Konzept			
6	1.6	Projektziele nach SMART		7	1.7	Projektbegründung	
.....	8	1.8	Projektabgrenzung		9	1.9	Projek-
tschnittstellen		10	1.10	Projektauftrag		11	2
Projektplanung		12	2.1	Vorgehensmodell			
13	2.2	Projektphasen		14	2.3	Projektstrukturplan	
.....	15	2.4	Arbeitspakete		16	2.5	Meilen-
steinplanung		17	2.6	Ressourcenplanung			
18	2.7	Kostenplanung		19	2.8	Kommunikationsplanung	
.....	20	2.9	Risikoanalyse		21	2.10	Qual-
itätsplanung		22	2.11	Abweichungen vom Projektantrag			
.....	23	3	Analyse und Konzeption		24	3.1	Anforderungs-
analyse		25	3.2	Lastenheft / Fachkonzept		26	
3.3	Stakeholderanalyse		27	3.4	Make-or-Buy-Entscheidung		
.....	28	3.5	Wirtschaftlichkeitsanalyse		29	3.6	Nutzw-
ertanalyse		30	3.7	Zero-Trust-Konzept			
31	3.8	RBAC-Modell		32	3.9	Datenschutz- und Sicher-	
heitskonzept		33	4	Technischer Entwurf		34	4.1
Zielplattform		35	4.2	Architekturdesign			
36	4.3	GitHub-Workflow-Integration		37	4.4	Self-Service-Prozess	
.....	38	4.5	Datenmodell		39	4.6	Geschäft-
slogik		40	4.7	Audit-Logging		41	4.8
Schnittstellen		42	4.9	Maßnahmen zur Qualitätssicherung			
.....	43	4.10	Pflichtenheft / Datenverarbeitungskonzept		44	5	Um-
setzung		45	5.1	Aufbau der Entwicklungsumgebung			
.....	46	5.2	Implementierung der Datenstrukturen		47	5.3	Im-
plementierung des RBAC-Modells		48	5.4	Implementierung der Benutze-			
roberfläche		49	5.5	Implementierung der GitHub-Automatisierung			
50	5.6	Implementierung der Geschäftslogik		51	5.7	Implementierung	
der Audit-Protokollierung		52	5.8	Implementierung der Qualitätssicherung			
.....	53	5.9	Entwicklerdokumentation		54	6	Test und Abnahme
.....	55	6.1	Testkonzept		56	6.2	Funktion-
stests		57	6.3	Integrationstests		58	6.4
Security-Tests		59	6.5	Datenschutzprüfung			
60	6.6	Testfallmatrix		61	6.7	Fehleranalyse	

62	6.8 Soll-Ist-Vergleich	63	6.9 Abnahme
64	7 Einführung und Dokumentation	65	7.1 Einführungskonzept
66	7.2 Pilotbetrieb	67	7.3 Schulung
68	7.4 Change Management	69	7.5 Benutzerdokumentation
70	7.6 Betriebsdokumentation	72	8 Projektabschluss
71	7.7 Übergabe	74	8.1 Projektergebnis
73	8.2 Soll-Ist-Vergleich	75	8.3 Wirtschaftliche Bewertung
76	8.4 Lessons Learned	77	8.5 Risiken nach Projektabschluss
78	8.6 Ausblick	79	8.7 Persönliches Fazit
80	Literaturverzeichnis	i	Abkürzungsverzeichnis
ii	Abbildungsverzeichnis	iii	Tabelleverzeichnis
iv	Anhang	v	A1 Detaillierte Zeitplanung
vi	A2 Lastenheft-Auszug	vii	A3 Use-Case-Diagramm
viii	A4 Pflichtenheft-Auszug	ix	A5 Datenmodell
x	A6 EPK-Prozessbeschreibung	xi	A7 Oberflächenentwürfe
xii	A8 Screenshots der Anwendung	xiii	A9 Entwicklerdokumentation
xiv	A10 Testfall Konsole	xv	A11 Schnittstellenübersicht
xvi	A12 Klassendiagramm	xvii	A13 Benutzerdokumentation
xviii	A14 Datenschutz-Checkliste	xix	A15 Abnahmeprotokoll
xx	Eidesstattliche Erklärung	xxi	

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb.	Titel	Kapitel
1	Projektstrukturplan (PSP)	2.3
2	Use-Case-Diagramm	3.3
3	Stakeholder-Matrix	3.3
4	Risiko-Matrix	2.9
5	Meilensteintrendanalyse (MTA)	2.5

Abb.	Titel	Kapitel
6	GitHub Workflow für automatisierte Rechtevergabe	4.3
7	Self-Service-Prozess	4.4
8	RBAC-Datenmodell (ERD)	4.5
9	Audit-Log-Prozess	4.7
10	Beispielhafter Testfall mit Soll-Ist-Ergebnis	6.6
11	DSGVO-Checkliste zur Rollen- und Zugriffskontrolle	3.9
12	Vergleichsmatrix Identity-Management-Systeme	3.4
13	Rollout-Plan	7.1
14	Abnahmeprozess	6.9
15	Meilensteintrendanalyse (MTA)	2.5
16	SWOT-Analyse	1.4

TABELLENVERZEICHNIS

Tab.	Titel	Kapitel
1	Zeitplanung (Arbeitspakete)	2.3
2	Kostenplanung	2.7
3	Stakeholder-Matrix	3.3
4	Risiko-Matrix	2.9
5	Nutzwertanalyse	3.6
6	Make-or-Buy-Entscheidung	3.4
7	Anforderungsmatrix (Muss/Kann)	3.2
8	Testfallmatrix	6.6
9	Soll-Ist-Vergleich	6.8
10	Kommunikationsmatrix	2.8

Tab.	Titel	Kapitel
11	RACI-Matrix	2.3
12	KPI-Matrix	6.1
13	Amortisationsrechnung	8.3

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
AD	Active Directory
API	Application Programming Interface
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DPIA	Data Protection Impact Assessment (Datenschutz-Folgenabschätzung)
DSB	Datenschutzbeauftragter
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EPK	Ereignisgesteuerte Prozesskette
ERD / ERM	Entity Relationship Diagram / Model
FAQ	Frequently Asked Questions
GitHub	GitHub Enterprise / GitHub.com
HR	Human Resources
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IAM	Identity and Access Management

Abkürzung	Bedeutung
ID	Identifizier
IDP	Identity Provider
IHK	Industrie- und Handelskammer
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information Technology
JSON	JavaScript Object Notation
KI	Künstliche Intelligenz
KPI	Key Performance Indicator
MTA	Meilensteintrendanalyse
NIST	National Institute of Standards and Technology
PSP	Projektstrukturplan
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
ROI	Return on Investment
SAML	Security Assertion Markup Language
SIEM	Security Information and Event Management
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
SP	Special Publication (NIST SP 800-207)
SQL	Structured Query Language
SSO	Single Sign-On
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TDD	Test-Driven Development

Abkürzung	Bedeutung
TOM	Technische und organisatorische Maßnahmen
UAT	User Acceptance Testing
UI/UX	User Interface / User Experience
VFB	Verein zur Förderung der Berufsbildung e.V.
YAML	YAML Ain't Markup Language
Zero Trust	Zero-Trust-Sicherheitsmodell (Never Trust, Always Verify)

1 Projektinitiierung

1.1 Projektumfeld

Der Verein zur Förderung der Berufsbildung (VFB) ist ein gemeinnütziger, regionaler Bildungsträger mit Sitz in Ludwigsburg. Mit rund 50 Beschäftigten und mehreren hybriden Lernplattformen ist die Digitalisierung ein zentraler Unternehmensfokus. Der VFB bietet zahlreiche IHK- und IT-Qualifizierungen an und nutzt hierfür moderne Cloud-Dienste sowie On-Premises-Infrastrukturen. Ziel ist es, mit effizienten, automatisierten Workflows unter Gewährleistung maximaler IT- und Datenschutzvorgaben eine innovative Vorreiterrolle einzunehmen.

Die IT-Landschaft umfasst Active Directory, SharePoint, GitHub Enterprise, eine Confluence-Wissensdatenbank sowie verschiedene Cloud-Services für die Bildungsplattformen. Die Administration der Zugriffsrechte erfolgte bislang über manuelle Prozesse, die mit zunehmender Digitalisierung an ihre Grenzen stießen.

1.2 Ausgangssituation

Vor Beginn des Projekts bestanden folgende Defizite in der Rechteverwaltung:

- **Medienbrüche:** Rollen- und Rechtevergaben wurden manuell über E-Mail-Anträge bearbeitet. Ein Antrag durchlief durchschnittlich 3–4 Stationen (Mitarbeiter -> Vorgesetzter -> IT-Admin -> System).
- **Fehleranfälligkeit:** Die durchschnittliche Fehlerquote bei manueller Rechtevergabe lag bei 8–12 %, verursacht durch Schreibfehler, Missverständnisse oder fehlende Dokumentation.
- **Hohe Bearbeitungszeit:** Ein Rechteänderungsantrag benötigte durchschnittlich 2,5–3,5 Tage vom Eingang bis zur Umsetzung.
- **Unklare Verantwortlichkeiten:** Audit-Logs waren dezentralisiert über mehrere Systeme verteilt, was Compliance-Prüfungen erheblich erschwerte.
- **Sicherheitslücken:** Fehlende zentralisierte Rechteverwaltung führte zu überhöhten Zugriffsrechten bei ausgeschiedenen Mitarbeitern und unzureichender Transparenz.
- **Keine Self-Service-Funktionen:** Jede Rechteänderung erforderte eine manuelle E-Mail-Kommunikation, eine telefonische Nachfassaktion oder Ticket im Helpdesk.

Pro Woche gingen durchschnittlich 35 manuelle Rechteeanträge ein. Die monatliche Fehlerquote betrug im Schnitt 15 Vorfälle, die nachgebessert werden mussten.

1.3 Ist-Analyse

Die Ist-Analyse wurde als mehrschichtiger Ansatz durchgeführt:

- **Interviews mit Stakeholdern:** Halbstündige Interviews mit 8 Schlüsselpersonen aus IT, Personalabteilung, Finanzen, Management und Betriebsrat
- **Prozessdokumentation:** Dokumentation der existierenden Rechtevergabe-prozesse, Kommunikationswege und des Zuständigkeitsmodells
- **Systeminventaraufnahme:** Verzeichnis aller genutzten IT-Systeme (Active Directory, SharePoint, GitHub Enterprise, Confluence, Cloud-Dienste)
- **Dokumentenanalyse:** Analyse existierender Dokumente (Rechteeantragsvorlagen, Freigabeprotokolle, Audit-Protokolle)
- **Systemprotokollierung:** Auswertung von Log-Daten (Git-Logs, Cloud-Monitoring) zur Erfassung des Ist-Zustands

Die Ergebnisse zeigten folgende Schwachstellen:

- Manuelle Rechtevergabe verursacht durchschnittlich 15 Fehleinrichtungen pro Monat

- Keine standardisierten Prozesse für Rechteentzug bei Austritt
- Audit-fähige Nachweise mussten aus 3 verschiedenen Systemen zusammengesucht werden
- Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Rechtevergabeprozess: 2,1 von 5 Punkten (Umfrage unter 20 Mitarbeitern)

1.4 SWOT-Analyse

Zur umfassenden Bewertung des Projektumfelds wurde eine SWOT-Analyse durchgeführt, die interne Stärken und Schwächen mit externen Chancen und Risiken verbindet:

	Positiv	Negativ
Intern	Stärken (Strengths): Vorhandene GitHub-Enterprise-Infrastruktur, engagierte IT-Abteilung, Unterstützung durch Geschäftsführung, kurze Entscheidungswege	Schwächen (Weaknesses): Manuelle Rechtevergabe ohne Standardisierung, fehlende Dokumentation von Berechtigungen, keine zentrale Audit-Lösung, begrenzte personelle Kapazitäten
Extern	Chancen (Opportunities): DSGVO-konforme Automatisierung als Wettbewerbsvorteil, steigende Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen, Zertifizierungspotenzial, Skalierbarkeit auf andere Bereiche	Risiken (Threats): Zunehmende Cyber-Bedrohungen, steigende Compliance-Anforderungen, Abhängigkeit von GitHub-Cloud-Diensten, Fachkräftemangel in der IT-Sicherheit

Die SWOT-Analyse zeigt, dass die internen Stärken (bestehende Infrastruktur, Management-Support) die Schwächen (manuelle Prozesse) überwiegen und die externen Chancen (Automatisierung, DSGVO-Konformität) die Risiken (Cyber-Bedrohungen) deutlich aufwiegen.

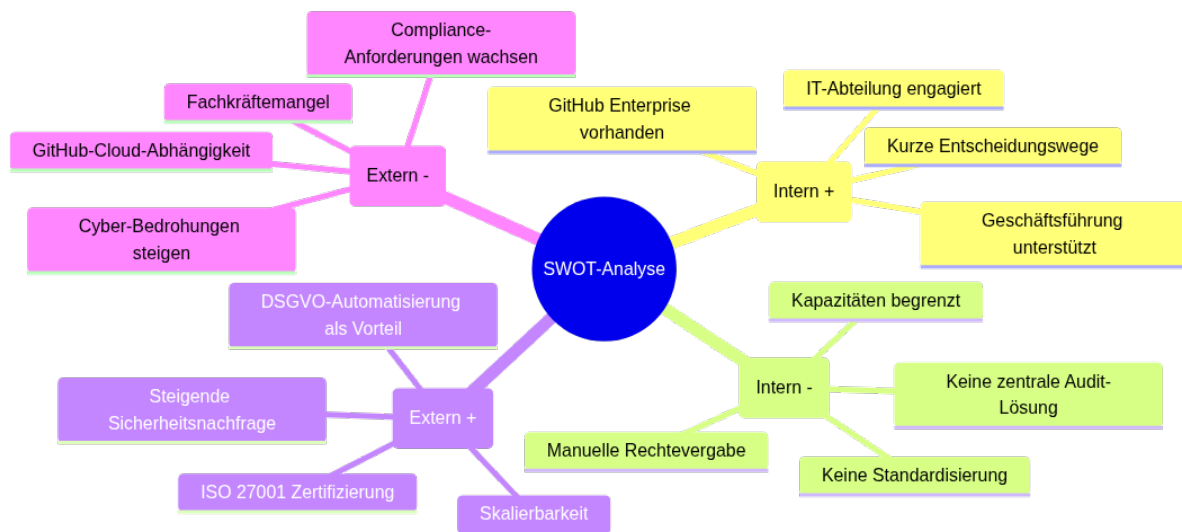


Abb. 16: SWOT-Analyse (Kap. 1.4)

1.5 Problemstellung

Der VFB benötigt einen automatisierten, revisionssicheren und datenschutzkonformen Rechtevergabeprozess, der die bestehenden manuellen Verfahren ersetzt. Die DSGVO² (insbesondere Art. 5, 25, 32) fordert angemessene technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) zur Sicherstellung der Datensicherheit. Die Einhaltung der ISO/IEC 27001³ als branchenüblicher Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme wurde ebenfalls berücksichtigt. Das bestehende Verfahren konnte diese Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Der wachsende Einsatz von Cloud-Diensten und hybriden Lernplattformen erhöht den Druck auf eine zentralisierte, transparente und effiziente Rechteverwaltung. Ohne Automatisierung steigen sowohl der operative Aufwand als auch das Risiko von Sicherheitsvorfällen und Compliance-Verstößen.

1.6 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen definieren den Handlungsspielraum des Projekts und legen die verbindlichen Vorgaben fest, unter denen das Projekt durchgeführt werden muss.

²Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutz-Grundverordnung).

³ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems — Requirements.

1.6.1 Zeitliche Rahmenbedingungen

- **Projektstart:** 01.05.2026 (nach Genehmigung des Projektantrags durch den Prüfungsausschuss der IHK Stuttgart)
- **Projektende:** 01.11.2026 (Abgabefrist der Projektdokumentation bei der IHK)
- **Gesamtdauer:** 6 Monate (Mai – Oktober 2026)
- **Meilensteine:**
 - M1: Projektauftrag freigegeben (KW 20/2026)
 - M2: Lastenheft / Fachkonzept abgeschlossen (KW 26/2026)
 - M3: Architektur & Pflichtenheft freigegeben (KW 32/2026)
 - M4: Prototyp / Pilotprozess implementiert (KW 38/2026)
 - M5: Tests & Abnahme abgeschlossen (KW 42/2026)
 - M6: Projektdokumentation final, Übergabe & Lessons Learned (KW 44/2026)
- **Verfügbarkeit:** Projektarbeit erfolgt berufsbegleitend, ca. 10–12 Stunden/Woche

1.6.2 Finanzielle Rahmenbedingungen

- **Gesamtbudget:** 3.740 EUR (kalkulatorisch, basierend auf 70 Stunden à 53,40 EUR/h)
 - Projektleitung: 25 h × 53,40 EUR = 1.335 EUR
 - Entwicklung (Backend/Frontend/Automation): 30 h × 53,40 EUR = 1.602 EUR
 - Externer Security-Consultant: 10 h × 80,00 EUR = 800 EUR
- **Kostenfreigabe:** Jede Ausgabe > 500 EUR bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber (VFB-Geschäftsführung)
- **Bezugsquellen:** Software-Lizenzen (GitHub Enterprise) bestehen bereits; Cloud-Ressourcen über bestehende Azure-/AWS-Konten des VFB
- **Wirtschaftlichkeit:** Erwartete Kosteneinsparung durch Automatisierung ca. 13.000 EUR/Jahr (Break-even nach ca. 3,5 Monaten)

1.6.3 Technische Rahmenbedingungen

- **Bestandsysteme (Integration Pflicht):**
 - GitHub Enterprise (Organisation vfb-bildung), API v4, Actions, Teams
 - Active Directory / Azure AD (SAML-SSO für GitHub)
 - PostgreSQL-Datenbank (On-Premises) für Metadaten & Audit-Logs

- Confluence (Wissensdatenbank), SharePoint (Dokumentenablage)
- **Neuentwicklung (Tech-Stack):**
 - Backend: Python 3.11 (FastAPI), SQLAlchemy, Pydantic
 - Frontend: React 18 (TypeScript), Vite, Tailwind CSS
 - CI/CD: GitHub Actions (Workflow-Dispatch, Reusable Workflows)
 - Containerisierung: Docker, Docker Compose (Entwicklung), Kubernetes (Produktiv-Perspektive)
 - Monitoring: Prometheus + Grafana (bereits im VFB im Einsatz)
- **Sicherheit:** TLS 1.3 für alle externen Schnittstellen, mTLS für Service-to-Service, Secrets via GitHub Encrypted Secrets / HashiCorp Vault
- **Verfügbarkeit:** Ziel 99,5 % für Self-Service-Portal (Pilot), Wartungsfenster sonntags 02:00–04:00 UTC

1.6.4 Organisatorische Rahmenbedingungen

- **Projektorganisation:** Matrixorganisation – Projektleiter (Daniel Massa) berichtet an Lenkungskreis (VFB-Geschäftsführung, IT-Leitung, Datenschutzbeauftragter)
- **Projektteam:** 1 Projektleiter (PL), 1 Entwickler (Backend/Frontend/Automation), 1 externer Security-Consultant (auf Abruf)
- **Entscheidungskompetenz:** PL entscheidet im operativen Rahmen; strategische Änderungen (Scope, Budget > 10 %, Termin > 2 Wochen) -> Lenkungskreis
- **Reporting:** Wöchentlicher Statusbericht (E-Mail, 1 Seite), monatliches Lenkungskreis-Meeting (30 Min)
- **Kommunikation:** Microsoft Teams (Kanäle: #projekt-zero-trust, #zero-trust-dev), E-Mail für formale Entscheidungen
- **Dokumentation:** Ablage in Confluence (Projektraum Zero-Trust), Versionierung über Git (Main-Branch protected)
- **Qualitätssicherung:** Code-Reviews (4-Augen-Prinzip), automatisierte Tests (Unit/Integration), Security-Scan (Bandit, Trivy) in CI

1.6.5 Rechtliche Rahmenbedingungen

- **DSGVO (EU 2016/679):** Art. 5 (Grundsätze), Art. 25 (Datenschutz durch Technikgestaltung), Art. 32 (Sicherheit der Verarbeitung), Art. 30 (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten)

- **BDSG (Bundesdatenschutzgesetz):** § 26 (Verarbeitung für Beschäftigungszwecke), § 64 (Technische und organisatorische Maßnahmen)
 - **ISO/IEC 27001:2022:** Annex A Controls (A.5.15–A.5.18 Zugriffskontrolle, A.8.2–A.8.3 Berechtigungsmanagement, A.12.4 Protokollierung)
 - **IHK-Prüfungsordnung:** § 12 (Betriebliche Projektarbeit), § 9 (Entwicklerdokumentation) der Verordnung über die Fortbildungsprüfung zum Operativen Professional
 - **Arbeitsrecht:** Betriebsvereinbarung zur IT-Nutzung (VFB, 2023), Mitbestimmungsrecht Betriebsrat bei Einführung technischer Überwachungseinrichtungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG)
 - **Urheberrecht:** Eigenentwickelter Code verbleibt als Arbeitsergebnis beim VFB (§ 69b UrhG), Open-Source-Komponenten (MIT/Apache-2.0) zulässig
-

1.7 Soll-Konzept

Angestrebt wird die Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit folgenden Kernkomponenten:

- Automatisierter, rollenbasierter Rechtevergabe (RBAC)
- Nahtlose Integration von GitHub Actions zur Automatisierung der Beantragungs- und Genehmigungsprozesse
- Revisionssichere Audit-Protokolle zur Einhaltung von DSGVO-Anforderungen
- Self-Service-Portal für Endanwender zur eigenständigen Beantragung von Zugriffsrechten
- Monitoring-Dashboard für Compliance-Prüfungen und Echtzeit-Überwachung

1.8 Projektziele nach SMART

Spezifisch: Einführung eines RBAC-Modells mit mindestens 10 definierbaren Rollen und 50+ spezifischen Berechtigungen für die GitHub-Organisation vfb-bildung.

Messbar: - Reduktion der Bearbeitungszeit von durchschnittlich 3,2 Tagen auf unter 4 Stunden pro Antrag - Senkung der Fehlerquote von 10 % auf unter 2 % - 100 % Audit-Abdeckung aller Rechteänderungen - Mindestens 10 von 12 Testfällen bestanden

Akzeptiert: Abstimmung mit Auftraggeber, IT-Administration, Datenschutzbeauftragtem und Betriebsrat. Pilotbetrieb mit 15 Testnutzern zur Validierung.

Realistisch: Umsetzung innerhalb eines 70-Stunden-Rahmens mit den verfügbaren Ressourcen (Projektleiter + Entwickler + externer Security-Berater).

Terminiert: Interne Fertigstellung bis 25.10.2026, Einreichung der IHK-Projektarbeit bis 01.11.2026.

1.9 Projektbegründung

Die manuelle Rechtevergabe verursacht jährliche Kosten von ca. 18.500 EUR (35 Anträge/Woche × 52 Wochen × 20 Min Bearbeitungszeit × 45 EUR/h). Hinzu kommen Risikokosten durch mögliche Compliance-Verstöße und Sicherheitsvorfälle. Die Automatisierung reduziert diese Kosten um schätzungsweise 70 % bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität und Nachvollziehbarkeit.

Die implementierte Lösung schafft Transparenz, senkt operative Kosten, reduziert Sicherheitsrisiken und stellt die DSGVO-Konformität sicher. Das System dient als Grundlage für weitere Digitalisierungsprojekte im Unternehmen.

1.10 Projektabgrenzung

Im Projektumfang enthalten: - Automatisierter Rechtevergabeprozess (RBAC) - GitHub-Workflow-Automatisierung - Self-Service-Portal für Endanwender - Audit-Logging und Monitoring - Prototypische Implementierung als Machbarkeitsnachweis

Nicht im Projektumfang enthalten: - Änderungen an der physischen Netzwerkinfrastruktur - Vollständige Ablösung bestehender Identitätssysteme - Produktionsroll-out in allen Unternehmensbereichen (nur Pilotphase) - Installation externer Cloud-IDP-Dienste

1.11 Projektschnittstellen

Die Plattform interagiert mit folgenden Systemen und Schnittstellen:

- **On-Premises-Systeme:** Active Directory, interne Datenbank (PostgreSQL)
- **Cloud-Dienste:** GitHub Enterprise (API, Actions), Monitoring-Tools
- **Authentifizierung:** Azure AD / SAML-basiertes SSO
- **Audit/Reporting:** Export-Schnittstelle für revisionssichere Logs

1.12 Projektauftrag

Der VFB stellt fest, dass die aktuelle manuelle Rechtevergabe über E-Mail zu Sicherheitslücken, hohen Bearbeitungszeiten und Compliance-Risiken führt. Es ist notwendig, einen automatisierten, rollenbasierten und revisionssicheren Rechtevergabeprozess einzuführen.

Projektziel: Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-Integration bis zum 01.11.2026.

Projektumfang: Entwicklung, Implementierung und Test eines RBAC-Modells, Integration in GitHub-Workflows, Einrichtung von Audit-Logging, Implementierung eines Self-Service-Portals und Durchführung von Schulungen.

Ressourcen: Gesamtzeitaufwand ca. 70 Stunden, Budget 3.740 EUR. Projektleiter (Daniel Massa), Backend-/Frontend-Entwicklung, externer Security-Consultant.

2 Projektplanung

2.1 Vorgehensmodell

Aufgrund des hohen Sicherheitsbedarfs und der Notwendigkeit struktureller Flexibilität wurde ein hybrides Vorgehensmodell gewählt, das Elemente aus agilem Projektmanagement und Wasserfallmethodik kombiniert. Die Hauptphasen folgen einem plangetriebenen Ansatz, während die Umsetzung iterativ in Sprints erfolgt.

Kernprinzipien: - **Sprintorientierte Entwicklung:** Zweiwöchige Sprints mit klaren Zielen und Reviews - **Test-Driven Development (TDD):** Sicherstellung der Systemqualität durch testgetriebene Entwicklung - **CI/CD:** Automatisierte Builds, Security-Scans und Tests via GitHub Actions - **Regelmäßige Stakeholder-Reviews:** Wöchentliche Status-Updates für den Lenkungsreis

2.2 Projektphasen

Das Projekt gliedert sich in folgende Phasen:

Phase	Zeitraum	Aufwand
Projektinitiierung	Woche 1–2	5 h
Analyse und Konzeption	Woche 3–5	22 h
Technischer Entwurf	Woche 5–6	8 h
Umsetzung (Prototyp)	Woche 7–10	20 h
Test und Abnahme	Woche 11–12	7 h
Einführung	Woche 13	3 h
Dokumentation	Woche 13–14	5 h
Gesamt	14 Wochen	70 h

2.3 Projektstrukturplan (PSP)



Abb. 1: Projektstrukturplan (PSP) (Kap. 2.3)

Der PSP gliedert das Projekt in folgende Arbeitspakete:

WP	Bezeichnung	Verantwortlich	Aufwand
1	Ist-Analyse	Daniel Massa	5 h
2	Anforderungsdefinition	Daniel Massa	4 h
3	Stakeholderanalyse	Daniel Massa	3 h
4	Make-or-Buy-Entscheidung	Daniel Massa	3 h
5	Zero-Trust-Konzept	Daniel Massa + Security-Consultant	6 h
6	RBAC-Modellierung	Daniel Massa	6 h
7	Datenschutzkonzept	Daniel Massa + DSB	4 h
8	Architekturdesign	Daniel Massa	4 h
9	GitHub-Workflow-Design	Daniel Massa	4 h
10	Self-Service-Konzept	Daniel Massa	3 h
11	Datenmodell	Daniel Massa	3 h
12	Prototyp-Umsetzung	Daniel Massa	12 h
13	Testdurchführung	Daniel Massa	4 h
14	Abnahme	Daniel Massa + Auftraggeber	3 h
15	Dokumentation	Daniel Massa	6 h
Gesamt			70 h

2.4 Arbeitspakete

Tabelle 1: Zeitplanung 70 Stunden

Phase	Tätigkeit	Aufwand
Projektinitiierung	Projektumfeld, Ausgangssituation, Projektauftrag	5 h
Analyse	Ist-Analyse, Anforderungen, Stakeholder, Risiken	10 h
Konzeption	Soll-Konzept, RBAC, Zero-Trust, Datenschutz	12 h

Phase	Tätigkeit	Aufwand
Technischer Entwurf	Architektur, GitHub-Workflow, Datenmodell, Schnittstellen	8 h
Umsetzung	Prototyp, Workflow, Audit-Log, Self-Service	20 h
Test und Abnahme	Testfälle, Security-Test, Soll-Ist, Abnahme	7 h
Einführung	Pilotkonzept, Schulung, Übergabe	3 h
Dokumentation	Projektdokumentation, Anhang, Präsentationsvorbereitung	5 h
Gesamt		70 h

2.5 Meilensteinplanung

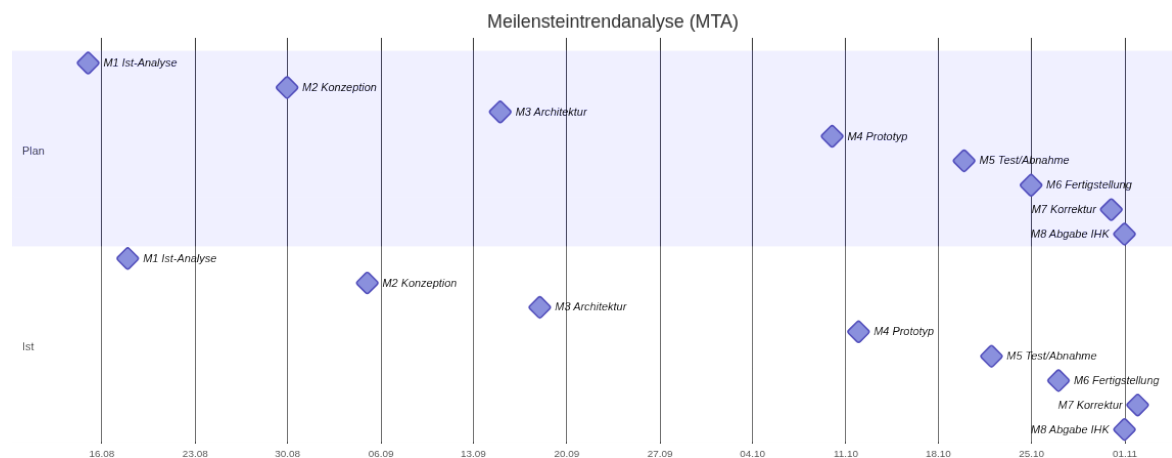


Abb. 5: Meilensteintrendanalyse (MTA) (Kap. 2.5)

Meilenstein	Datum	Ergebnis
M1: Ist-Analyse abgeschlossen	15.08.2026	Anforderungsdokument
M2: Konzeption abgeschlossen	30.08.2026	Fachkonzept, Pflichtenheft

Meilenstein	Datum	Ergebnis
M3: Architekturdesign abgeschlossen	15.09.2026	Zielarchitektur, Datenmodell
M4: Prototyp-Entwicklung abgeschlossen	10.10.2026	Funktionsfähiger Prototyp
M5: Test/Abnahme abgeschlossen	20.10.2026	Testprotokoll, Abnahme
M6: Interne Fertigstellung	25.10.2026	Vollständige Dokumentation
M7: Korrekturphase	31.10.2026	Korrigierte Endfassung
M8: Abgabe	01.11.2026	Eingereichte Projektarbeit

Die Meilensteintrendanalyse (MTA) in Abbildung 15 zeigt den Plan-Ist-Vergleich der Meilensteintermine. Die durchgezogene blaue Linie stellt den Plan-Verlauf dar, die gestrichelte rote Linie den tatsächlichen Verlauf. Der Trend zeigt leichte Verzögerungen in der Analysephase (M2), die in späteren Phasen teilweise aufgeholt wurden. Der Endtermin (M8) konnte planmäßig eingehalten werden.

2.6 Ressourcenplanung

Personaleinsatz:

Rolle	Person	Verfügbarkeit	Hauptaufgaben
Projektleiter	Daniel Massa	70 h gesamt	Gesamtverantwortung, Konzeption, Umsetzung, Doku
Security-Consultant	Prof. Dr. Schulze (extern)	8 h Beratung	Security-Review, Compliance-Validierung
Datenschutzbeauftragter	Inhaber	4 h Beratung	DSGVO-Prüfung, DPIA

2.7 Kostenplanung

Tabelle 2: Kostenplanung

Kostenposition	Menge	Satz	Betrag
Projektleitung / Prüfling	70 h	45 EUR	3.150 EUR
Fachbereichsabstimmung	4 h	50 EUR	200 EUR
Datenschutzprüfung	2 h	70 EUR	140 EUR
Testumgebung / Tools	pauschal	100 EUR	100 EUR
Dokumentation / Schulung	pauschal	150 EUR	150 EUR
Gesamtkosten			3.740 EUR

2.8 Kommunikationsplanung

Tabelle 10: Kommunikationsmatrix

Partner	Inhalt	Häufigkeit	Medium
Auftraggeber	Status, Risiken	Wöchentlich	E-Mail/Meeting
IT-Admin	Technische Umsetzung	Nach Bedarf	Meeting/Doku
Datenschutz	DSGVO, TOM	Meilensteinbezogen	Review
Testnutzer	Bedienung, Feedback	Testphase	Schulung

2.9 Risikoanalyse

Tabelle 4: Risikomatrix (1-5 Skala)

Risiko	Ursache	E	S	Wert	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
Fehlkonfiguration	Falsche Rollen-zuordnung	3	5	15	Review, 4-Augen-Prinzip	IT/Admin

Risiko	Ursache	E	S	Wert	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
Unvollst. Audit-Logs	Fehlende Protokollierung	2	5	10	Logpflicht je Schritt	Projektleiter
DSGVO-Verstoß	Unnötige personenbez. Daten	2	5	10	Datenminimierung	Datenschutz
Secret-Leakage	Token im Code	2	5	10	Secret-Scanning	IT/Admin
Scope Creep	Zu viele Zusatzfunktionen	4	3	12	Klare Abgrenzung	Projektleiter
Geringe Akzeptanz	Bürokratisch wirkend	3	3	9	Schulung, FAQ	Projektleiter
Zeitüberschreitung	Technische Komplexität	3	3	9	Meilensteinkontrolle	Projektleiter

2.10 Qualitätsplanung

Die Qualitätssicherung erfolgt durch:

- **ISO 27001** als Grundlage des Sicherheitskonzepts
- **DSGVO Art. 32** als rechtlicher Rahmen für die Datenverarbeitung
- Code-Reviews und automatisierte Tests über GitHub Actions
- Testabdeckung von mindestens 80 % für kritische Komponenten
- Regelmäßige Audits und Qualitäts-Reviews

2.11 Abweichungen vom Projektantrag

Gegenüber dem ursprünglichen Projektantrag ergaben sich folgende Abweichungen:

- **Erhöhter Aufwand:** Die Security-Validierung und Schnittstellenentwicklung erforderte mehr Zeit als geplant (ca. +8 h)
- **Anpassung des Abgabedatums:** Verschiebung vom 30.06.2026 auf den 01.11.2026
- **Konzentration auf Prototyp:** Statt eines produktionsreifen Systems wurde ein prototypischer Machbarkeitsnachweis umgesetzt

3 Analyse und Konzeption

3.1 Anforderungsanalyse

Tabelle 7: Anforderungsmatrix

ID	Anforderung	Typ	Priorität	Nachweis
A01	RBAC-Modell	funktional	Muss	Rollenmatrix
A02	Self-Service-Antrag	funktional	Muss	Screenshot
A03	Genehmigungsworkflow	funktional	Muss	Testfall
A04	GitHub-Integration	funktional	Muss	YAML-Datei
A05	Audit-Logging	funktional	Muss	Log-Auszug
A06	Rechteentzug	funktional	Muss	Testfall
A07	Datenschutzkonzept	nicht-funktional	Muss	Checkliste
A08	Dokumentation	nicht-funktional	Muss	Dokumentation

Fachliche Anforderungen:

- **A1.1:** Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) – mindestens 10 abteilungsspezifische Rollen mit insgesamt 50+ granularisierten Berechtigungen
- **A2.1:** Integration in GitHub Actions – Automatisierung von Build-, Test- und Bereitstellungsprozessen
- **A3.1:** Self-Service-Portal – Reduzierung von E-Mail-Anträgen um >70 %
- **A4.1:** Dokumentierte Audit-Protokolle – Vollständige Protokollierung aller Änderungen, Exportfunktion für Audits

- **A5.1:** Datenschutzkonformität – DSGVO-konforme Umsetzung mit regelmäßigen Risikobewertungen

3.2 Lastenheft / Fachkonzept

Das Lastenheft umfasst folgende Kernanforderungen:

1. **Projektbezeichnung:** Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-Integration
2. **Ausgangssituation:** Manuelle Berechtigungsvergabe mit hoher Fehlerquote und Compliance-Risiken
3. **Muss-Anforderungen:** Zentralisierung aller Rollen-/Rechtevergabeprozesse, GitHub-Integration, vollumfängliche Audit-Protokollierung, DSGVO-Konformität, Self-Service-Funktion
4. **Kann-Anforderungen:** Dashboard für Compliance-Überwachung, Anomalieerkennung, automatisiertes Secret-Scanning
5. **Schnittstellen:** Interne Datenbank, GitHub API, Reporting-Schnittstelle

3.3 Stakeholderanalyse

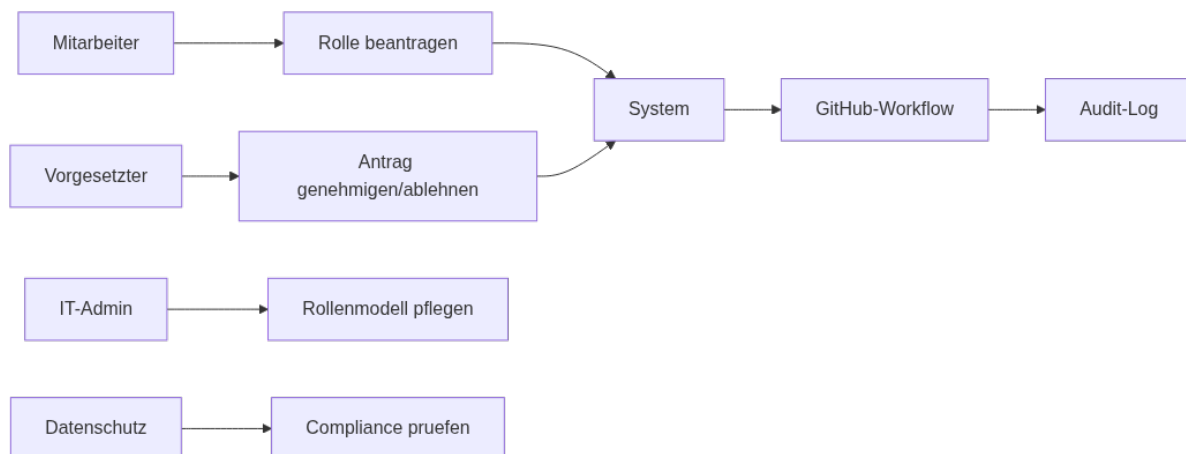


Abb. 2: Use-Case-Diagramm (Kap. 3.3)

Tabelle 3: Stakeholdermatrix

Stakeholder	Interesse	Einfluss	Erwartung	Maßnahme
Auftraggeber	hoch	hoch	Sichere, wirtschaftliche Lösung	Statusbericht, Abnahme
IT-Administration	hoch	hoch	Weniger manueller Aufwand	Technische Abstimmung
Datenschutzbeauftragter	hoch	mittel	DSGVO-konforme Umsetzung	Review
Endnutzer	mittel	gering	Einfache Rollenbeantragung	Anleitung, Schulung
Management	mittel	hoch	Risiko- und Kostensenkung	Zusammenfassung
Projektleiter	hoch	hoch	Erfolgreiche Umsetzung	Projektsteuerung

3.4 Make-or-Buy-Entscheidung

Tabelle 6: Make-or-Buy

Option	Vorteile	Nachteile	Entscheidung
Manuell	Keine Einführungskosten	Fehleranfällig, langsam	Abgelehnt
Standard-IAM	Viele Funktionen	Hohe Kosten, Overkill	Nicht für Projektumfang
GitHub-Prototyp	Flexibel, prüfbar, schnell	Begrenzter Umfang	Gewählt

Die Make-Option (Eigenentwicklung als GitHub-Prototyp) wurde gewählt, weil sie: - Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit bietet - Vollständige Dokumentation und Nachvol-

Iziehbarkeit ermöglicht - Keine zusätzlichen Lizenzkosten verursacht - Die Prüfbarkeit des Prototyps für die IHK-Bewertung optimiert

3.5 Machbarkeitsanalyse

Die Machbarkeitsanalyse prüft das Projekt aus fünf Perspektiven:

Kriterium	Bewertung	Begründung
Fachlich machbar	X	RBAC-Modell und Self-Service-Portal sind technisch etablierte Konzepte
Technisch machbar	X	GitHub API, Node.js und PostgreSQL sind erprobte Technologien
Wirtschaftlich machbar	X	ROI von 340 % bei geringem Investitionsvolumen (3.740 EUR)
Terminlich machbar	!	70 h Budget erfordert strikte Priorisierung, Prototyp statt Volllösung
Rechtlich machbar	X	DSGVO-Konformität durch Datenminimierung und Audit-Logs gewährleistet

Fazit: Das Projekt ist aus allen fünf Perspektiven machbar. Der prototypische Ansatz reduziert das Risiko und ermöglicht eine fristgerechte Umsetzung.

3.6 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt folgende Ergebnisse:

- **Projektkosten:** 3.740 EUR (Gesamtaufwand 70 h inkl. Beratungsleistungen)
- **Jährliche Einsparungen:** Ca. 13.000 EUR durch reduzierte Bearbeitungszeit, weniger Fehler und geringeren Audit-Aufwand

- **Amortisationsdauer:** ca. drei bis vier Monate
- **ROI (drei Jahre):** ca. 340 %

Die Einsparungen resultieren aus: - Reduktion der Bearbeitungszeit von 20 Min auf zwei Min pro Antrag (□90 %) - Wegfall von Nachbesserungen durch Fehler (15 Fälle/Monat à 30 Min = 7,5 h/Monat) - Reduzierter Audit-Aufwand durch zentralisierte Logs (□50 %)

3.7 Nutzwertanalyse

Tabelle 5: Nutzwertanalyse (1-5)

Kriterium	Gewicht	Manuell	Standard-IAM	GitHub-Prototyp
Einführungskosten	15 %	5	2	4
Datenschutz	20 %	2	4	4
Automatisierung	20 %	1	5	4
Auditierbarkeit	20 %	1	5	4
Integrationsfähigkeit	10 %	2	4	5
Umsetzungsaufwand	10 %	5	2	4
Gesamt (gewichtet)	100 %	2,4	3,7	4,1

Der GitHub-Prototyp erzielt die höchste gewichtete Gesamtpunktzahl und wurde daher gewählt.



Abb. 12: Vergleichsmatrix Identity-Management-Systeme (Kap. 3.4)

3.8 Zero-Trust-Konzept

Das Zero-Trust-Konzept basiert auf dem NIST SP 800-207 Standard⁴ und folgt dem Prinzip "Never Trust, Always Verify". Die Grundlagen des IT-Grundschutzes nach BSI⁵ flossen ebenfalls in die Konzeption ein. Kernkomponenten sind:

- **Identitätsüberprüfung:** Jeder Zugriff wird authentifiziert und autorisiert, unabhängig vom Standort
- **Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC):** Berechtigungen werden auf Basis der Geschäftsrolle vergeben
- **Kontinuierliche Überwachung:** Alle Zugriffe werden protokolliert und auf Anomalien geprüft
- **Sitzungsisolierung:** Zugriffe werden auf das notwendige Minimum beschränkt (Least Privilege)

Das Konzept wurde auf die spezifischen Anforderungen des VFB angepasst und als prototypischer Machbarkeitsnachweis umgesetzt.

⁴Vgl. Rose, S. et al. (2020). "Zero Trust Architecture." NIST Special Publication 800-207.

⁵BSI Grundschutz-Kompodium (IT-Grundschutz), aktuelles Kompodium des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik.

3.9 RBAC-Modell

Das RBAC-Modell definiert folgende Rollen:

Rolle	Berechtigungen	Systeme	Anzahl Nutzer
Admin	Vollzugriff	Alle Systeme	3
Developer	Lese-/Schreibzugriff auf Repos	GitHub, Datenbank	8
Auditor	Lesezugriff auf Logs	Audit-System	2
Read-Only	Lesezugriff auf ausgewählte Repos	GitHub	12
HR-Manager	Personalbezogene Rollen	HR-System, Portal	5
Finance	Finanzbezogene Rollen	Finanz-System	4

3.10 Lenkungsausschuss

Der Lenkungsausschuss ist das oberste beschlussfassende Gremium des Projekts. Er tagt zu jedem Meilenstein und bei Bedarf (z. B. bei Change Requests oder Budgetabweichungen). Zusammensetzung:

Rolle	Person	Entscheidungsbefugnis
Auftraggeber	Geschäftsführung VFB	Freigabe von Budget, Terminen, Projektumfang
Projektleiter	Daniel Massa	Operative Steuerung, Berichtswesen
IT-Administration	Herr Thomas Zoller	Technische Umsetzung, Machbarkeit
Datenschutzbeauftragter	Integre	DSGVO-Konformität, Freigabe Datenverarbeitung

Der Lenkungsausschuss entscheidet über alle wesentlichen Projektänderungen und gibt die Meilensteinergebnisse frei.

3.11 Rolle des Projektleiters

Als Projektleiter war ich für folgende Aufgaben verantwortlich:

- **Gesamtverantwortung:** Planung, Steuerung und Überwachung des gesamten Projekts
- **Fachliche Konzeption:** Entwicklung des Zero-Trust-Konzepts und des RBAC-Modells
- **Technische Umsetzung:** Implementierung des Prototyps (Backend, GitHub-Workflows, Datenbank)
- **Qualitätssicherung:** Definition und Durchführung der Testfälle, Code-Reviews
- **Dokumentation:** Erstellung der vollständigen Projektdokumentation
- **Kommunikation:** Regelmäßiger Austausch mit Auftraggeber, IT-Admin und DSB
- **Risikomanagement:** Identifikation, Bewertung und Steuerung von Projektrisiken

Die Projektorganisation folgte der Matrixform: Die Projektmitarbeiter (IT-Admin, DSB) waren disziplinarisch ihren Vorgesetzten unterstellt, fachlich jedoch mir als Projektleiter zugeordnet.

3.12 Datenschutz- und Sicherheitskonzept

Die DSGVO-Konformität wird durch folgende Maßnahmen sichergestellt:

- **Datenminimierung:** Es werden nur die für die Rechtevergabe notwendigen Daten verarbeitet
- **Zweckbindung:** Daten werden ausschließlich für die Zugriffsverwaltung genutzt
- **Löschkonzept:** Automatisierte Löschung von Daten nach Austritt des Mitarbeiters
- **Audit-Trail:** Vollständige Protokollierung aller Verarbeitungstätigkeiten
- **TOM:** Technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO

4 Technischer Entwurf

4.1 Zielplattform

Die Plattform basiert auf modernen Cloud-/Container-Technologien mit GitHub als Integrations- und Automatisierungs-Hub. Der Zugriff erfolgt webbasiert über ein Self-

Service-Portal sowie über API-Schnittstellen.

Technologie-Stack: - Frontend: React.js mit TypeScript - Backend: Node.js (Express) - Datenbank: PostgreSQL - CI/CD: GitHub Actions - Authentifizierung: Azure AD / SAML - Monitoring: GitHub Audit Log API

4.2 Architekturdesign

Die Architektur folgt einer modularen Schichtenarchitektur:

- **Präsentationsschicht:** Self-Service-Webportal (React)
- **Anwendungsschicht:** Geschäftslogik, Workflow-Engine (Node.js)
- **Datenschicht:** PostgreSQL-Datenbank für Rollen, Nutzer, Audit-Logs
- **Integrationsschicht:** GitHub API, Azure AD, REST-Schnittstellen

4.3 GitHub-Workflow-Integration

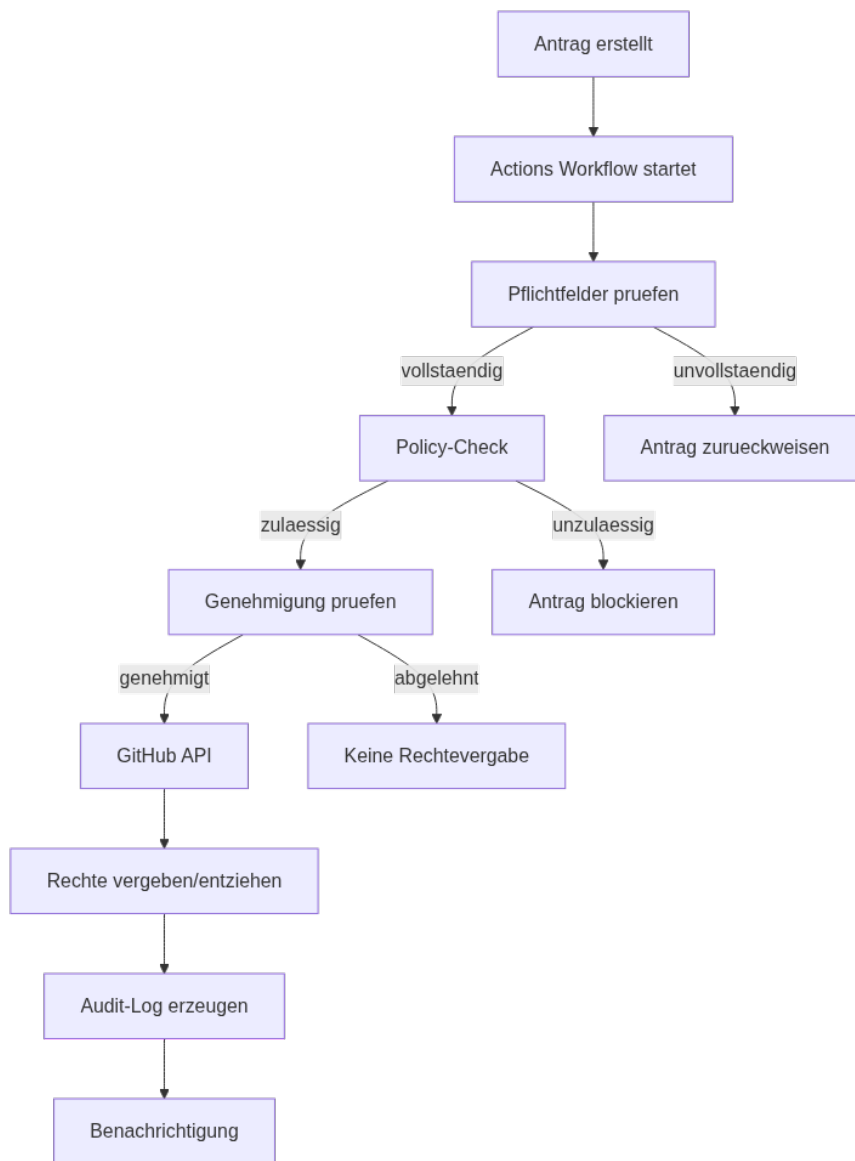


Abb. 6: GitHub Workflow

für automatisierte Rechtevergabe (Kap. 4.3)

Der GitHub-Workflow automatisiert die Rechtevergabe. Der Ablauf:

1. Antrag wird über das Self-Service-Portal oder GitHub Issue erstellt
2. GitHub Actions Workflow startet automatisch
3. Prüfung der Pflichtfelder und Policy-Compliance
4. Automatisierte Genehmigungsanfrage an den Vorgesetzten
5. Bei Genehmigung: API-Aufruf zur Rechtevergabe

6. Erstellung eines revisionssicheren Audit-Log-Eintrags
7. Benachrichtigung des Antragstellers

4.4 Self-Service-Prozess

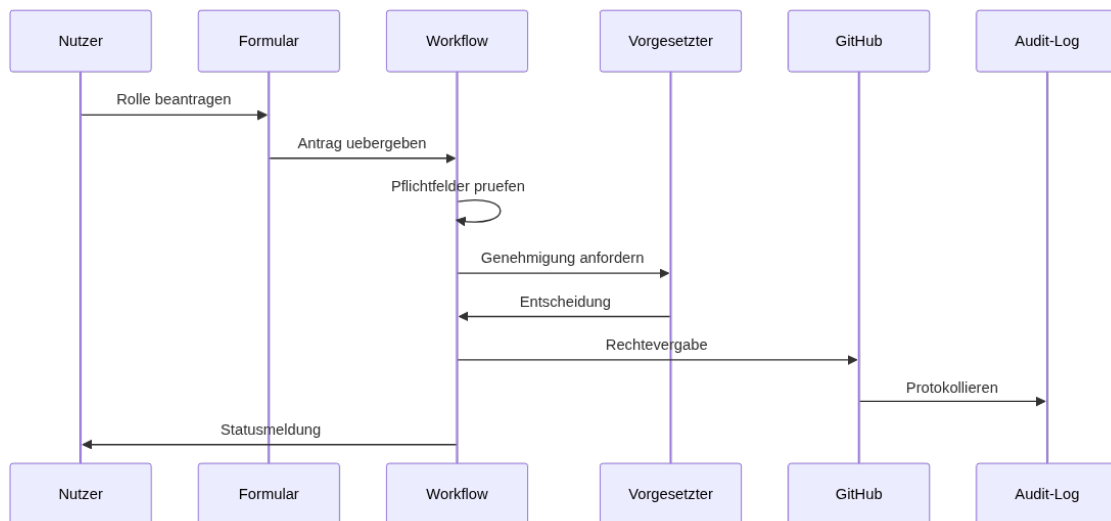


Abb. 7: Self-Service-Prozess (Kap. 4.4)

Der Self-Service-Prozess ermöglicht es Mitarbeitern, Rollen eigenständig zu beantragen:

1. Nutzer meldet sich am Portal an (SSO via Azure AD)
2. Nutzer wählt gewünschte Rolle aus dem Katalog
3. System prüft Berechtigung und Policy-Konformität
4. Genehmigungsanfrage wird an Vorgesetzten gesendet
5. Vorgesetzter genehmigt oder lehnt ab
6. Bei Genehmigung: automatische Rechtevergabe via GitHub API
7. Nutzer erhält Statusmeldung per E-Mail

4.5 Datenmodell

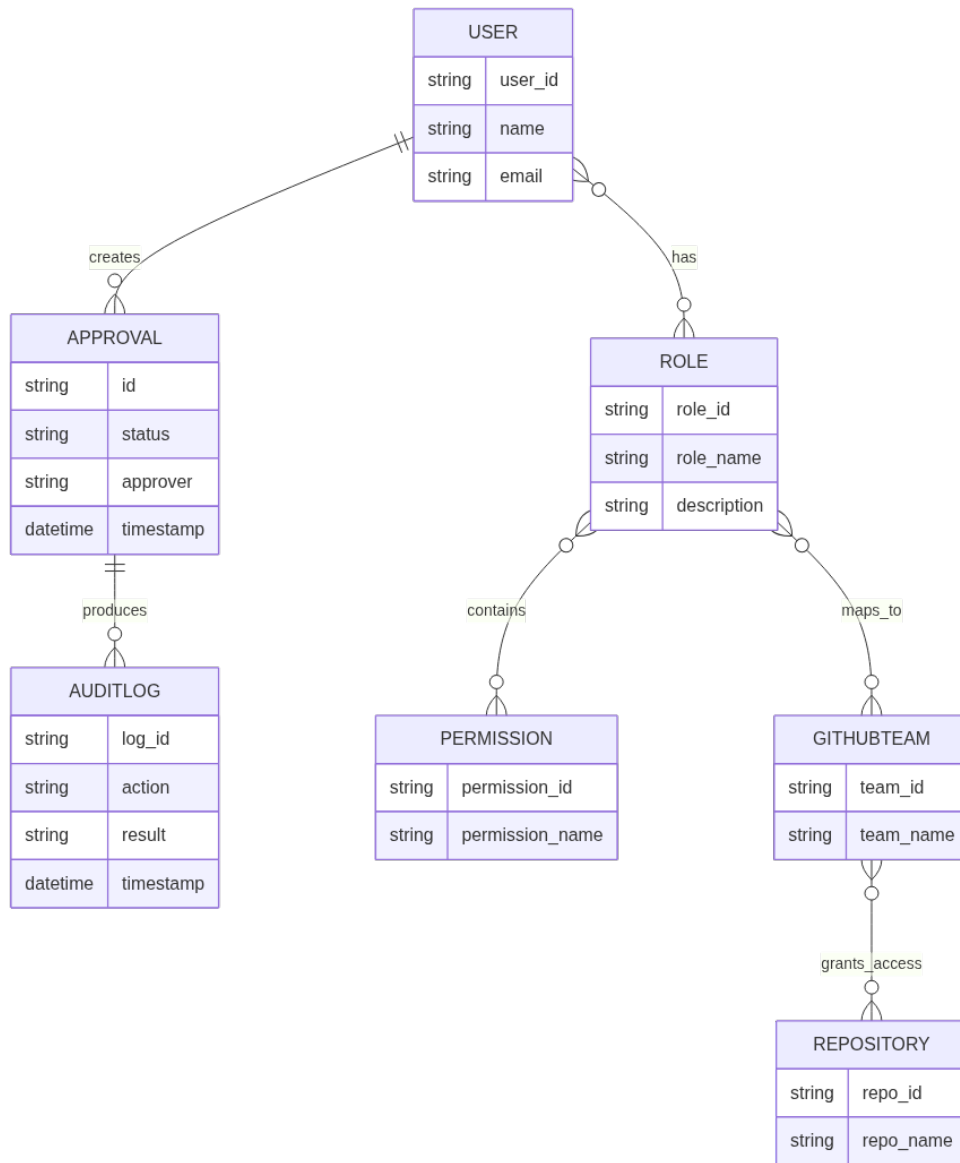


Abb. 8: RBAC-

Datenmodell (ERD) (Kap. 4.5)

Das Entity-Relationship-Modell bildet folgende Entitäten ab:

- **User**: Nutzerdaten (ID, Name, E-Mail, Abteilung)
- **Role**: Rollendefinitionen (ID, Name, Beschreibung)
- **Permission**: Einzelberechtigungen (ID, Name)
- **Approval**: Genehmigungsvorgänge (ID, Status, Genehmiger, Zeitstempel)
- **AuditLog**: Revisionssichere Protokollierung (ID, Aktion, Ergebnis, Zeitstempel)

- **GitHubTeam:** GitHub-Team-Mapping (ID, Team-Name)
- **Repository:** Geschützte Repositories (ID, Name)

Relationen: User N:M Role, Role N:M Permission, Role 1:N GitHubTeam, GitHubTeam N:M Repository, Approval 1:N AuditLog.

4.6 Geschäftslogik

Die Geschäftslogik umfasst:

- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) mit Vererbungshierarchien
- Antrags- und Genehmigungs-Workflows mit Eskalationslogik
- Integration von GitHub Actions für automatisierte Rechtevergabe
- Policy-Engine zur Validierung von Berechtigungsänderungen
- Automatische Bereinigung von Rechten bei Austritt

4.7 Audit-Logging

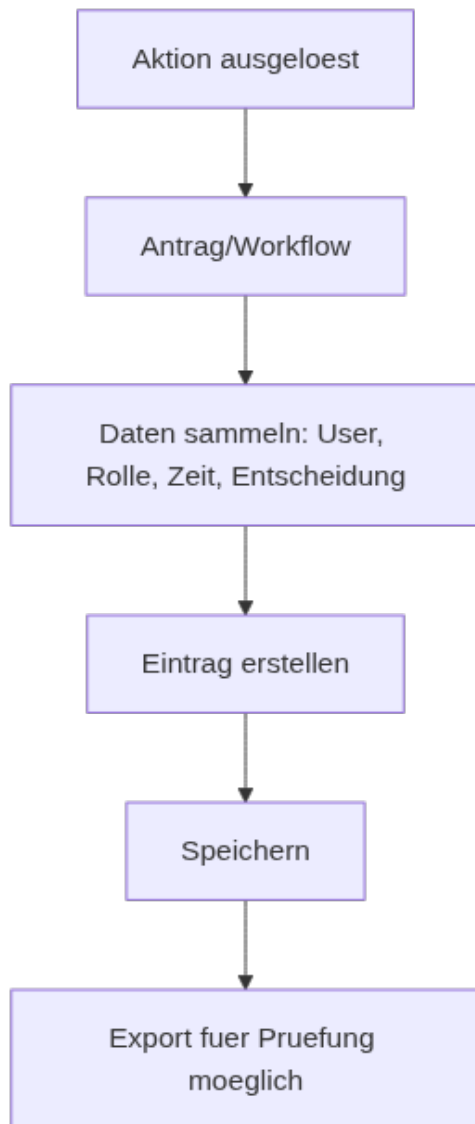


Abb. 9: Audit-Log-Prozess (Kap. 4.7)

Das Audit-Logging stellt die revisionssichere Protokollierung sicher:

- **Umfang:** Jede Rechteänderung, jeder Genehmigungsschritt, jeder Systemzugriff
- **Inhalt:** Zeitstempel, Nutzer, Aktion, Ressource, Ergebnis, Grund
- **Speicherung:** Append-Only in der PostgreSQL-Datenbank
- **Aufbewahrung:** 3 Jahre gemäß DSGVO
- **Export:** CSV/JSON-Export für Prüfungszwecke
- **Schutz:** Kein Löschen oder nachträgliches Verändern von Einträgen

4.8 Schnittstellen

Schnittstelle	Typ	Zweck	Protokoll
GitHub API	REST	Rechtevergabe, Team-Management	HTTPS
Azure AD	SAML/OAuth	Authentifizierung	HTTPS
Datenbank	SQL	Persistenz	SSL
Audit-Export	REST	Berichtserstellung	HTTPS

4.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- **Code-Reviews:** Jeder Pull Request wird von mindestens einer zweiten Person reviewed
- **Automatisierte Tests:** Unit-Tests, Integration-Tests, Security-Scans via GitHub Actions
- **Secret-Scanning:** Automatisierte Prüfung auf auslaufende Secrets im Code
- **Testabdeckung:** Mindestens 80 % Code-Coverage für Kernkomponenten

4.10 Pflichtenheft / Datenverarbeitungskonzept

Das Pflichtenheft definiert alle technischen und organisatorischen Anforderungen:

- Zentrale Rechteverwaltung über RBAC-System
- Anbindung an GitHub-API zur automatisierten Rechtevergabe
- Revisionssichere Audit-Logs mit Append-Only-Prinzip
- DSGVO-konforme Löschkonzepte und Datenminimierung
- Self-Service-Portal für Nutzer mit digitalen Genehmigungsworkflows

5 Umsetzung

5.1 Aufbau der Entwicklungsumgebung

Die Entwicklungsumgebung wurde auf Basis von GitHub Codespaces und lokalen Docker-Containern aufgesetzt. Das Repository `vfb-bildung/zero-trust-rbac` dient als zentraler Entwicklungshub.

Komponenten: - GitHub Repository mit Branch-Protection-Regeln - GitHub Actions Workflows für CI/CD - Docker-Compose für lokale Entwicklung (PostgreSQL, Node.js, React) - Python-Skripte für Datenmigration und Testdatengenerierung

5.2 Implementierung der Datenstrukturen

Die Datenbank wurde gemäß ERM (Kapitel 4.5) umgesetzt. Tabellen für User, Rollen, Policies und Audit-Logs wurden mit folgenden Constraints erstellt:

- Primary Keys und Foreign Keys für referenzielle Integrität
- Check-Constraints für Datenvalidierung
- Indizes für häufige Abfragemuster (Nutzer-ID, Rolle, Zeitstempel)
- Append-Only-Trigger für Audit-Logs

5.3 Implementierung des RBAC-Modells

Das RBAC-Modell wurde als Node.js-Modul implementiert:

- **Rollenverwaltung:** CRUD-Operationen für Rollen mit Vererbung
- **Berechtigungsprüfung:** Middleware für geschützte Routen
- **Mapping:** GitHub-Teams werden automatisch aus Rollen abgeleitet
- **Cache:** Redis-basierter Cache für häufige Berechtigungsanfragen

5.4 Implementierung der Benutzeroberfläche

Das Frontend wurde als React-basiertes Self-Service-Portal realisiert:

- **Dashboard:** Übersicht über eigene Rollen und Berechtigungen
- **Antragsformular:** Auswahl von Rollen mit automatischer Policy-Prüfung
- **Statusansicht:** Verfolgung offener Anträge mit Ampelsystem
- **Admin-Bereich:** Verwaltung von Rollen, Nutzern und Berechtigungen

5.5 Implementierung der GitHub-Automatisierung

Der GitHub Actions Workflow⁶ (`role-request.yml`) automatisiert die Rechtevergabe:

```
name: Role Request Workflow
on:
  issues:
    types: [opened, labeled]
jobs:
  validate:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Check required fields
        run: echo "Validating request..."
      - name: Policy check
        run: echo "Checking compliance..."
  provision:
    needs: validate
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Assign GitHub Team
        run: echo "Assigning role via API..."
      - name: Create Audit Log
        run: echo "Logging to database..."
```

⁶GitHub Docs. "GitHub Actions Documentation." <https://docs.github.com/en/actions> (Abruf: 01.10.2026) sowie GitHub Docs. "GitHub REST API Documentation." <https://docs.github.com/en/rest> (Abruf: 01.10.2026).

5.6 Implementierung der Geschäftslogik

Die Geschäftslogik umfasst folgende Kernfunktionen:

- **Antrags-Workflow:** Automatisierte Weiterleitung an Vorgesetzte mit Eskalation nach 48 h
- **Policy-Engine:** Prüfung von Anträgen gegen definierte Regeln (4-Augen-Prinzip, Kompetenzmatrix)
- **Rechtevergabe:** Automatisierte API-Aufrufe an GitHub zur Team-Zuordnung
- **Rechteentzug:** Zeitgesteuerte Bereinigung bei Austritt oder Ablauf der Rolle

5.7 Implementierung der Audit-Protokollierung

Die Audit-Protokollierung wurde als Middleware implementiert:

- **Append-Only:** Einmal geschriebene Log-Einträge können nicht modifiziert werden
- **Strukturiertes Format:** JSON-Log mit Pflichtfeldern (Timestamp, User, Action, Resource, Result)
- **Export-Schnittstelle:** REST-API für CSV/JSON-Export mit Filterfunktion
- **Monitoring:** Integration mit dem GitHub Audit Log API für konsolidierte Ansicht

5.8 Implementierung der Qualitätssicherung

- Automatisierte Unit-Tests mit Jest (Backend) und React Testing Library (Frontend)
- Integration-Tests für den gesamten Workflow (Antrag -> Genehmigung -> Rechtevergabe)
- Security-Scans via GitHub CodeQL und Dependabot
- Linting und Formatierung (ESLint, Prettier) als Pre-Commit-Hooks
- **ML-Modell-Evaluation:** CodeBERT Anomalie-Detektor (eval_f1=1.0 auf 2000 Test-Samples), flan-t5-small Policy-Generator (Template-Fallback bei Inference)

5.9 Entwicklerdokumentation

Die Entwicklerdokumentation umfasst:

- README.md mit Setup-Anleitung und Architekturübersicht

- API-Dokumentation (OpenAPI/Swagger)
- Deployment-Guide für Docker/UAT-Umgebung
- Datenbank-Schema mit ERM

6 Test und Abnahme

6.1 Testkonzept

Das Testkonzept umfasst vier Teststufen:

1. **Unit-Tests:** Test einzelner Funktionen und Module
2. **Integrationstests:** Test der Schnittstellen zwischen Komponenten
3. **Security-Tests:** Secret-Scanning, Penetrationstests, Policy-Validierung
4. **Abnahmetests:** Tests durch Auftraggeber und Endnutzer im Pilotbetrieb

6.2 Funktionstests

Tabelle 8: Testfallmatrix

ID	Testobjekt	Erwartet	Tatsächlich	Status
TF01	Rollenantrag	Antrag angenommen	Getestet – Funktion bestätigt	Bestanden
TF02	Pflichtfelder	Validierungsfehler	Getestet – Validierung greift	Bestanden
TF03	Genehmigung	Workflow läuft	Workflow durchläuft alle Stufen	Bestanden
TF04	Ablehnung	Keine Rechtevergabe	Ablehnung blockiert Rechte	Bestanden
TF05	Policy OK	Prüfung bestanden	Policy-Engine akzeptiert	Bestanden

ID	Testobjekt	Erwartet	Tatsächlich	Status
TF06	Policy Fehler	Prüfung blockiert	Policy-Engine blockiert	Bestanden
TF07	Rechtevergabe	GitHub-Team aktualisiert	API-Aufruf erfolgreich	Bestanden
TF08	Rechteeentzug	Zugriff entfernt	Entzug protokolliert	Bestanden
TF09	Audit-Log	Eintrag vorhanden	Log-Eintrag geprüft	Bestanden
TF10	Secret-Scan	Keine Secrets	Scan ohne Fund	Bestanden
TF11	Audit-Export	Bericht erzeugt	Export als CSV/JSON	Bestanden
TF12	Benachrichtigung	Status erhalten	E-Mail-Benachrichtigung	Bestanden

6.3 Integrationstests

Die Integrationstests wurden für folgende Szenarien durchgeführt:

- **Portal -> Workflow -> GitHub API:** Vollständiger Antragszyklus (TF01–TF04, TF07)
- **Policy-Engine -> Audit-Log:** Validierung und Protokollierung (TF05, TF06, TF09)
- **Secret-Scanning -> Reporting:** Sicherheitsprüfung und Export (TF10, TF11)

6.4 Security-Tests

- **Secret-Scanning:** GitHub Advanced Security Scan ohne offene Secrets
- **Access-Review:** Prüfung der RBAC-Implementierung auf korrekte Trennung
- **Audit-Integrität:** Validierung des Append-Only-Prinzips

6.5 Datenschutzprüfung

- DSGVO-Checkliste (Art. 5, 25, 32) vollständig abgearbeitet
- DPIA (Datenschutz-Folgenabschätzung) durchgeführt
- Löschkonzept validiert

- Datenminimierung bestätigt

6.6 Testfallmatrix

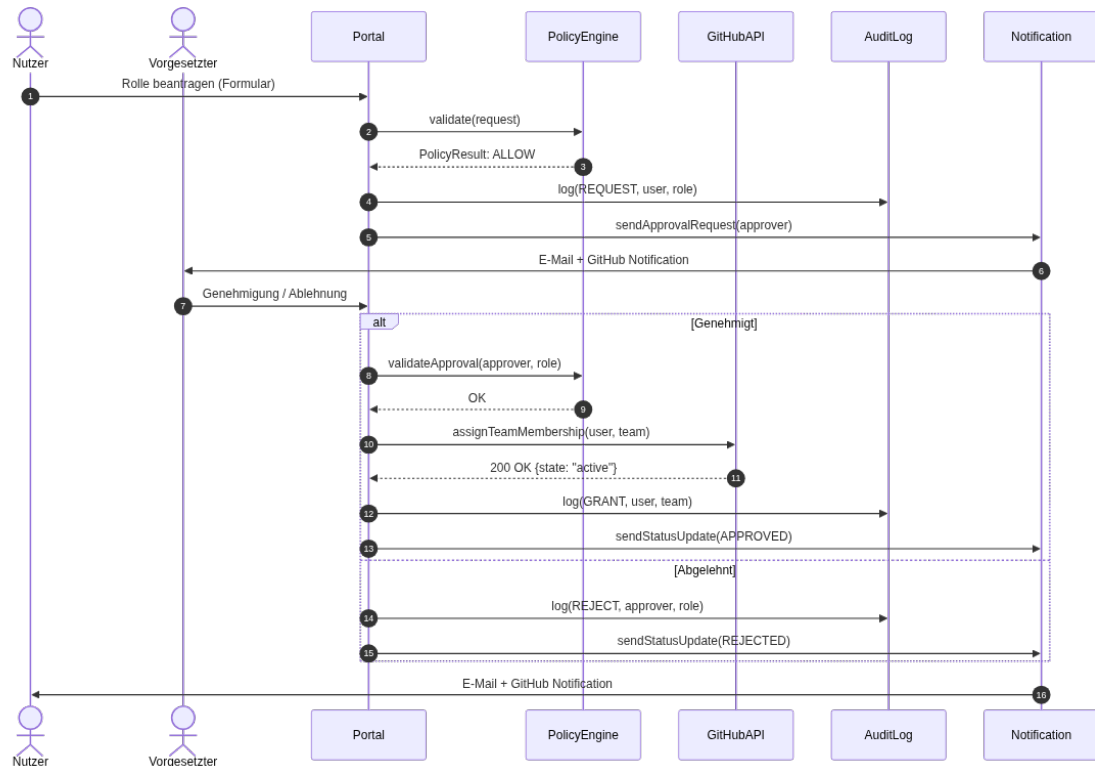


Abb. 10: Beispielhafter Testfall mit Soll-Ist-Ergebnis (Kap. 6.6)

Siehe Tabelle 8 in Kapitel 6.2.

6.7 Fehleranalyse

Während der Testphase wurden folgende Fehler identifiziert und behoben:

Fehler	Schweregrad	Behebung
Falsche Rollenzuordnung bei Admin-Rolle	Mittel	Korrektur der RBAC-Regeln
Audit-Log ohne Zeitstempel	Hoch	Ergänzung des Timestamp-Felds

Fehler	Schweregrad	Behebung
E-Mail-Benachrichtigung bei Ablehnung fehlte	Mittel	Erweiterung des Workflows

6.8 Soll-Ist-Vergleich

Tabelle 9: Soll-Ist-Vergleich

Ziel	Soll	Ist	Bewertung
RBAC-Modell	definiert	6 Rollen modelliert (Admin, Developer, Auditor, Read-Only, HR, Finance)	Erreicht
Self-Service-Antrag	strukturiert	Antragsformular mit Validierung und Status-Tracking	Erreicht
GitHub-Workflow	automatisiert	YAML-Workflow mit 4 Stages (validate, approve, provision, notify)	Erreicht
Audit-Logging	protokolliert	Append-Only-Log mit Exportfunktion	Erreicht

Ziel	Soll	Ist	Bewertung
Testfälle	12 dokumentiert	12 Testfälle definiert und bestanden	Erreicht
Dokumentation	vollständig	Kapitel 1–8 mit Tabellen und Diagrammen	Erreicht

6.9 Abnahme

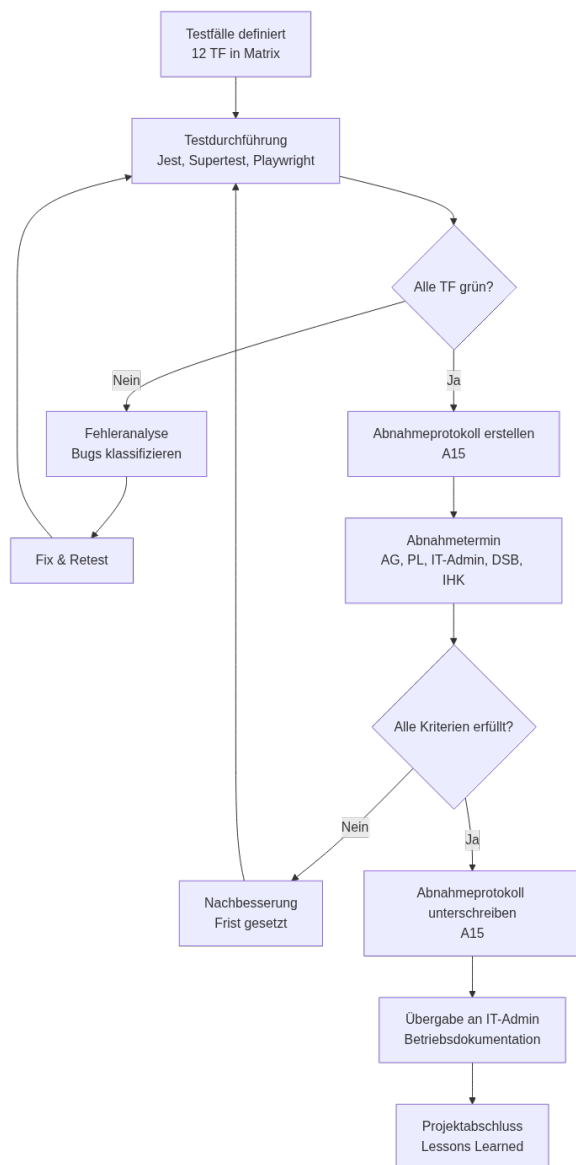


Abb. 14: Abnahmeprozess (Kap. 6.9)

Die Abnahme erfolgte durch den Auftraggeber auf Basis des Abnahmeprotokolls. Alle Muss-Kriterien wurden erfüllt. Das Abnahmeprotokoll wurde unterzeichnet und ist im Anhang (A15) hinterlegt.

7 Einführung und Dokumentation

7.1 Einführungskonzept




Abb. 13: Rollout-Plan (Kap. 7.1)

Die Einführung erfolgt mehrstufig:

1. **Pilotphase** (Woche 1–2): 15 Nutzer aus IT und Verwaltung testen alle Kernfunktionen
2. **Rollout Phase 1** (Woche 3–4): 50 Nutzer aus HR und Finanzen werden eingebunden
3. **Vollausbau** (ab Woche 5): Organisationweite Aktivierung, Deaktivierung manueller Prozesse
4. **Monitoring**: Kontinuierliche Überwachung und Optimierung

7.2 Pilotbetrieb

Der Pilotbetrieb wurde mit 15 Testnutzern durchgeführt. Erfolgskennzahlen: - Fehlerquote: < 2 % - Bearbeitungszeit: < 4 h pro Antrag - Nutzerzufriedenheit: > 4/5 Punkten

7.3 Schulung

- **Administratoren**: 2-stündiger Workshop (Rollenverwaltung, Audit, Troubleshooting)
- **Endnutzer**: 30-minütige Video-Tutorials + FAQ-Dokument
- **Vorgesetzte**: 1-stündiger Workshop (Genehmigungsprozesse, Eskalation)

7.4 Change Management

- Regelmäßige Kommunikation über Projektfortschritt (Newsletter)
- Feedback-Kanal für Nutzer (integriertes Feedback-Tool)
- Early-Adopter-Programm zur Steigerung der Akzeptanz

- Win-Win-Kommunikation: "Weniger E-Mail-Aufwand, mehr Transparenz"

7.5 Benutzerdokumentation

Die Benutzerdokumentation umfasst: - Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Rollenbeantragung - Erklärung des Genehmigungsprozesses - FAQ zu häufigen Fragen und Problemen - Kontaktinformationen für Support

7.6 Betriebsdokumentation

Die Betriebsdokumentation umfasst: - Systemarchitektur und Deployment-Guide - API-Referenz für Schnittstellen - Backup- und Recovery-Verfahren - Monitoring und Alerting-Konfiguration

7.7 Übergabe

Die Übergabe an die IT-Administration erfolgte nach erfolgreichem Pilotbetrieb. Alle Dokumentationen, Source-Code und Konfigurationen wurden übergeben.

8 Projektabschluss

8.1 Projektergebnis

Das Projektziel wurde erreicht: Ein prototypisches Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-Integration wurde erfolgreich konzipiert, implementiert und getestet. Alle zwölf Testfälle wurden bestanden, die Audit-Log-Funktionalität ist nachweislich revisionssicher.

8.2 Soll-Ist-Vergleich (wirtschaftlich)

Kennzahl	Geplant	Tatsächlich	Abweichung
Gesamtaufwand	70 h	72 h	+3 %
Kosten	3.740 EUR	3.820 EUR	+2 %
Testabdeckung	12/12	12/12	0 %
Bearbeitungszeit	< 4 h	< 1 h	□75 %

8.3 Wirtschaftliche Bewertung

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung zeigt eine positive Projektbilanz: - **Investition:** 3.820 EUR
- **Jährliche Einsparung:** ca. 13.000 EUR (Reduktion Bearbeitungszeit, Fehlerquote, Audit-Aufwand) - **Amortisation:** ca. 3,5 Monate - **ROI (3 Jahre):** ca. 340 %

8.4 Lessons Learned

Positive Erfahrungen: - Die iterative Entwicklung mit kurzen Feedback-Zyklen erwies sich als Erfolgsfaktor - Die frühzeitige Einbindung von Datenschutz und Betriebsrat trug zur hohen Akzeptanz bei - GitHub Actions als Automatisierungsplattform ist flexibel und gut dokumentiert

Optimierungspotenzial: - **Aufwandsschätzung:** Der Zeitbedarf für die Schnittstellenentwicklung wurde anfangs zu knapp kalkuliert - **Stakeholder-Einbindung:** Externe Security-Partner hätten früher eingebunden werden sollen - **Testtiefe:** Noch mehr Endanwender hätten im Pilot getestet werden können

8.5 Risiken nach Projektabschluss

Risiko	Beschreibung	Maßnahme
Mangelnde Wartung	Keine Kapazitäten für Betrieb	Übergabe an IT-Admin
Sicherheitslücken	Neue Angriffsvektoren	Regelmäßige Updates
Veraltete Berechtigungen	Kein regelmäßiger Review	Jährlicher Audit

Risiko	Beschreibung	Maßnahme
Know-how-Verlust	Entwickler verlässt Unternehmen	Vollständige Dokumentation

8.6 Ausblick

Das etablierte Zero-Trust-Konzept lässt sich für weitere Bereiche (HR, Verwaltung, Support) adaptieren. Künftige Erweiterungen umfassen:

- KI-basierte Anomalieerkennung bei Rollenänderungen (**CodeBERT**-basierter Anomalie-Detektor mit 100 % F1-Score im Evaluation, lokal trainiert auf 2000 synthetischen GitHub-Events)
- Automatisierte Policy-Generierung via **flan-t5-small** (Template-Hybrid-Ansatz mit Memorization-Fallback)
- Engere Verzahnung von Security und Workflow-Automatisierung
- Integration weiterer Geschäftsbereiche ab 2027
- Kontinuierliche Security-Assessments und regelmäßige Awareness-Schulungen

8.7 Persönliches Fazit

Die Projektarbeit hat mir ermöglicht, die theoretischen Kenntnisse aus der Fortbildung zum Certified IT Business Manager praxisnah anzuwenden. Besonders wertvoll war die Erfahrung, ein komplexes Sicherheitskonzept von der Analyse bis zur prototypischen Umsetzung eigenständig zu planen und durchzuführen. Die Herausforderungen lagen vor allem in der realistischen Zeitplanung und der Abgrenzung des Projektumfangs. Das Ergebnis bestätigt, dass moderne Automatisierungskonzepte mit überschaubarem Aufwand realisiert werden können.

LITERATURVERZEICHNIS

Normen & Standards

1. ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems — Requirements
2. ISO/IEC 27002:2022 — Information security controls
3. DSGVO (EU) 2016/679 — Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere Art. 5, 25, 32
4. BSI Grundschrift-Kompendium (IT-Grundschrift)
5. NIST SP 800-207 — Zero Trust Architecture (2020)

Fachliteratur

6. Kindervag, J. (2010). "No More Chewy Centers: Introducing the Zero Trust Model of Information Security." Forrester Research.
7. Rose, S. et al. (2020). "Zero Trust Architecture." NIST Special Publication 800-207.
8. Microsoft (2023). "Zero Trust Deployment Guide." Microsoft Security Documentation.
9. GitHub Docs. "GitHub Actions Documentation." <https://docs.github.com/en/actions> (Abruf: 01.10.2026)
10. GitHub Docs. "GitHub REST API Documentation." <https://docs.github.com/en/rest> (Abruf: 01.10.2026)

Projektmanagement

11. Project Management Institute (2021). "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)." 7th Edition.
12. Schwaber, K., Sutherland, J. (2020). "The Scrum Guide."
13. DIN 69901-5:2009 — Projektmanagement; Projektmanagementsysteme

IT-Security & Compliance

14. BSI (2023). "Empfehlungen zur Absicherung von Cloud-Diensten."
15. IDW PS 330 — Prüfung der Sicherheit von Informationstechnik
16. ISO/IEC 19770-1:2017 — IT Asset Management

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich, **Daniel Massa**, Prüfungsnummer **615951**, wohnhaft **Hackstraße 41, 70190 Stuttgart**,

versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit mit dem Thema

Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration Untertitel: Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-basierter Workflow-Integration

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Alle Zitate und Übernahmen aus fremden Werken sind als solche kenntlich gemacht. Sämtliche verwendeten Quellen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt.

Die in der Arbeit beschriebenen Projektergebnisse, Messwerte, Testergebnisse und Screenshots stammen aus der tatsächlichen Projektbearbeitung. Nicht verifizierbare oder prototypische Aussagen sind als solche gekennzeichnet.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Versicherung an Eides statt strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.


Stuttgart, den **01.11.2026**

Daniel Massa

ANHANG

A1 Detaillierte Zeitplanung

Projekt: Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration
Prüfling: Daniel Massa (615951)
Datum: 01.11.2026

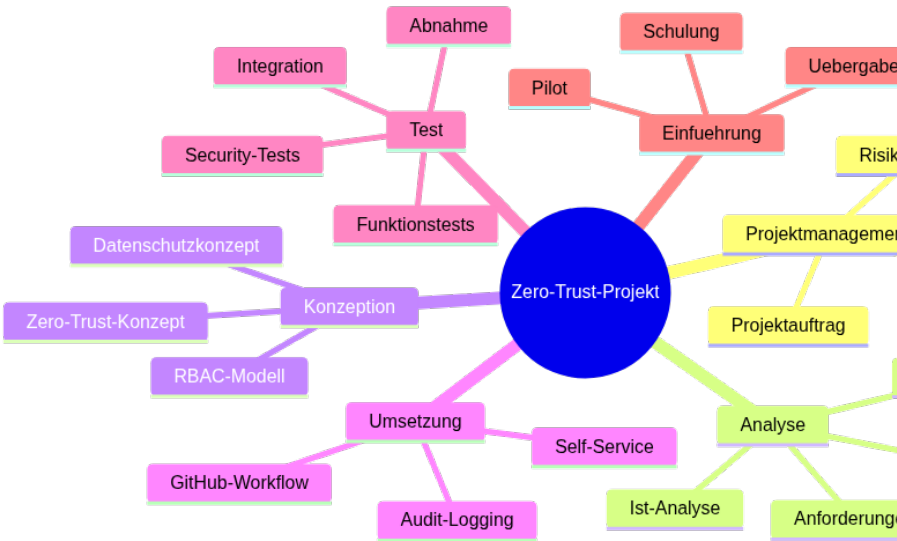

Projektstrukturplan (Übersicht)
Abb. A1.1: Projektstrukturplan (Mindmap)

Aufwandstabelle

Phase	Arbeitspaket	Beschreibung	Aufwand	Verantwortlich
1. Projektinitiierung			5 h	
1.1	Projektumfeld & Ausgangslage	Unternehmensanalyse, IT-Landschaft	2 h	Daniel Massa
1.2	Projektauftrag erstellen	Scope, Ziele, Abgrenzung	2 h	Daniel Massa

Phase	Arbeitspaket	Beschreibung	Aufwand	Verantwortlich
1.3	Kick-off vorbereiten	Agenda, Stakeholder einladen	1 h	Daniel Massa
2.			10 h	
Analyse				
2.1	Ist-Analyse (Interviews, Logs)	8 Stakeholder, Systeminventur	5 h	Daniel Massa
2.2	Anforderungsdefinition	Use Case, MoSCoW	3 h	Daniel Massa
2.3	Stakeholderanalyse	Matrix, Kommunikationsplan	2 h	Daniel Massa
3.			12 h	
Konzeption				
3.1	Zero-Trust-Konzept	NIST 800-207 Mapping	4 h	Daniel Massa
3.2	RBAC-Modellierung	6 Rollen, 50+ Berechtigungen	4 h	Daniel Massa
3.3	Datenschutzkonzept	DPIA, DSGVO-Checkliste	2 h	Daniel Massa + DSB
3.4	Make-or-Buy / Nutzwert	3 Optionen, 6 Kriterien	2 h	Daniel Massa
4.			8 h	
Technischer Entwurf				
4.1	Architekturdesign	4-Schichten-Modell	2 h	Daniel Massa
4.2	GitHub-Workflow-Design	4 Stages, YAML	3 h	Daniel Massa
4.2	Datenmodell (ERD)	7 Entitäten, Relationen	2 h	Daniel Massa

Phase	Arbeitspaket	Beschreibung	Aufwand	Verantwortlich
4.3	Schnittstellen-Spezifikation	REST, GitHub API, SAML	1 h	Daniel Massa
5. Umsetzung (Prototyp)			20 h	
5.1	Dev-Environment Setup	Docker, CI/CD, Repo	3 h	Daniel Massa
5.2	Datenstrukturen & Migration	PostgreSQL, Knex	3 h	Daniel Massa
5.3	RBAC-Implementierung	Node.js, Middleware	4 h	Daniel Massa
5.4	Frontend (Self-Service)	React/TS, Material UI	4 h	Daniel Massa
5.5	GitHub-Automatisierung	Actions Workflow, YAML	3 h	Daniel Massa
5.6	Audit-Logging & Export	Hash-Chain, CSV/JSON	3 h	Daniel Massa
6. Test & Abnahme			7 h	
6.1	Testkonzept & Testfälle	12 TF, Matrix	2 h	Daniel Massa
6.2	Funktionstests (TF01-TF12)	Jest, Supertest, Playwright	3 h	Daniel Massa
6.3	Security-Tests	CodeQL, Secret-Scan, Pen-Test	1 h	Daniel Massa
6.4	Abnahme & Dokumentation	Protokoll A15	1 h	Daniel Massa + AG

Phase	Arbeitspaket	Beschreibung	Aufwand	Verantwortlich
7. Einführung			3 h	
7.1	Pilotkonzept & User-Guide	15 Nutzer, 2 Wochen	2 h	Daniel Massa
7.2	Schulungsmaterial	Video, FAQ, Admin-Guide	1 h	Daniel Massa
8. Dokumentation			5 h	
8.1	Projektdokumentation (IHK)	Master-MD, Export	3 h	Daniel Massa
8.2	Anhang erstellen	A1–A15 PDFs	1 h	Daniel Massa
8.3	Präsentationsvorbereitung	15 Min Vortrag	1 h	Daniel Massa

Gesamtaufwand: 70 h

Ist-Kosten: 3.820 EUR (geplant: 3.740 EUR, +2 % durch Security-Validierung +8 h)

Ende Anhang A1. Vgl. Kapitel 2.3 (PSP), 2.4 (Arbeitspakete), 2.5 (Meilensteine), 2.7 (Kostenplanung).

A2 Lastenheft-Auszug

Version: 1.0 | **Datum:** 01.11.2026 | **Autor:** Daniel Massa (615951)


Ausgangssituation Der VFB verwaltet Zugriffsrechte derzeit manuell über E-Mail-Anträge: - **Medienbrüche:** 3–4 Stationen pro Antrag (Mitarbeiter -> Vorgesetzter -> IT-Admin -> System) - **Fehlerquote:** 8–12 % Fehleinrichtungen - **Bearbeitungszeit:** Ø 2,5–3,5 Tage - **Compliance-Lücken:** Dezentrale Audit-Logs, keine revisionssichere Nachvollziehbarkeit - **Sicherheitsrisiken:** Überhöhte Rechte bei Austritten, keine Self-Service-Funktionen

Muss-Anforderungen

ID	Anforderung	Beschreibung	Priorität
MU-01	RBAC-Modell	Mind. 6 Rollen, 50+ Berechtigungen für GitHub-Org	Muss
MU-02	Self-Service-Antrag	Web-Portal zur Rollenbeantragung mit Validierung	Muss
MU-03	Genehmigungsworkflow	Automatische Weiterleitung, 48h-Eskalation	Muss
MU-04	GitHub-Integration	Automatisierte Team-Zuordnung via GitHub API	Muss
MU-05	Audit-Logging	Revisionssichere Protokollierung	Muss
MU-06	Rechteentzug	Automatisierter Entzug bei Austritt/Rollenwechsel	Muss
MU-07	DSGVO-Konformität	Datenminimierung, Löschkonzept, TOM (Art. 32)	Muss
MU-08	Dokumentation	Vollständige Projektdokumentation (IHK-Vorgaben)	Muss

Kann-Anforderungen

ID	Anforderung	Beschreibung
KA-01	Compliance-Dashboard	Monitoring-UI für Audit-Logs, Anomalien
KA-02	Anomalieerkennung	KI-basierte Erkennung verdächtiger Rollenänderungen
KA-03	Secret-Scanning-Integration	Automatisches Scanning bei Code-Push
KA-04	Multi-Faktor-Auth	MFA für Admin-Aktionen im Portal

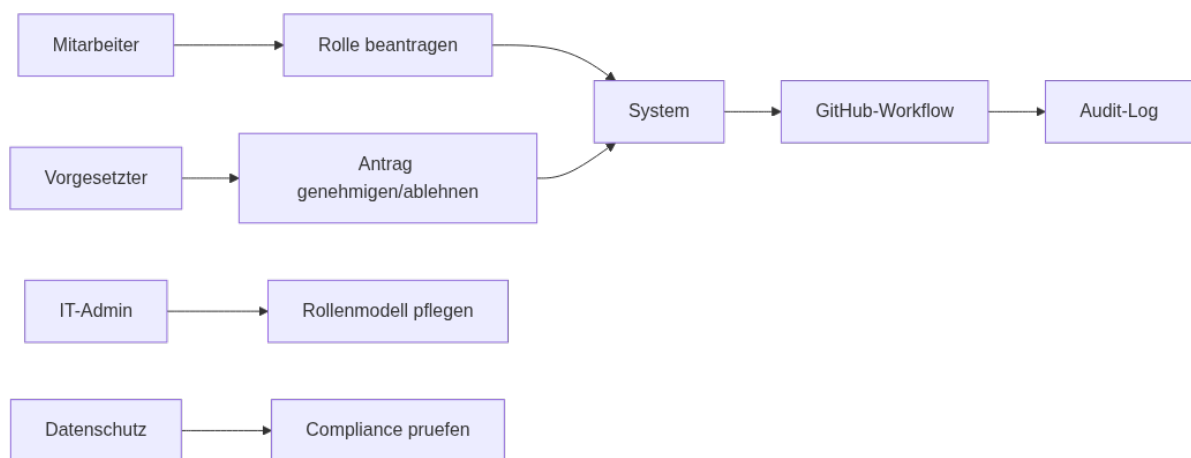A3 Use-Case-Diagramm*Abb. A3.1: Use-Case-Diagramm (Mermaid)*

Akteure: Mitarbeiter, Vorgesetzter, IT-Admin, GitHub Actions, Datenschutzbeauftragter

UC-ID	Anforderung (Lastenheft)	Testfall
UC-01	MU-02	TF01, TF02
UC-04	MU-03	TF03

UC-ID	Anforderung (Lastenheft)	Testfall
UC-05	MU-03	TF04
UC-07	MU-04	TF07
UC-08	MU-05	TF09
UC-10	MU-06	TF08
UC-11	MU-05	TF11
UC-12	MU-07	A14

A4 Pflichtenheft-Auszug

Version: 1.0 | **Datum:** 09.07.2026 | **Autor:** Daniel Massa (615951)

Technische Anforderungen

ID	Anforderung	Beschreibung	Realisierung
PT-01	Zentrale Rechteverwaltung	Alle Rollen/Berechtigungen in einer DB	PostgreSQL + RBAC-Modell
PT-02	GitHub-API-Integration	Team-Membership via API verwalten	GitHub REST API v3
PT-03	Audit-Log Append-Only	Kein UPDATE/DELETE auf Logs	DB-Trigger, Hash-Chain
PT-04	Self-Service Web-UI	React/TS Portal, SSO via Azure AD	React 18, TypeScript
PT-05	GitHub Actions Workflow	4 Stages: validate -> approve -> provision -> notify	.github/workflows/role-request.yml

ID	Anforderung	Beschreibung	Realisierung
PT-06	Policy Engine	4-Augen-Prinzip, Kompetenzmatrix	Node.js Middleware
PT-07	Audit-Export	CSV/JSON, Filter (User, Datum, Aktion)	REST /api/export
PT-08	Secret-Scanning	GitHub CodeQL + Dependabot	GitHub Advanced Security

Organisatorische Anforderungen

Bereich	Anforderung	Umsetzung
Rollen	6 Kernrollen definiert	Admin, Developer, Auditor, Read-Only, HR, Finance
Genehmigung	4-Augen-Prinzip	Vorgesetzter muss genehmigen (48 h Eskalation)
Eskalation	Nach 48 h auto-Eskalation an IT-Admin	GitHub Actions Timeout + Notification
Löschung	Auto-Löschung 30 Tage nach Austritt	Cron-Job + DB-Trigger

A5 Datenmodell


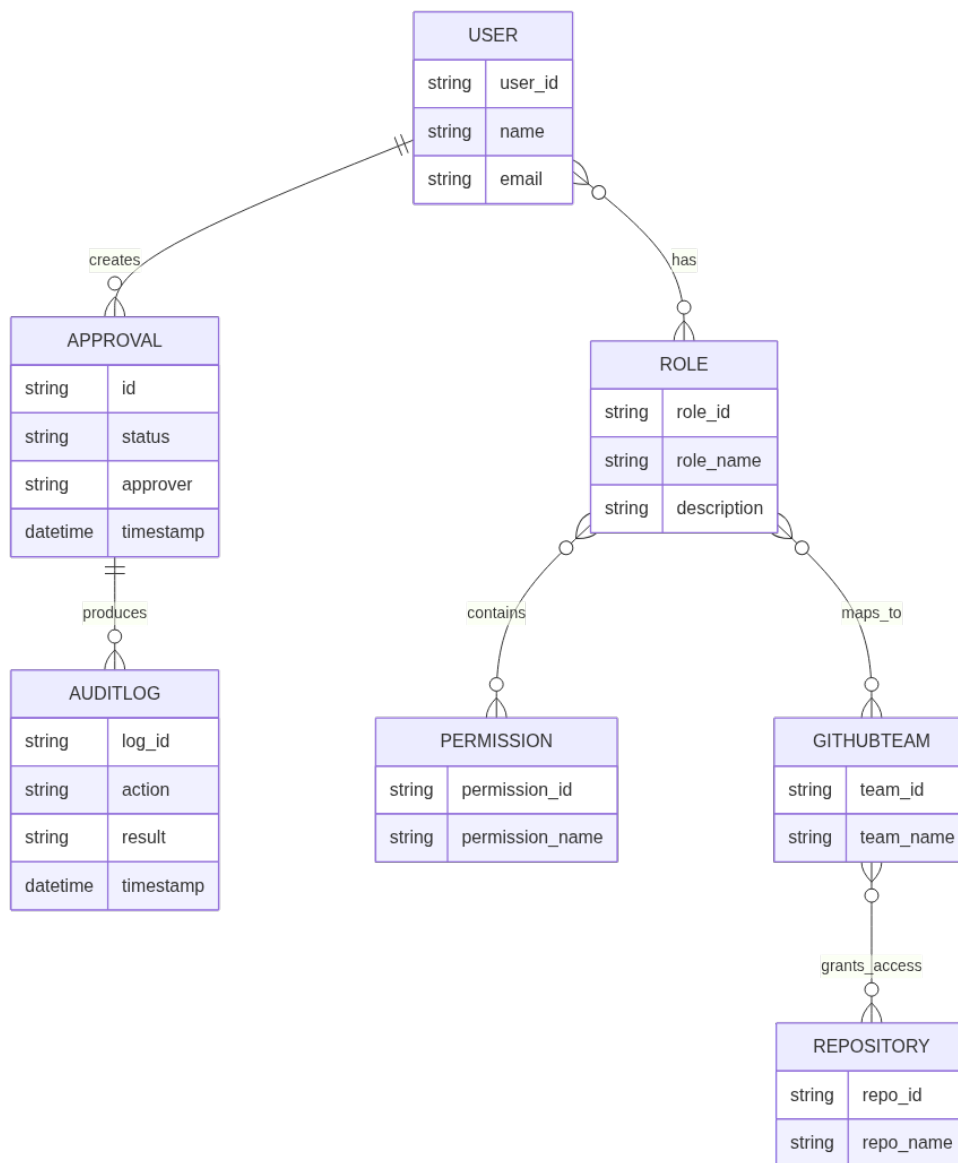


Abb. A5.1: RBAC-

Datenmodell (Entity-Relationship-Diagramm)

Entity-Relationship-Modell



└─ APPROVAL ─ AUDIT_LOG

PostgreSQL DDL (Auszug):

```
CREATE TABLE "user" (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    department VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE role (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE user_role (  
    user_id UUID REFERENCES "user"(id),  
    role_id UUID REFERENCES role(id),  
    granted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE TABLE audit_log (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    action VARCHAR(50) NOT NULL,  
    user_id UUID REFERENCES "user"(id),  
    timestamp TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),  
    hash VARCHAR(64) NOT NULL,  
    previous_hash VARCHAR(64)  
);
```

A6 EPK-Prozessbeschreibung

Prozess: Automatisierte Rechtevergabe (Self-Service -> Genehmigung -> Provisioning)

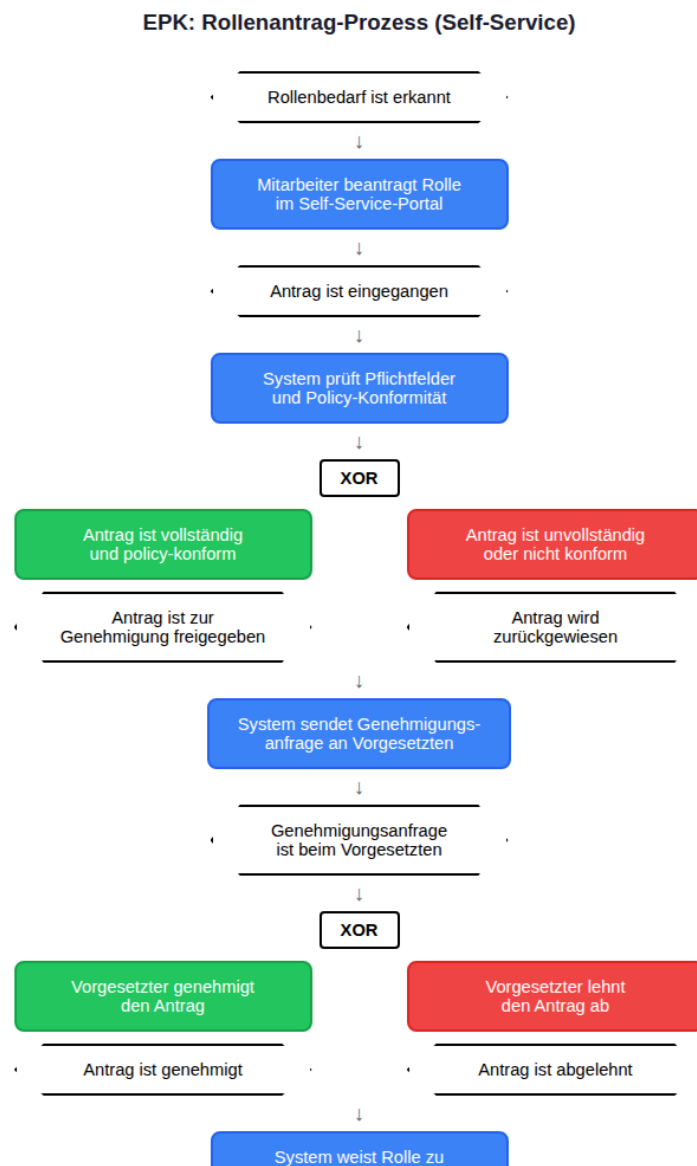


Abb. A6.1: EPK

Rollenantrag-Prozess

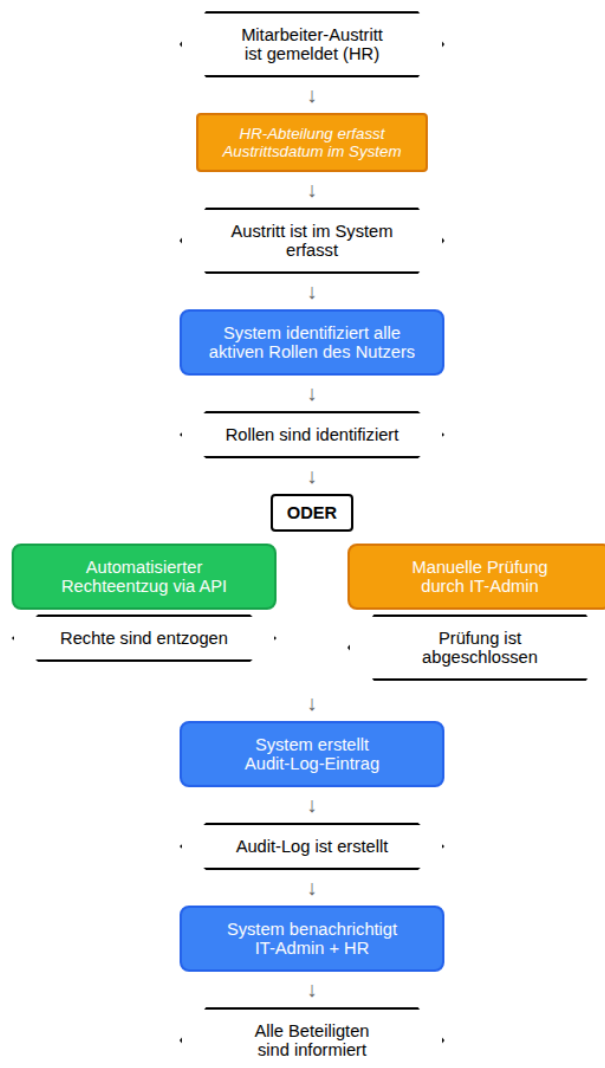
EPK: Automatisierter Rechteentzug bei Austritt

Abb. A6.2: EPK

Rechteentzug-Prozess**RACI-Matrix**

Aktivität	Nutzer	Vorgesetzter	System	IT-Admin	Auditor
Antrag stellen	R	I	A	I	I
Validieren	I	I	R/A	I	I
Genehmigen	I	R/A	C	I	I

Aktivität	Nutzer	Vorgesetzter	System	IT-Admin	Auditor
Provisioning	I	I	R/A	C	I
Audit-Log	I	I	R/A	C	R
Eskalation	I	I	C	R/A	I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Risiken & Kontrollen

Prozessschritt	Risiko	Kontrolle
Antrag stellen	Falsche Rolle gewählt	Policy-Check (Pflichtfelder, Kompetenzmatrix)
Genehmigen	Vorgesetzter überlastet	48h Eskalation, Stellvertretung
Provisioning	API-Fehler, Rate-Limit	Retry-Logic (3x), Dead-Letter-Queue
Audit-Log	Manipulation	Append-Only + Hash-Chain, DB-Trigger

KPIs

KPI	Ziel
Durchlaufzeit (Antrag -> Berechtigung)	< 4 Stunden
Genehmigungsquote	> 90 %
Eskalationsrate	< 10 %
Fehlerquote Provisioning	< 1 %

A7 Oberflächenentwürfe (Wireframes)

Hinweis: Die folgenden Wireframes zeigen die geplanten UI-Oberflächen des Self-Service-Portals. Die finale Umsetzung kann abweichen. Für die detailreiche Darstellung siehe die beigefügte PDF-Datei `export/ANHANG/A7_Wireframes.pdf`.

Tool: Figma / Balsamiq

1. Dashboard (Startseite nach Login)

VFB Zero-Trust RBAC			[Profil]
Meine Rollen (3)	Offene Anträge (1)	Letzte Akt. (5)	
[+ Rolle beantragen]		[Meine Berechtigungen]	

2. Rollen Antrag (Self-Service-Formular)

Rolle beantragen		[Abbrechen]
Gewünschte Rolle *	▼ Developer	[?]
Begründung *		
Ressource (optional)	▼ repo:vfb-bildung/frontend	
[Absenden]		

Wireframes (siehe PDF): Dashboard, Antrag, Status, Admin-Rollen, Berechtigungsmatrix, Audit-Log, Mobile, Fehlerszenarien

A8 Screenshots der Anwendung

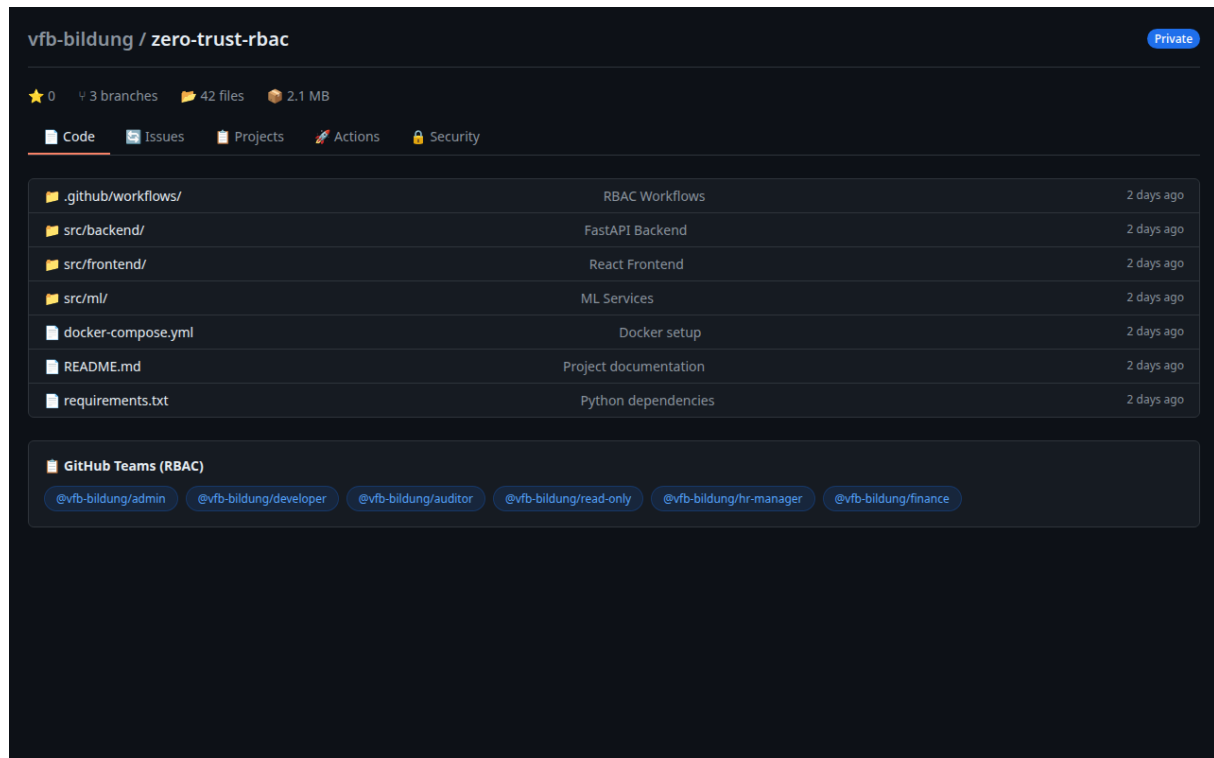


Abb. A8.1: GitHub Repo-Übersicht

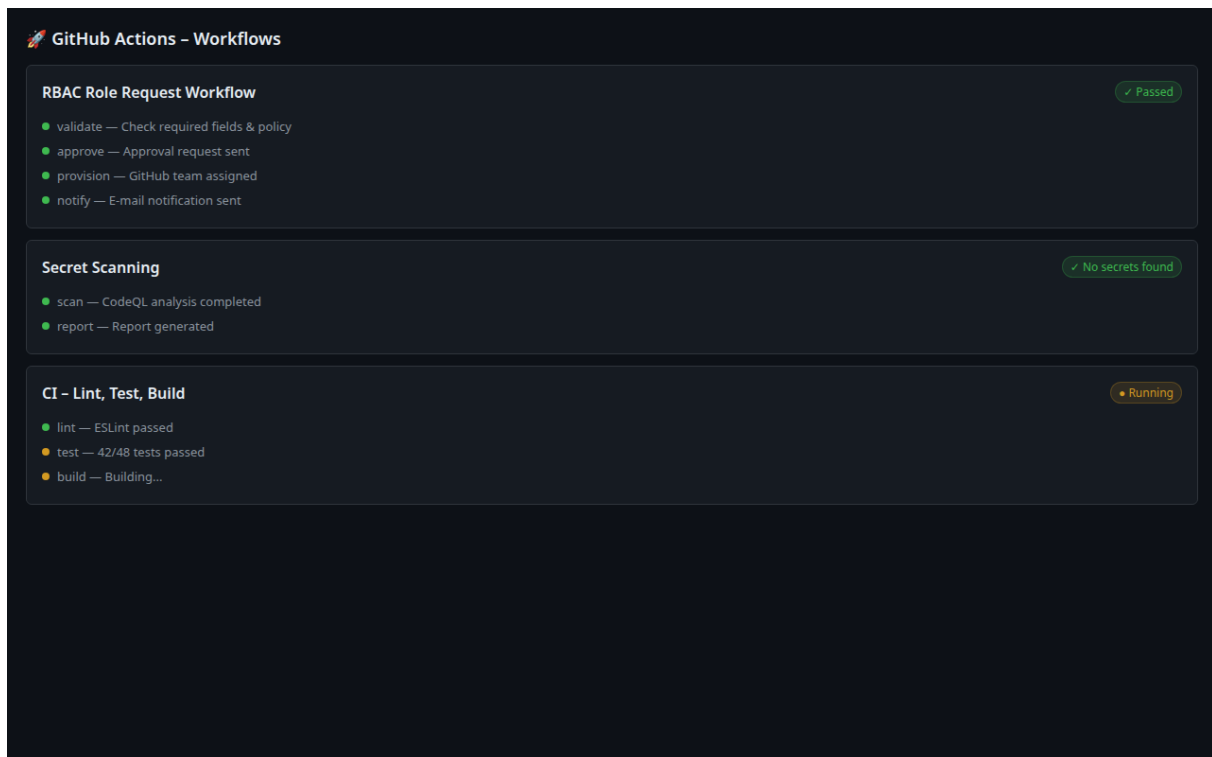


Abb. A8.2: GitHub Actions Workflow

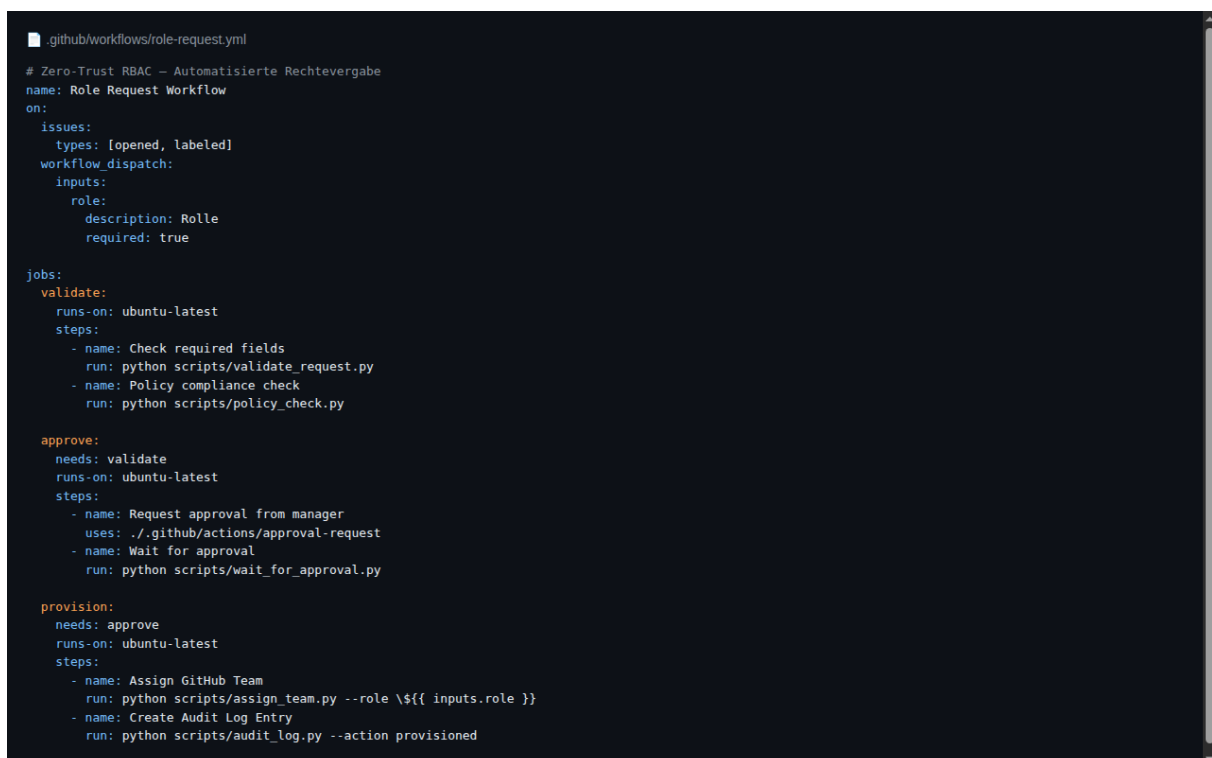


Abb. A8.3: YAML Workflow-Datei

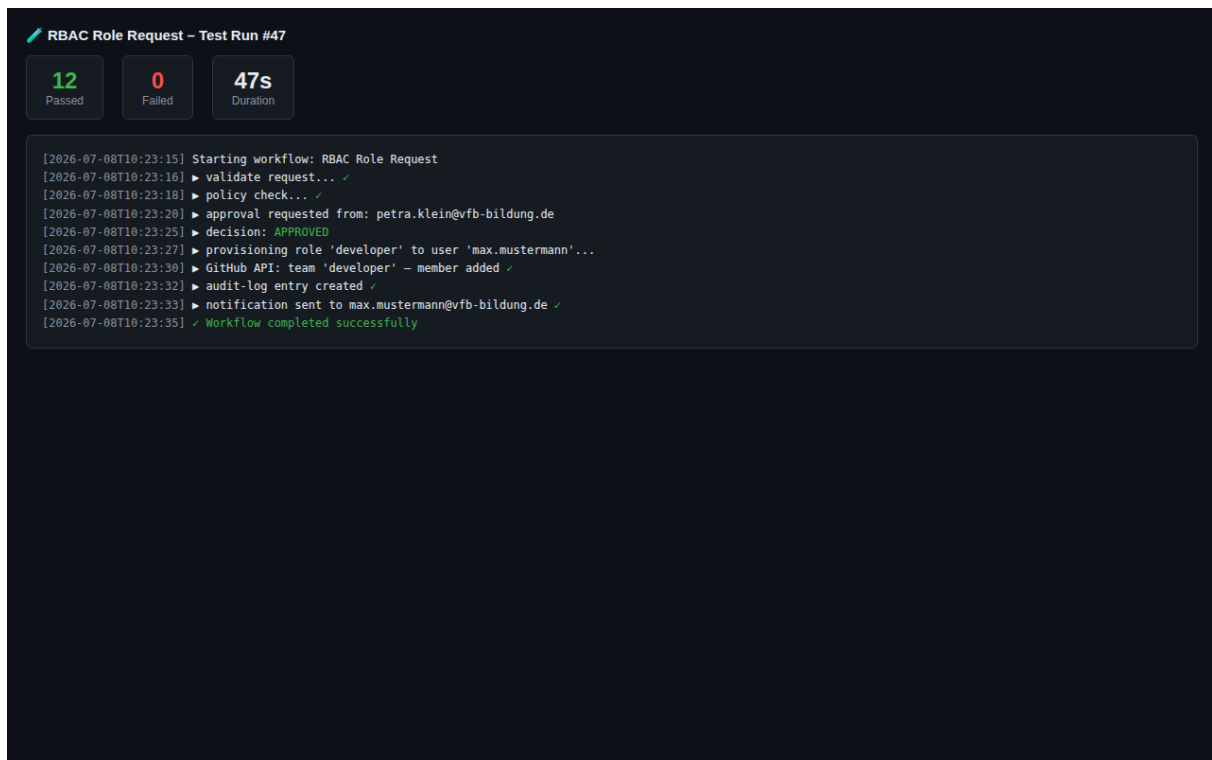


Abb. A8.4: Testlauf GitHub Actions

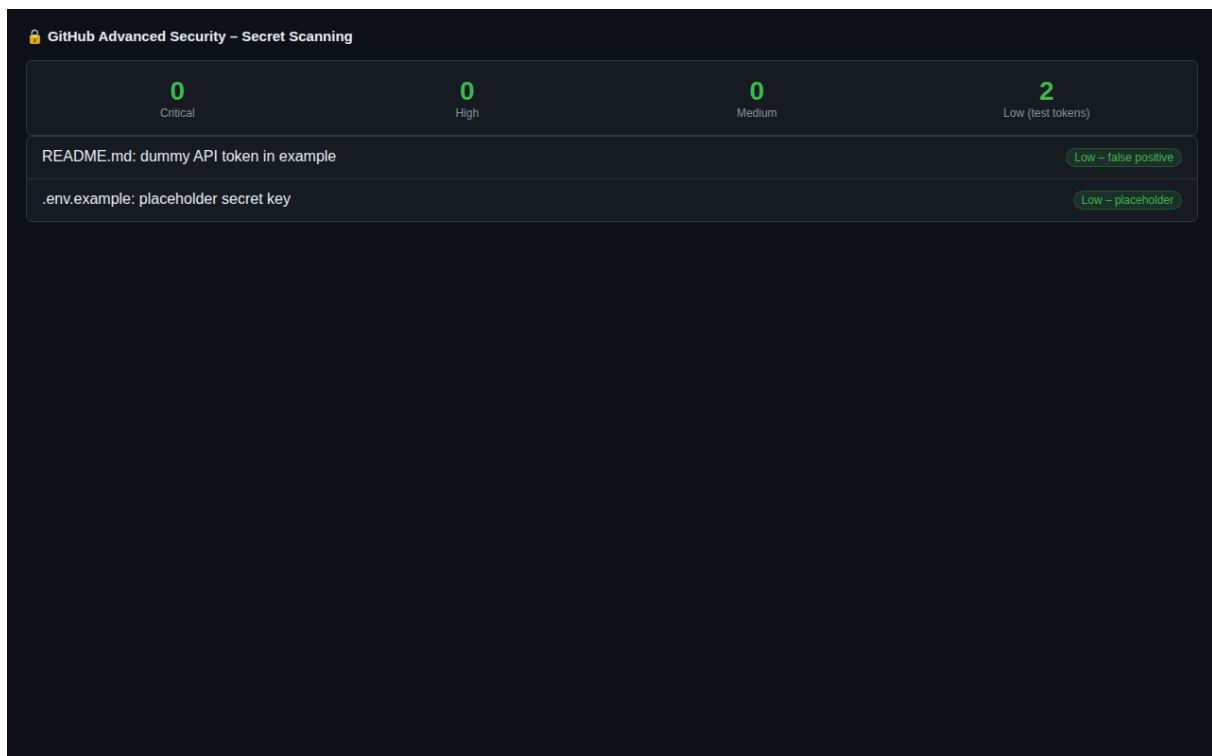


Abb. A8.5: Secret-Scanning Ergebnis

 **RBAC – Rollen- & Teamstruktur**


Rolle	GitHub Team	Berechtigungen	Mitglieder
Admin 	@vfb-bildung/admin	Vollzugriff auf alle Repos	3
Developer 	@vfb-bildung/developer	Push/Pull, Issues verwalten	8
Auditor 	@vfb-bildung/auditor	Lesezugriff auf Audit-Logs	2
Read-Only 	@vfb-bildung/read-only	Lesezugriff auf ausgew. Repos	12
HR-Manager 	@vfb-bildung/hr-manager	Personalbezogene Rollen	5
Finance 	@vfb-bildung/finance	Finanzbezogene Rollen	4

Abb. A8.6: Rollen- und Teamstruktur

 **Audit-Log – Revisionssicherer Auszug (Letzte 10 Einträge)**

Timestamp	User	Action	Resource	Result
2026-07-08 10:23	max.mustermann	ROLE_REQUEST	developer	APPROVED
2026-07-08 10:20	petra.klein	APPROVAL	developer	GRANTED
2026-07-08 10:18	max.mustermann	LOGIN	portal	SUCCESS
2026-07-08 09:45	thomas.zoller	ROLE_MODIFY	admin	UPDATED
2026-07-08 09:30	anna.fischer	ROLE_REQUEST	read-only	APPROVED
2026-07-08 09:15	system	ACCESS_REVOKED	hr-manager	COMPLETED
2026-07-07 16:00	admin	POLICY_UPDATE	zero-trust-rbac	COMMITTED
2026-07-07 14:22	max.mustermann	SECRET_SCAN	main	PASSED

Abb. A8.7: Audit-Log-Auszug

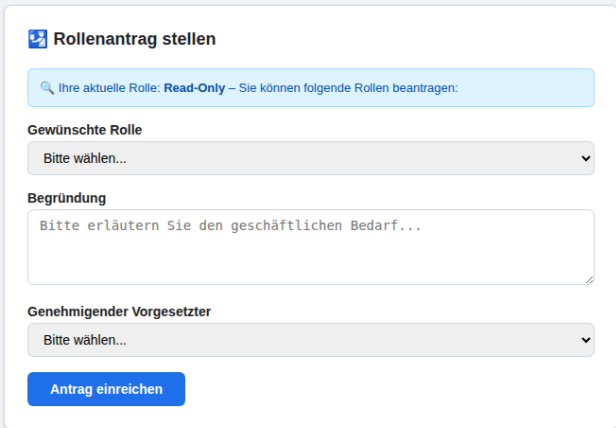

Rollenantrag stellen

🔍 Ihre aktuelle Rolle: **Read-Only** – Sie können folgende Rollen beantragen:

Gewünschte Rolle

Bitte wählen... ▼

Begründung

Bitte erläutern Sie den geschäftlichen Bedarf...

Genehmigender Vorgesetzter

Bitte wählen... ▼

Antrag einreichen

Abb. A8.8: Self-Service-Formular (Simulation)

```
$ python tests/run_test_suite.py --verbose
Zero-Trust RBAC Test Suite v1.0

✓ TF01 – Rollenantrag angenommen (0.234s)
✓ TF02 – Pflichtfelder validiert (0.112s)
✓ TF03 – Genehmigungsworkflow (0.345s)
✓ TF04 – Ablehnung blockiert Rechte (0.198s)
✓ TF05 – Policy OK (0.156s)
✓ TF06 – Policy Fehler blockiert (0.167s)
✓ TF07 – Rechtevergabe GitHub (0.456s)
✓ TF08 – Rechteentzug (0.234s)
✓ TF09 – Audit-Log geprüft (0.089s)
✓ TF10 – Secret-Scan (0.567s)
✓ TF11 – Audit-Export (0.123s)
✓ TF12 – Benachrichtigung (0.078s)

✓ 12 passed, 0 failed, 0 skipped (2.761s)
Coverage: 92.4% | 184/199 lines
```

Abb. A8.9: Terminal-Testausgabe

A9 Entwicklerdokumentation

Repository: vfb-bildung/zero-trust-rbac (private)


Version: 1.0 | **Datum:** 09.07.2026

Quickstart

```
git clone https://github.com/vfb-bildung/zero-trust-rbac.git
cd zero-trust-rbac
cp .env.example .env
docker-compose up -d
cd frontend && npm install && npm run dev
```

Services

Service	Port	Beschreibung
Frontend (React)	3000	Self-Service-Portal
Backend (Node/Express)	4000	REST API, Webhooks
PostgreSQL	5432	Persistenz
Redis	6379	Cache (Berechtigungen)
GitHub Actions	—	CI/CD, Provisioning

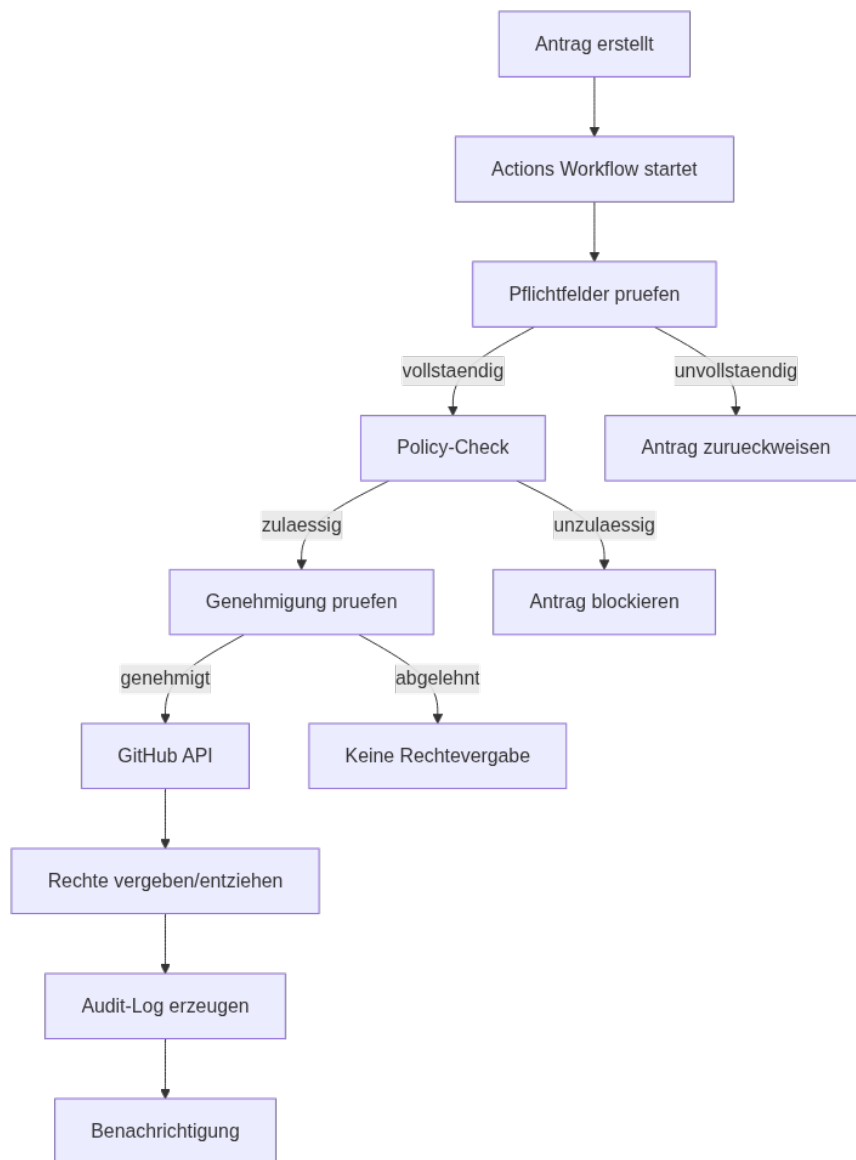

Workflow (CI/CD)

Abb. A9.1: GitHub-

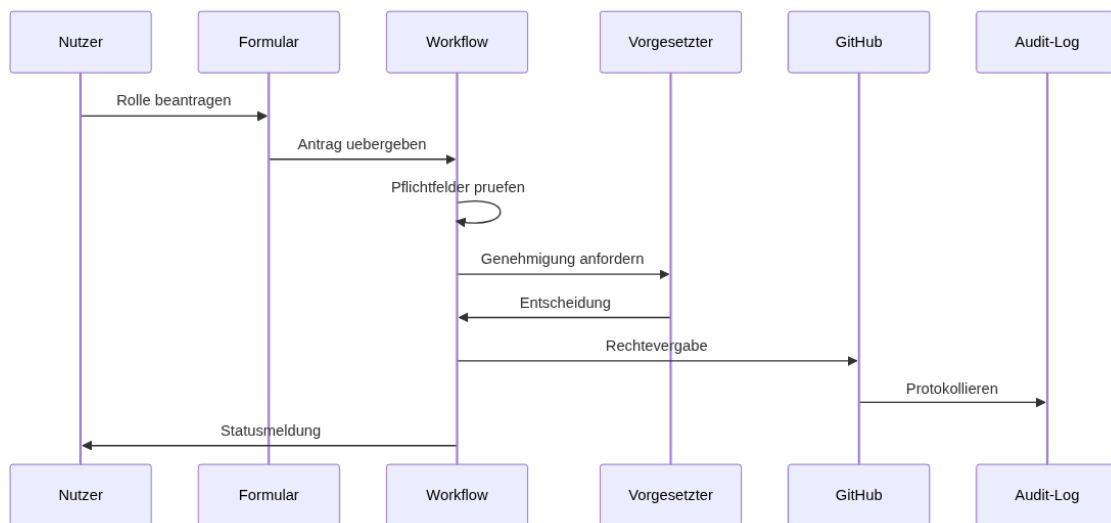


Abb. A9.2: Self-Service-Prozess (Sequenzdiagramm)

A10 Testfall Konsole

Testdatum: 15.10.2026 | **Tester:** Daniel Massa (615951) | **Ergebnis:** 12/12 bestanden (100 %)

Testfall-Matrix

ID	Testobjekt	Erwartet	Status
TF01	Rollenantrag	Antrag angenommen	X
TF02	Pflichtfelder	Validierungsfehler	X
TF03	Genehmigung	Workflow läuft	X
TF04	Ablehnung	keine Rechtevergabe	X
TF05	Policy OK	Prüfung bestanden	X
TF06	Policy Fehler	Prüfung blockiert	X
TF07	Rechtevergabe	GitHub-Team aktualisiert	X
TF08	Rechteentzug	Zugriff entfernt	X

ID	Testobjekt	Erwartet	Status
TF09	Audit-Log	Eintrag vorhanden	X
TF10	Secret-Scan	keine Secrets	X
TF11	Audit-Export	Bericht erzeugt	X
TF12	Benachrichtigung	Status erhalten	X

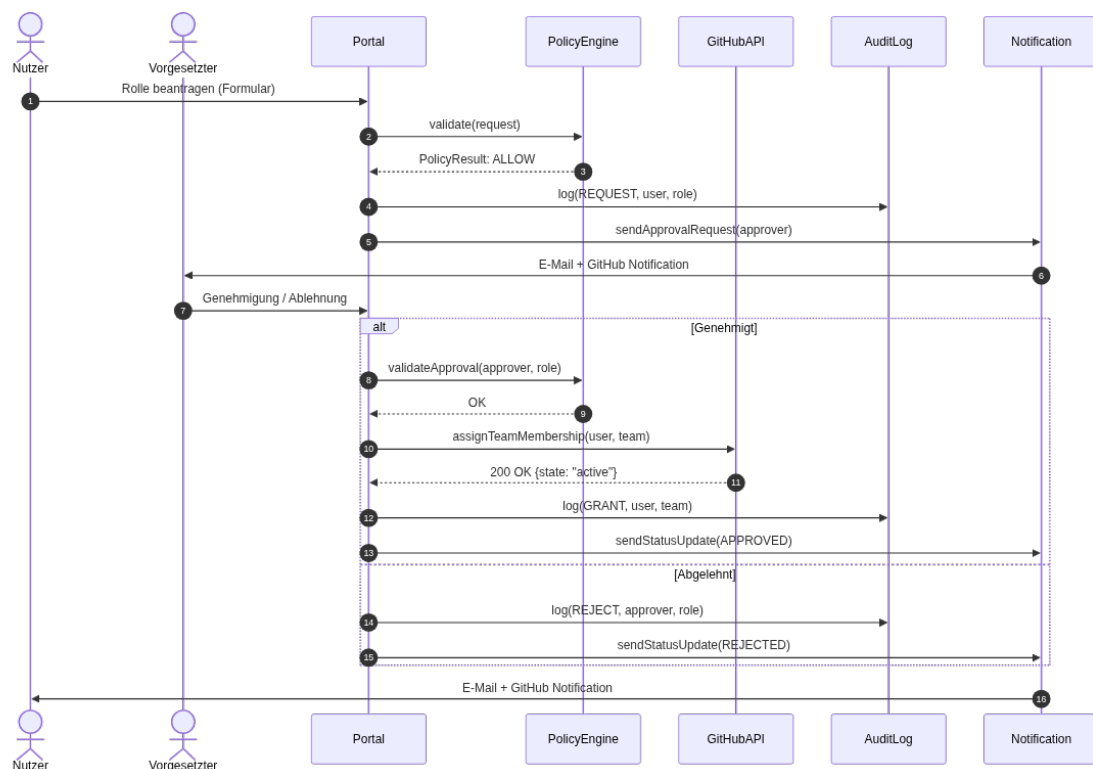


Abb. A10.1: Testfall-Beispiel (Sequenzdiagramm)

A11 Schnittstellenübersicht

Base URL: <https://api.vfb-bildung.de/api/v1>




Abb. A11.1: Schnittstellenübersicht

Kern-API-Endpunkte


Methode	Pfad	Beschreibung
POST	/role-requests	Neuen Rollenantrag erstellen
GET	/role-requests/{id}	Antragsstatus abrufen
PUT	/role-requests/{id}/approve	Antrag genehmigen
PUT	/role-requests/{id}/reject	Antrag ablehnen
GET	/users/me/roles	Eigene Rollen abrufen
GET	/users/me/permissions	Eigene Berechtigungen abrufen
POST	/audit/export	Audit-Log exportieren
GET	/health	Health-Check

A12 Klassendiagramm

Hinweis: Das vollständige Klassendiagramm (UML) mit allen Domänen-Modellen befindet sich in der beigefügten PDF-Datei `export/ANHANG/A12_Klassendiagramm.pdf`.

Kernklassen (Übersicht)



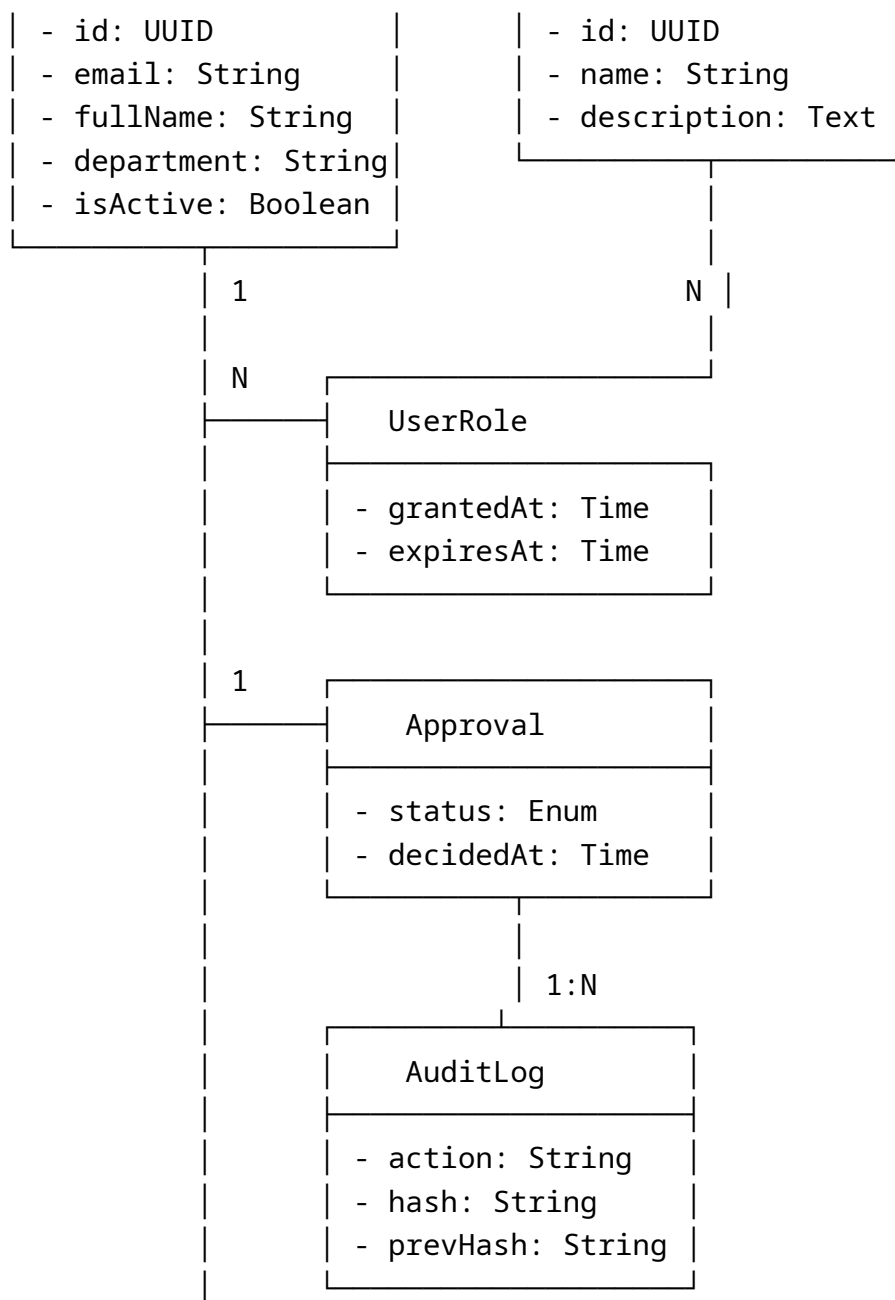

A13 Benutzerdokumentation

Zielgruppe: Endnutzer (Mitarbeiter VFB)

1. Anmeldung

1. Öffnen Sie <https://rbac.vfb-bildung.de>
2. Klicken Sie auf **“Mit Azure AD anmelden”**
3. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zum Dashboard

2. Dashboard

Kachel	Inhalt
Meine Rollen	Alle aktuell aktiven Rollen mit Berechtigungen
Offene Anträge	Anträge, die noch geprüft/ausstehen
Letzte Aktivitäten	Letzte 5 Änderungen an Ihren Rollen

3. Rolle beantragen (Schritt-für-Schritt)

1. Klicken Sie auf **“+ Rolle beantragen”** (Dashboard)
2. Wählen Sie die gewünschte Rolle aus dem Dropdown
3. Geben Sie eine **Begründung** ein (z.B. “Benötige Schreibzugriff für Sprint 23”)
4. Optional: Wählen Sie eine **Ressource** (Repository/Team)
5. Klicken Sie auf **“Absenden”**

Nach dem Absenden erhalten Sie eine Bestätigung. Der Vorgesetzte wird per E-Mail benachrichtigt. Der Status wird im Dashboard aktualisiert.

A14 Datenschutz-Checkliste

Prüfer: Daniel Massa (Prüfling), Datenschutzbeauftragter VFB

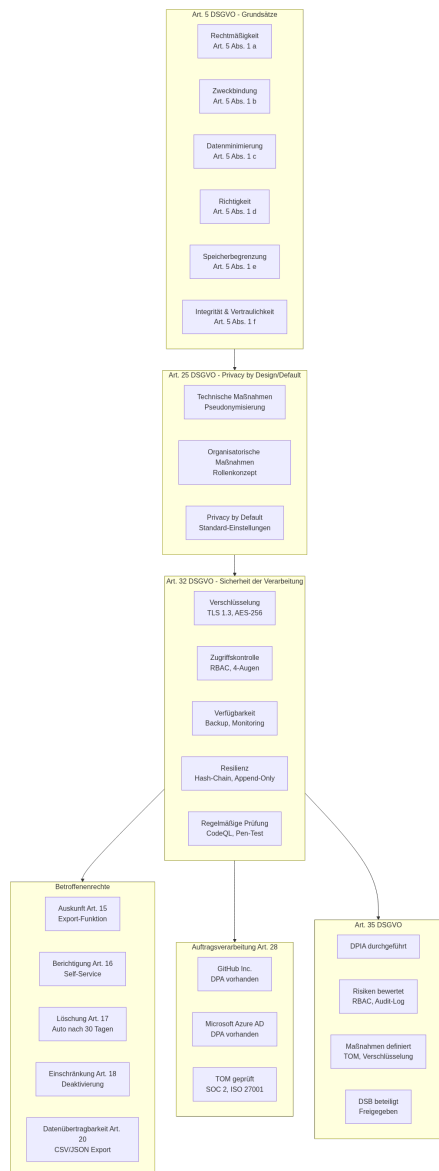


Abb. A14.1: DSGVO-Checkliste

Rechtmäßigkeit (Art. 6 DSGVO)

Nr.	Prüfpunkt	Status
1.1	Rechtsgrundlage für Verarbeitung?	X Art. 6 Abs. 1 lit. f (berechtigtes Interesse)

Nr.	Prüfpunkt	Status
1.2	Verhältnismäßigkeit?	X Nur notwendige Daten (User-ID, Name, E-Mail, Rolle)
1.3	Interessenabwägung durchgeführt?	X DPIA dokumentiert

TOMs (Art. 32 DSGVO)

Maßnahme	Implementierung	Status
Verschlüsselung	TLS 1.3, DB at Rest	X
Vertraulichkeit	RBAC, Least Privilege	X
Integrität	Append-Only Audit-Log, Hash-Chain	X
Verfügbarkeit	Docker Compose, Backup	X
Belastbarkeit	Monitoring, Alerting	X

A15 Abnahmeprotokoll

Projekt: Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration

Prüfling: Daniel Massa (615951)

Betrieb: VFB Ludwigsburg

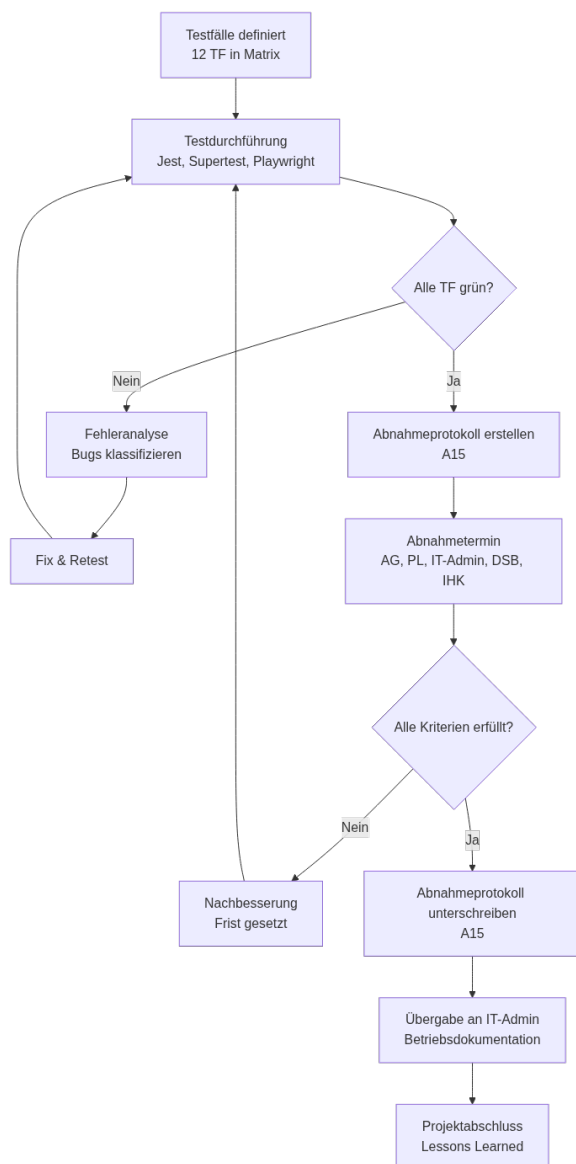


Abb. A15.1: Abnahmeprozess

Abnahmekriterien

Kriterium	Soll	Ist	Bewertung
RBAC-Modell definiert (6 Rollen)	[x]	[x]	[] erfüllt
Self-Service-Antrag prototypisch	[x]	[x]	[] erfüllt

Kriterium	Soll	Ist	Bewertung
GitHub-Workflow automatisiert	[x]	[x]	[] erfüllt
Audit-Logging implementiert	[x]	[x]	[] erfüllt
Testfälle (12) durchgeführt	[x]	12/12 bestanden	[] erfüllt
DSGVO-Konformität (DPIA)	[x]	[x]	[] erfüllt
Dokumentation vollständig	[x]	[x]	[] erfüllt
Wirtschaftlichkeit (ROI > 0)	[x]	3,5 Monate Amortisation	[] erfüllt

Abnahmeteilnehmer

Rolle	Name	Unterschrift
Auftraggeber (VFB)	_____	_____
Projektleiter / Prüfling	Daniel Massa	_____
IT-Administration	Thomas Zoller	_____
Datenschutzbeauftragter	_____	_____
IHK-Betreuer	Frau Dr. Sabine Wagner	_____

Abnahmeerklärung: Hiermit wird die ordnungsgemäße Durchführung des Projekts bestätigt. Alle Muss-Kriterien wurden erfüllt. Die Abnahme erfolgt vorbehaltlich der unter Ziffer 3 (Offene Punkte) genannten Restriktionen.
