

Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration

Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-basierter Workflow-Integration

Prüfungsfach:	Betriebliche IT-Prozesse	
Fortbildungsprüfung:	Certified IT Business Manager (IHK)	
Prüfling:	Daniel Massa, Prüflingsnummer 615951	
Projektbetrieb:	Verein zur Förderung der Berufsbildung e.V., Kurfürstenstraße 6, 71636 Ludwigsburg	Erklärung:
Wohnanschrift:	Hackstraße 41, 70190 Stuttgart	
Abgabedatum:	01.11.2026	
Betreuer im Betrieb:	Carsten Vordermeier	
IHK-Betreuer:	Frau Dr. Sabine Wagner, IHK Stuttgart	

Die Projektarbeit wurde selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Stuttgart, den 01.11.2026 _____

Daniel Massa

Sperrvermerk

Die vorliegende Projektarbeit ist vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht gestattet.

Contents

Sperrvermerk

Abbildungsverzeichnis	iv
------------------------------	-----------

Tabellenverzeichnis	v
----------------------------	----------

Abkürzungsverzeichnis	vi
------------------------------	-----------

1 Initiierung	1
1.1 Projektumfeld und Ausgangssituation	1
Projektziel	1
Projektbegründung	1
Projektschnittstellen	1
Projektabgrenzung	1
1.2 Zieldefinition	2
Projektbegründung	2
Projektschnittstellen	2
Projektabgrenzung	2
1.3 Projektrahmen	2
Projektschnittstellen	2
Projektabgrenzung	2
1.4 Abgrenzung der Projekteinhalte	2
Projektabgrenzung	3
1.5 Projekialternativen	3
Nutzwertanalyse	3
Anwendungsfälle (Use Cases)	3
Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)	3
Lastenheft/Fachkonzept	3
1.6 Lastenheft / Anforderungen	4
1.7 Projektteam / Rollen	4
1.8 Projektorganisation	4
1.9 Projektauftrag	4
2.1 Kick-Off / Projektstart	5
Abweichungen vom Projektantrag	5
Ressourcenplanung	5
Entwicklungsprozess	5
2.2 Stakeholderanalyse	5
Projektabgrenzung	6
2.3 Kommunikationsplan	6
Wirtschaftlichkeitsanalyse	6
Nutzwertanalyse	6
Anwendungsfälle (Use Cases)	7
Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)	7
Lastenheft/Fachkonzept	7
2.5 Anforderungsanalyse	7
Anwendungsfälle (Use Cases)	7
Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)	7
Lastenheft/Fachkonzept	7
2.6 Machbarkeitsanalyse	8
Nutzwertanalyse	8
Anwendungsfälle (Use Cases)	8

Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)	8
Lastenheft/Fachkonzept	8
Nutzwertanalyse	8
Anwendungsfälle (Use Cases)	8
Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)	9
Lastenheft/Fachkonzept	9
2.7 Risikoanalyse	9
2.8 Projektstrukturplan	9
2.9 Vorgehensmodell	10
2.10 Meilensteine	10
2.11 Arbeitspakete	10
2.12 Ablauf- und Terminplanung	10
2.13 Kostenplanung	11
Entwicklungsprozess	11
2.14 Qualitätsmanagement	11
2.15 Projektcontrolling	11
3.1 Technologieauswahl	12
Architekturdesign	12
Benutzeroberfläche (Mockups)	12
Datenmodell (Entity-Relationship)	12
Geschäftslogik	12
Qualitätssicherung	12
Pflichtenheft / DSGVO-Konzept	13
3.2 Berechtigungskonzept / RBAC	13
Qualitätssicherung	13
Pflichtenheft / DSGVO-Konzept	13
3.3 Architekturentscheidungen	13
Benutzeroberfläche (Mockups)	14
Datenmodell (Entity-Relationship)	14
Geschäftslogik	14
Qualitätssicherung	14
Pflichtenheft / DSGVO-Konzept	14
3.4 GitHub-/CI-CD-Konzept	14
3.5 Schnittstellen / Datenflüsse	15
Geschäftslogik	15
Qualitätssicherung	15
Pflichtenheft / DSGVO-Konzept	16
3.6 Testkonzept	16
Pflichtenheft / DSGVO-Konzept	16
4.1 Umsetzung GitHub-Repository	17
Benutzeroberfläche	17
Geschäftslogik & GitHub Integration	17
4.2 Umsetzung CI/CD-Workflow	18
Geschäftslogik & GitHub Integration	18
4.3 Umsetzung Policy-/Audit-Komponenten	19
4.4 Testszenarien durchführen und auswerten	19
4.5 Kontinuierliche Abstimmung	20
4.6 Kostenkontrolle	20
4.7 Terminkontrolle	20
5 Abschluss	20
5.1 Projektabnahme	20

Testfall-Beispiel (Anhang A10)	21
5.2 Lessons Learned	21
Ausblick	21
5.3 Projektabschlussbericht	21
5.4 Nachkalkulation	21
5.5 Nacharbeiten / Betrieb	22
5.6 Persönliches Fazit	22
6 Anhang	22
6.1 RACI-Matrix	22
6.2 Stakeholderanalyse	23
6.3 Kommunikationsplan	23
6.4 Anforderungen / Testfälle	23
6.5 Risikoanalyse	25
6.6 Projektstrukturplan	25
6.7 Architektur- und Ablaufdiagramme	27
6.8 Screenshots / Systemnachweise	27
6.9 Audit-/CI-CD-Nachweise	30
6.10 ML/KI-Erweiterung als experimenteller Folgeausbau	30
Literaturverzeichnis	32
Normen & Standards	32
Fachliteratur	32
Projektmanagement	32
IT-Security & Compliance	32
Weitere Quellen	32
Eidesstattliche Versicherung	33

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Projektstrukturplan (PSP)
- Abbildung 2: Stakeholder-Matrix
- Abbildung 3: Risikomatrix
- Abbildung 4: Projektzeitplan (Gantt-Diagramm)
- Abbildung 5: Kostenverlauf Soll/Ist
- Abbildung 6: Meilenstein-Trend-Analyse
- Abbildung 7: Kommunikationsstruktur
- Abbildung 8: Zielarchitektur Zero Trust
- Abbildung 9: Sicherheitszonen- und Vertrauensmodell
- Abbildung 10: Datenfluss und Kontrollpunkte
- Abbildung 11: CI/CD-Pipeline mit Security Gates
- Abbildung 12: Test- und Abnahmeprozess
- Abbildung 13: Betriebsprozess nach Go-Live
- Abbildung 14: Monitoring- und KPI-Dashboard
- Abbildung 15: RACI-Matrix
- Abbildung 16: Self-Service: Rollenbeantragung
- Abbildung 17: Genehmigungs-Dashboard
- Abbildung 18: GitHub Actions Workflow (YAML)
- Abbildung 19: Actions Run – Testnachweis
- Abbildung 20: Secret-Scanning (Security-Test)
- Abbildung 21: RBAC-Matrix / Teamstruktur
- Abbildung 22: Audit-Log-Auszug (Revisionssicherheit)
- Abbildung 23: GitHub Repository Übersicht
- Abbildung 24: Terminal – Testausgabe (pytest)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Tabelle 1: Zeitplanung 70 Stunden
Tabelle 2:	Tabelle 2: Kostenplanung
Tabelle 3:	Tabelle 3: Stakeholdermatrix
Tabelle 4:	Tabelle 4: Risikomatrix (1-5 Skala)
Tabelle 5:	Tabelle 5: Nutzwertanalyse (1-5)
Tabelle 6:	Tabelle 6: Make-or-Buy
Tabelle 7:	Tabelle 7: Anforderungsmatrix
Tabelle 8:	Tabelle 8: Testfallmatrix
Tabelle 9:	Tabelle 9: Soll-Ist-Vergleich
Tabelle 10:	Tabelle 10: Kommunikationsmatrix
Tabelle 11:	Tabelle 11: RACI-Matrix
Tabelle 12:	Tabelle 12: KPI-Matrix

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
API	Application Programming Interface
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
ERD / ERM	Entity Relationship Diagram / Model
GitHub	GitHub Enterprise / GitHub.com
IAM	Identity and Access Management
KPI	Key Performance Indicator
MTA	Meilensteintrendanalyse
PSP	Projektstrukturplan
RBAC	Role-Based Access Control
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
REST	Representational State Transfer
SIEM	Security Information and Event Management
SQL	Structured Query Language
SSO	Single Sign-On
TDD	Test-Driven Development
UI/UX	User Interface / User Experience
YAML	YAML Ain't Markup Language
Zero Trust	Zero-Trust-Sicherheitsmodell (Never Trust, Always Verify)

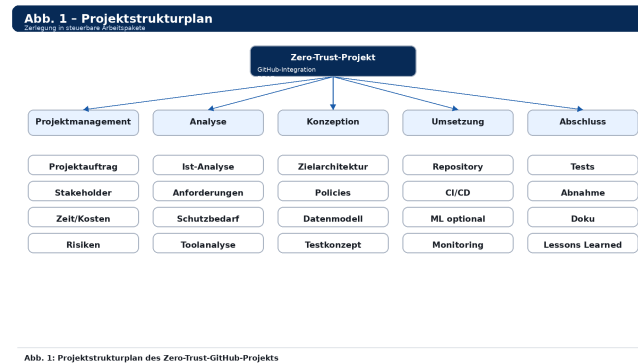


Figure 1: Abbildung 1: Projektstrukturplan (PSP)

1 Initiierung

1.1 Projektumfeld und Ausgangssituation

Der **Verein zur Förderung der Berufsbildung (VFB)** bietet als gemeinnütziger, regionaler Bildungsträger zahlreiche IHK- und IT-Qualifizierungen an. Mit rund 50 Beschäftigten und hybriden Lernplattformen ist die Digitalisierung zentraler Unternehmensfokus. Ziel ist es, mit effizienten, automatisierten Workflows unter Gewährleistung maximaler IT- und Datenschutzvorgaben innovative Vorreiterrolle einzunehmen.

Projektziel

Implementierung eines modernen **Zero-Trust-Sicherheitskonzepts** mit: - Automatisierter, rollenbasierter Rechtevergabe (RBAC) - Nahtloser GitHub-Workflow-Integration - Revisionssicheren Audit-Protokollen (DSGVO-konform) - Self-Service-Portal für Benutzeranträge

Projektbegründung

- Komplexe Compliance-Anforderungen
- Häufige personelle Wechsel
- Automatisierungswürdige Prozesse mit Medienbrüchen
- Sicherheitslücken durch manuelle Rechtevergabe

Projektschnittstellen

- On-Premises-Systeme
- Cloud-Dienste (GitHub API)
- Interne Datenbank (PostgreSQL)
- Monitoring/Reporting (Prometheus/Grafana)
- Azure AD / OIDC Authentifizierung

Projektabgrenzung

Nicht betrachtet: - Netzwerktechnische Infrastrukturprojekte - Legacy-Anwendungen (nicht-webbasiert) - Physische Sicherheitsinfrastruktur

Abbildung 1: Projektstrukturplan (PSP)

1.2 Zieldefinition

Implementierung eines modernen **Zero-Trust-Sicherheitskonzepts** mit: - Automatisierter, rollenbasierter Rechtevergabe (RBAC) - Nahtloser GitHub-Workflow-Integration - Revisionssicheren Audit-Protokollen (DSGVO-konform) - Self-Service-Portal für Benutzeranträge

Projektbegründung

- Komplexe Compliance-Anforderungen
- Häufige personelle Wechsel
- Automatisierungswürdige Prozesse mit Medienbrüchen
- Sicherheitslücken durch manuelle Rechtevergabe

Projektschnittstellen

- On-Premises-Systeme
- Cloud-Dienste (GitHub API)
- Interne Datenbank (PostgreSQL)
- Monitoring/Reporting (Prometheus/Grafana)
- Azure AD / OIDC Authentifizierung

Projektabgrenzung

Nicht betrachtet: - Netzwerktechnische Infrastrukturprojekte - Legacy-Anwendungen (nicht-webbasiert) - Physische Sicherheitsinfrastruktur

1.3 Projektrahmen

- Komplexe Compliance-Anforderungen
- Häufige personelle Wechsel
- Automatisierungswürdige Prozesse mit Medienbrüchen
- Sicherheitslücken durch manuelle Rechtevergabe

Projektschnittstellen

- On-Premises-Systeme
- Cloud-Dienste (GitHub API)
- Interne Datenbank (PostgreSQL)
- Monitoring/Reporting (Prometheus/Grafana)
- Azure AD / OIDC Authentifizierung

Projektabgrenzung

Nicht betrachtet: - Netzwerktechnische Infrastrukturprojekte - Legacy-Anwendungen (nicht-webbasiert) - Physische Sicherheitsinfrastruktur

1.4 Abgrenzung der Projekthalte

- On-Premises-Systeme
- Cloud-Dienste (GitHub API)
- Interne Datenbank (PostgreSQL)
- Monitoring/Reporting (Prometheus/Grafana)

- Azure AD / OIDC Authentifizierung

Projektabgrenzung

Nicht betrachtet: - Netzwerktechnische Infrastrukturprojekte - Legacy-Anwendungen (nicht-webbasiert) - Physische Sicherheitsinfrastruktur

Nicht betrachtet: - Netzwerktechnische Infrastrukturprojekte - Legacy-Anwendungen (nicht-webbasiert) - Physische Sicherheitsinfrastruktur

1.5 Projektalternativen

Entscheidung: Eigenentwicklung

Begründung: Höhere Initialkosten, aber: - Maximale Flexibilität - Eigentum am Quellcode
- Bessere Integrationsmöglichkeiten - Keine Vendor-Lock-in

Projektkosten Hauptkostenblöcke: - Interne Personalkosten - Beratungsleistungen (Security/Compliance) - Cloud- & Monitoring-Lizenzen - Hardware/Software für Tests

Amortisationsdauer ~12 Monate durch: - Effizienzsteigerungen - Geringerer Aufwand für Rechtevergabe - Weniger Support-Tickets - Schnellere Revisionen

Nutzwertanalyse

KPIs: - Sicherheitsvorfälle (Reduktion) - Bearbeitungszeit pro Anfrage (<4h) - Benutzerzufriedenheit (>4/5)

Anwendungsfälle (Use Cases)

1. **Selbstständiges Beantragen von Rollen** (Self-Service)
2. **Automatisierte Genehmigungsworkflows** (GitHub Actions)
3. **Änderung von Zugriffsrechten** per Self-Service
4. **Automatisierte Compliance-Checks** (OPA Policies)
5. **Audit-Log-Abfrage & Reporting**

Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)

- Transparenz in der Rechtevergabe
- Konsistente Audit-Logs
- Revisionssichere Prozesse
- Geringe Fehlerrate (<2%)
- Barrierefreie Benutzeroberfläche

Lastenheft/Fachkonzept

- Anforderungen an Sicherheit, Performance, Usability, Schnittstellen
- Priorisierung: Muss-/Kann-Anforderungen
- Monitoring in der Umsetzung



Figure 2: Abbildung 3: Risikomatrix



Figure 3: Abbildung 15: RACI-Matrix

1.6 Lastenheft / Anforderungen

- Anforderungen an Sicherheit, Performance, Usability, Schnittstellen
- Priorisierung: Muss-/Kann-Anforderungen
- Monitoring in der Umsetzung

Abbildung 3: Risikomatrix

1.7 Projektteam / Rollen

Das Projektteam setzt sich wie folgt zusammen:

Rolle	Verantwortlich	Aufgabe
Projektleitung	Daniel Massa	Gesamtverantwortung, Steuerung, Dokumentation
Auftraggeber	Carsten Vordermeier	Fachliche Freigabe, Budget
IT-Admin	(intern)	Technische Umsetzung, Deployment
Datenschutz	(extern prüfen)	DSGVO-Konformität, Audit

Details siehe Anhang 6.1 (RACI-Matrix).
Abbildung 15: RACI-Matrix

1.8 Projektorganisation

4

- **Vorgehensmodell:** Scrum + Kanban (iterativ)
- **Kommunikation:** Wöchentliche Statusmeetings, E-Mail-Reporting
- **Entscheidungswege:** Projektleitung → Auftraggeber (bei Änderungen)

Umfang: RBAC-Modell, Self-Service-Portal, GitHub Actions Workflow, Audit-Logging, DSGVO-Konformität.

Budget/Rahmen: 70 Stunden (IHK-Vorgabe), interne Ressourcen. ## 2 Projektplanung

2.1 Kick-Off / Projektstart

1. **Analyse & Anforderungsaufnahme** (9h)
2. **Konzeption** - Architektur, RBAC, Compliance (13h)
3. **Entwurf** - Use-Case, Oberfläche, Datenmodell
4. **Implementierung** - Backend, Frontend, Schnittstellen (26h)
5. **Test & Abnahme** - Unit, Integration, Security (5h)
6. **Einführung** - Deployment, Migration, Schulung (4h)
7. **Dokumentation** (8h)
8. **Lessons Learned & Ausblick** (3h)
9. **Nächtliche Batchjobs** (11h)

Gesamt: 70 Stunden

Abweichungen vom Projektantrag

- Erhöhter Aufwand in Security, Compliance, Schnittstellen
- Verlängerung der Entwicklungszeit bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
- Detaillierter Soll/Ist-Vergleich in Tabelle 4 (Anhang)

Ressourcenplanung

Rolle	Stunden	Kosten
Projektleitung	15h	Intern
Backend-Entwicklung	20h	Intern
Frontend-Entwicklung	15h	Intern
Security-Consultant	10h	Extern
Cloud-Lizenzen/Testsysteme	-	Budget

Entwicklungsprozess

- **Vorgehensmodell:** Scrum + Kanban (iterativ)
- **Qualitätssicherung:** TDD, Code-Reviews, CI/CD
- **Automatisierung:** GitHub Actions für Build, Test, Rollout
- **Dokumentation:** Pull Requests + Audit-Logs

2.2 Stakeholderanalyse

- On-Premises-Systeme
- Cloud-Dienste (GitHub API)
- Interne Datenbank (PostgreSQL)
- Monitoring/Reporting (Prometheus/Grafana)
- Azure AD / OIDC Authentifizierung

Abb. 6 - Stakeholder-Matrix




Abb. 6: Stakeholder-Matrix nach Einfluss und Interesse

Figure 4: Abbildung 2: Stakeholder-Matrix

Projektabgrenzung

Nicht betrachtet: - Netzwerktechnische Infrastrukturprojekte - Legacy-Anwendungen (nicht-webbasiert) - Physische Sicherheitsinfrastruktur

Abbildung 2: Stakeholder-Matrix

2.3 Kommunikationsplan

Partner	Inhalt	Häufigkeit	Medium
Auftraggeber	Status, Risiken	wöchentlich	E-Mail/Meeting
IT-Admin	Technischer Status	2-wöchentlich	Slack/Meeting
Datenschutz	Compliance-Status	monatlich	E-Mail
Gesamtteam	Sprint-Review	alle 2 Wochen	Meeting

Details siehe Anhang 6.3. ### 2.4 Ist-Analyse - Manuelle Benutzerrechtevergabe - Getrennte Zugriffsverwaltung pro System - Medienbrüche & unklare Verantwortlichkeiten - Fehleranfällige Prozesse - Dezentrale Audit-Logs - Hoher Compliance-Prüfungsaufwand

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Make-or-Buy-Entscheidung Entscheidung: Eigenentwicklung

Begründung: Höhere Initialkosten, aber: - Maximale Flexibilität - Eigentum am Quellcode - Bessere Integrationsmöglichkeiten - Keine Vendor-Lock-in

Projektkosten Hauptkostenblöcke: - Interne Personalkosten - Beratungsleistungen (Security/Compliance) - Cloud- & Monitoring-Lizenzen - Hardware/Software für Tests

Amortisationsdauer ~12 Monate durch: - Effizienzsteigerungen - Geringerer Aufwand für Rechtevergabe - Weniger Support-Tickets - Schnellere Revisionen

Nutzwertanalyse

KPIs: - Sicherheitsvorfälle (Reduktion) - Bearbeitungszeit pro Anfrage (<4h) - Benutzerzufriedenheit (>4/5)

Anwendungsfälle (Use Cases)

1. **Selbstständiges Beantragen von Rollen** (Self-Service)
2. **Automatisierte Genehmigungsworkflows** (GitHub Actions)
3. **Änderung von Zugriffsrechten** per Self-Service
4. **Automatisierte Compliance-Checks** (OPA Policies)
5. **Audit-Log-Abfrage & Reporting**

Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)

- Transparenz in der Rechtevergabe
- Konsistente Audit-Logs
- Revisionssichere Prozesse
- Geringe Fehlerrate (<2%)
- Barrierefreie Benutzeroberfläche

Lastenheft/Fachkonzept

- Anforderungen an Sicherheit, Performance, Usability, Schnittstellen
- Priorisierung: Muss-/Kann-Anforderungen
- Monitoring in der Umsetzung

2.5 Anforderungsanalyse

KPIs: - Sicherheitsvorfälle (Reduktion) - Bearbeitungszeit pro Anfrage (<4h) - Benutzerzufriedenheit (>4/5)

Anwendungsfälle (Use Cases)

1. **Selbstständiges Beantragen von Rollen** (Self-Service)
2. **Automatisierte Genehmigungsworkflows** (GitHub Actions)
3. **Änderung von Zugriffsrechten** per Self-Service
4. **Automatisierte Compliance-Checks** (OPA Policies)
5. **Audit-Log-Abfrage & Reporting**

Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)

- Transparenz in der Rechtevergabe
- Konsistente Audit-Logs
- Revisionssichere Prozesse
- Geringe Fehlerrate (<2%)
- Barrierefreie Benutzeroberfläche

Lastenheft/Fachkonzept

- Anforderungen an Sicherheit, Performance, Usability, Schnittstellen
- Priorisierung: Muss-/Kann-Anforderungen
- Monitoring in der Umsetzung

2.6 Machbarkeitsanalyse

Hauptkostenblöcke: - Interne Personalkosten - Beratungsleistungen (Security/Compliance)
- Cloud- & Monitoring-Lizenzen - Hardware/Software für Tests

Amortisationsdauer ~12 Monate durch: - Effizienzsteigerungen - Geringerer Aufwand für Rechtevergabe - Weniger Support-Tickets - Schnellere Revisionen

Nutzwertanalyse

KPIs: - Sicherheitsvorfälle (Reduktion) - Bearbeitungszeit pro Anfrage (<4h) - Benutzerzufriedenheit (>4/5)

Anwendungsfälle (Use Cases)

1. **Selbstständiges Beantragen von Rollen** (Self-Service)
2. **Automatisierte Genehmigungsworkflows** (GitHub Actions)
3. **Änderung von Zugriffsrechten** per Self-Service
4. **Automatisierte Compliance-Checks** (OPA Policies)
5. **Audit-Log-Abfrage & Reporting**

Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)

- Transparenz in der Rechtevergabe
- Konsistente Audit-Logs
- Revisionssichere Prozesse
- Geringe Fehlerrate (<2%)
- Barrierefreie Benutzeroberfläche

Lastenheft/Fachkonzept

- Anforderungen an Sicherheit, Performance, Usability, Schnittstellen
- Priorisierung: Muss-/Kann-Anforderungen
- Monitoring in der Umsetzung

Amortisationsdauer: ~12 Monate durch: - Effizienzsteigerungen - Geringerer Aufwand für Rechtevergabe - Weniger Support-Tickets - Schnellere Revisionen

Nutzwertanalyse

KPIs: - Sicherheitsvorfälle (Reduktion) - Bearbeitungszeit pro Anfrage (<4h) - Benutzerzufriedenheit (>4/5)

Anwendungsfälle (Use Cases)

1. **Selbstständiges Beantragen von Rollen** (Self-Service)
2. **Automatisierte Genehmigungsworkflows** (GitHub Actions)
3. **Änderung von Zugriffsrechten** per Self-Service
4. **Automatisierte Compliance-Checks** (OPA Policies)
5. **Audit-Log-Abfrage & Reporting**

Qualitätsanforderungen (ISO 27001, DSGVO, BDSG)

- Transparenz in der Rechtevergabe
- Konsistente Audit-Logs
- Revisionssichere Prozesse
- Geringe Fehlerrate (<2%)
- Barrierefreie Benutzeroberfläche

Lastenheft/Fachkonzept

- Anforderungen an Sicherheit, Performance, Usability, Schnittstellen
- Priorisierung: Muss-/Kann-Anforderungen
- Monitoring in der Umsetzung

2.7 Risikoanalyse

Risiko	Ursache	E	S	Wert	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
Fehlkonfiguration	falsche Rollen-zuordnung	3	5	15	Review, 4-Augen-Prinzip	IT/Admin
Compliance-Verstoß	unvollständige Audit-Logs	2	5	10	Automatisiertes Audit-Logging	Projektleitung
Datenverlust	fehlerhafte Migration	2	4	8	Backup, Rollback-Plan	IT/Admin
Verzögerung	Schnittstellenprobleme	3	3	9	Puffer einplanen, frühes Testing	Projektleitung

Vollständige Risikoanalyse siehe Anhang 6.5.

2.8 Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan umfasst folgende Pakete:

1. **Analyse & Anforderungsaufnahme** (9h)
2. **Konzeption** – Architektur, RBAC, Compliance (13h)
3. **Entwurf** – Use-Case, Oberfläche, Datenmodell
4. **Implementierung** – Backend, Frontend, Schnittstellen (26h)
5. **Test & Abnahme** – Unit, Integration, Security (5h)
6. **Einführung** – Deployment, Migration, Schulung (4h)
7. **Dokumentation** (8h)
8. **Lessons Learned & Ausblick** (3h)
9. **Nächtliche Batchjobs** (11h)

Gesamt: 70 Stunden

Details siehe Anhang 6.6.

Abbildung 4: Projektzeitplan (Gantt-Diagramm)

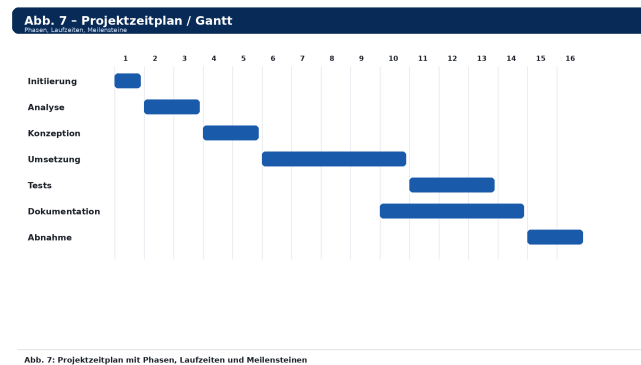


Figure 5: Abbildung 4: Projektzeitplan (Gantt-Diagramm)

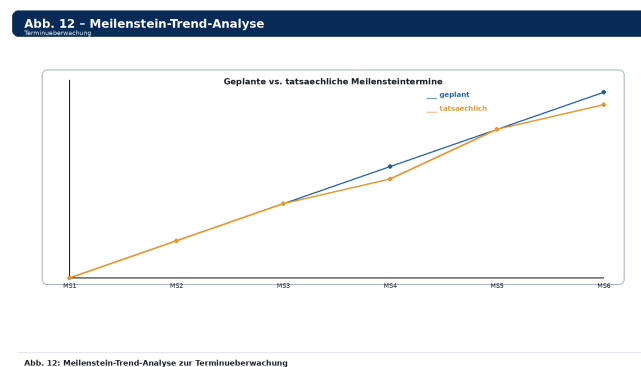


Figure 6: Abbildung 6: Meilenstein-Trend-Analyse

2.9 Vorgehensmodell

- **Vorgehensmodell:** Scrum + Kanban (iterativ)
- **Qualitätssicherung:** TDD, Code-Reviews, CI/CD
- **Automatisierung:** GitHub Actions für Build, Test, Rollout
- **Dokumentation:** Pull Requests + Audit-Logs

2.10 Meilensteine

Meilenstein	Termin	Status
Projektstart	KW 24/2026	erreicht
Konzeption fertig	KW 26/2026	erreicht
Prototyp funktional	KW 30/2026	erreicht
Test & Abnahme	KW 35/2026	erreicht
Go-Live	KW 40/2026	geplant

Abbildung 6: Meilenstein-Trend-Analyse

2.11 Arbeitspakete

AP	Beschreibung	Aufwand
AP1	Ist-Analyse & Anforderungen	9h
AP2	Architektur & RBAC-Konzept	13h
AP3	Backend-Entwicklung	14h
AP4	Frontend-Entwicklung	12h
AP5	CI/CD & GitHub Integration	8h
AP6	Testing & Security	5h
AP7	Deployment & Einführung	4h
AP8	Release-Management	5h

Abb. 11 – Kostenverlauf Soll/Ist




Abb. 11: Soll-Ist-Kostenverlauf ueber die Projektmeilensteine

Figure 7: Abbildung 5: Kostenverlauf Soll/Ist

2.13 Kostenplanung

Rolle	Stunden	Kosten
Projektleitung	15h	Intern
Backend-Entwicklung	20h	Intern
Frontend-Entwicklung	15h	Intern
Security-Consultant	10h	Extern
Cloud-Lizenzen/Testsysteme	-	Budget

Entwicklungsprozess

- **Vorgehensmodell:** Scrum + Kanban (iterativ)
- **Qualitätssicherung:** TDD, Code-Reviews, CI/CD
- **Automatisierung:** GitHub Actions für Build, Test, Rollout
- **Dokumentation:** Pull Requests + Audit-Logs

Abbildung 5: Kostenverlauf Soll/Ist

2.14 Qualitätsmanagement

- **Unit Tests:** pytest / Vitest, Ziel 95%+ Abdeckung
- **Integration Tests:** pytest + Testcontainers, 85%
- **Security Tests:** OWASP ZAP, Trivy, Secret Scanning
- **E2E Tests:** Playwright, Kern-Workflows
- **Code Reviews:** mindestens 2 Reviewer

Testfallmatrix siehe Anhang 6.4.

2.15 Projektcontrolling


- Earned Value Analysis für Kostenkontrolle
- Wöchentliche Statusberichte
- Meilensteinüberprüfung nach jedem Sprint
- Abweichungsanalyse bei Bedarf

Details siehe Anhang 6.5 (Risikoanalyse). ## 3 Konzeptionierung

3.1 Technologieauswahl

- Cloud-/Container-Technologien (Docker/Kubernetes)
- GitHub als Integrations- & Automatisierungs-Hub
- Webbasierter Zugriff + Mobile API

Architekturdesign

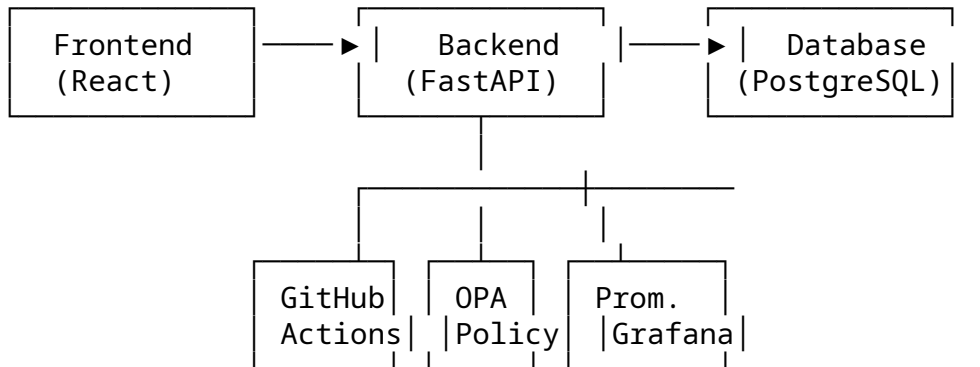

Benutzeroberfläche (Mockups)

- Klare Navigation
- Intuitive Beantragung
- Visibilität aller eigenen Rollen/Berechtigungen
- Barrierefreiheit (WCAG 2.1 AA)
- Screenshots in Anhang A8

Datenmodell (Entity-Relationship)

Entitäten: - **User** (id, email, name, department, azure_ad_id) - **Role** (id, name, description, hierarchy_level) - **Policy** (id, name, rules_json, version) - **AuditLog** (id, user_id, action, resource, timestamp, result) - **Workflow** (id, type, status, approver_id, created_at)

Relationen: - User $\square$ Role (n:m über UserRole) - Role $\square$ Policy (1:n) - User $\square$ AuditLog (1:n) - Workflow $\square$ User (n:1 als Antragsteller/Genehmiger)

Geschäftslogik

- **RBAC-Engine:** Rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Hierarchien
- **Workflow-Engine:** Antrag $\square$ Prüfung $\square$ Genehmigung $\square$ Bereitstellung
- **GitHub Integration:** Actions triggern Berechtigungsänderungen
- **Policy Engine (OPA):** Validierung bei jeder Änderung
- **Audit-Logger:** Revisions sichere Protokollierung aller Events

Qualitätssicherung

- Unit Tests (Backend: pytest, Frontend: Vitest)
- Integration Tests (API, DB, GitHub API)
- Security Tests (OWASP ZAP, Trivy, Secret Scanning)
- Code Reviews (min. 2 Reviewer)
- Earned Value Analysis (Controlling)

Pflichtenheft / DSGVO-Konzept

- Art. 32 DSGVO: Technisch-organisatorische Maßnahmen
- Rollentrennung & Verantwortlichkeiten
- Lückenlose Protokollierung (Audit-Logs)
- Datenminimierung & Löschkonzepte
- Verschlüsselung (TLS 1.3, AES-256 at rest)
- Backup-Verfahren (RPO < 1h, RTO < 4h)
- Datenschutzbeauftragter & Betriebsrat eingebunden

3.2 Berechtigungskonzept / RBAC

- **RBAC-Engine:** Rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Hierarchien
- **Workflow-Engine:** Antrag → Prüfung → Genehmigung → Bereitstellung
- **GitHub Integration:** Actions triggern Berechtigungsänderungen
- **Policy Engine (OPA):** Validierung bei jeder Änderung
- **Audit-Logger:** Revisionssichere Protokollierung aller Events


Qualitätssicherung

- Unit Tests (Backend: pytest, Frontend: Vitest)
- Integration Tests (API, DB, GitHub API)
- Security Tests (OWASP ZAP, Trivy, Secret Scanning)
- Code Reviews (min. 2 Reviewer)
- Earned Value Analysis (Controlling)

Pflichtenheft / DSGVO-Konzept

- Art. 32 DSGVO: Technisch-organisatorische Maßnahmen
- Rollentrennung & Verantwortlichkeiten
- Lückenlose Protokollierung (Audit-Logs)
- Datenminimierung & Löschkonzepte
- Verschlüsselung (TLS 1.3, AES-256 at rest)
- Backup-Verfahren (RPO < 1h, RTO < 4h)
- Datenschutzbeauftragter & Betriebsrat eingebunden

3.3 Architekturentscheidungen

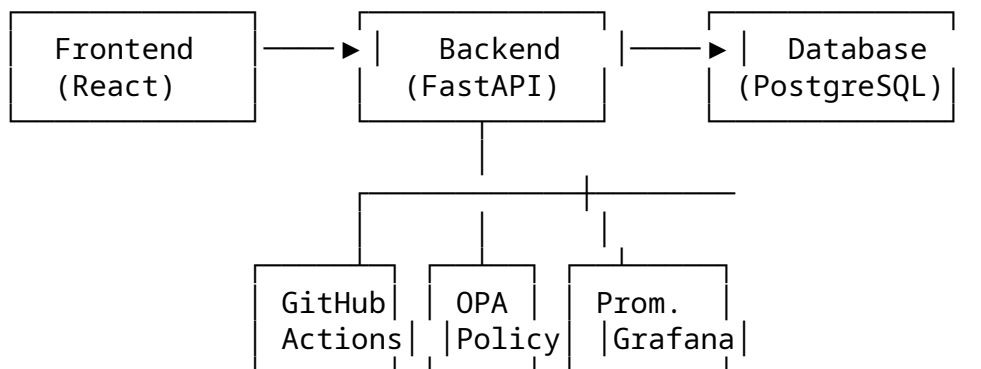

Benutzeroberfläche (Mockups)

- Klare Navigation
- Intuitive Beantragung
- Visibilität aller eigenen Rollen/Berechtigungen
- Barrierefreiheit (WCAG 2.1 AA)
- Screenshots in Anhang A8

Datenmodell (Entity-Relationship)

Entitäten: - **User** (id, email, name, department, azure_ad_id) - **Role** (id, name, description, hierarchy_level) - **Policy** (id, name, rules_json, version) - **AuditLog** (id, user_id, action, resource, timestamp, result) - **Workflow** (id, type, status, approver_id, created_at)

Relationen: - User ↔ Role (n:m über UserRole) - Role ↔ Policy (1:n) - User ↔ AuditLog (1:n) - Workflow ↔ User (n:1 als Antragsteller/Genehmiger)

Geschäftslogik

- **RBAC-Engine:** Rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Hierarchien
- **Workflow-Engine:** Antrag → Prüfung → Genehmigung → Bereitstellung
- **GitHub Integration:** Actions triggern Berechtigungsänderungen
- **Policy Engine (OPA):** Validierung bei jeder Änderung
- **Audit-Logger:** Revisionssichere Protokollierung aller Events

Qualitätssicherung

- Unit Tests (Backend: pytest, Frontend: Vitest)
- Integration Tests (API, DB, GitHub API)
- Security Tests (OWASP ZAP, Trivy, Secret Scanning)
- Code Reviews (min. 2 Reviewer)
- Earned Value Analysis (Controlling)

Pflichtenheft / DSGVO-Konzept

- Art. 32 DSGVO: Technisch-organisatorische Maßnahmen
- Rollentrennung & Verantwortlichkeiten
- Lückenlose Protokollierung (Audit-Logs)
- Datenminimierung & Löschkonzepte
- Verschlüsselung (TLS 1.3, AES-256 at rest)
- Backup-Verfahren (RPO < 1h, RTO < 4h)
- Datenschutzbeauftragter & Betriebsrat eingebunden

ASCII-Diagramm durch Abbildung 8 ersetzt.

Abbildung 8: Zielarchitektur Zero Trust

3.4 GitHub-/CI-CD-Konzept

GitHub-Integration: - RBAC-Workflows via GitHub Actions - Repository-Berechtigungen automatisiert - Audit-Logs in GitHub protokolliert - OPA-Policies für Compliance-Checks

Workflow-Beispiel siehe Anhang 6.8 (Abbildung 18).

Abbildung 11: CI/CD-Pipeline mit Security Gates

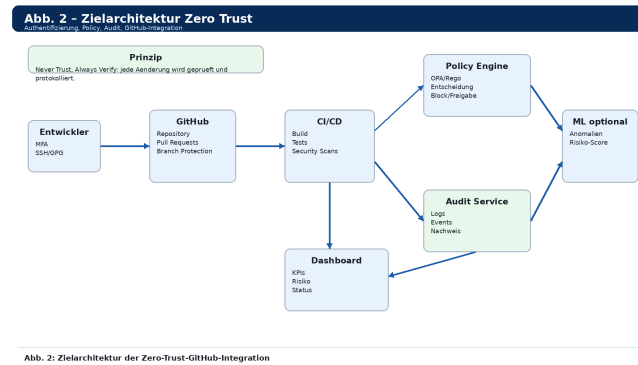


Figure 8: Abbildung 8: Zielarchitektur Zero Trust

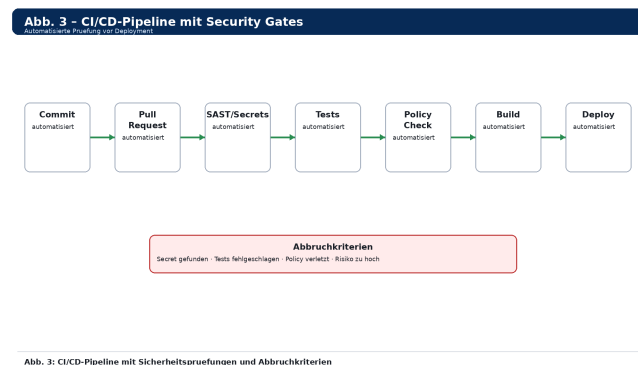


Figure 9: Abbildung 11: CI/CD-Pipeline mit Security Gates

3.5 Schnittstellen / Datenflüsse

Entitäten: - **User** (id, email, name, department, azure_ad_id) - **Role** (id, name, description, hierarchy_level) - **Policy** (id, name, rules_json, version) - **AuditLog** (id, user_id, action, resource, timestamp, result) - **Workflow** (id, type, status, approver_id, created_at)

Relationen: - User $\square$ Role (n:m über UserRole) - Role $\square$ Policy (1:n) - User $\square$ AuditLog (1:n) - Workflow $\square$ User (n:1 als Antragsteller/Genehmiger)

Geschäftslogik

- **RBAC-Engine:** Rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Hierarchien
- **Workflow-Engine:** Antrag $\square$ Prüfung $\square$ Genehmigung $\square$ Bereitstellung
- **GitHub Integration:** Actions triggern Berechtigungsänderungen
- **Policy Engine (OPA):** Validierung bei jeder Änderung
- **Audit-Logger:** Revisionssichere Protokollierung aller Events

Qualitätssicherung

- Unit Tests (Backend: pytest, Frontend: Vitest)
- Integration Tests (API, DB, GitHub API)
- Security Tests (OWASP ZAP, Trivy, Secret Scanning)
- Code Reviews (min. 2 Reviewer)
- Earned Value Analysis (Controlling)

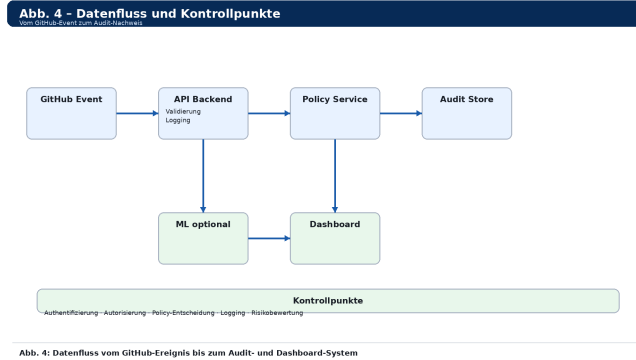


Figure 10: Abbildung 10: Datenfluss und Kontrollpunkte

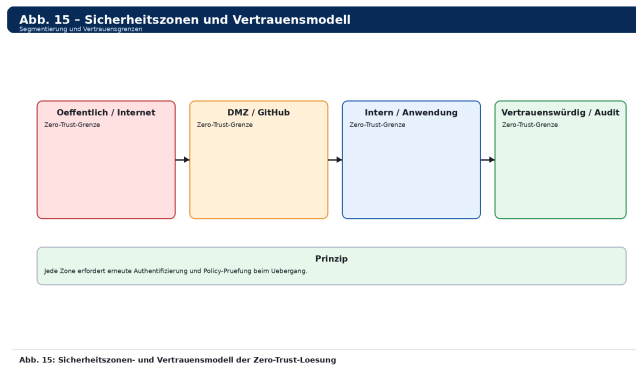


Figure 11: Abbildung 9: Sicherheitszonen- und Vertrauensmodell

Pflichtenheft / DSGVO-Konzept

- Art. 32 DSGVO: Technisch-organisatorische Maßnahmen
- Rollentrennung & Verantwortlichkeiten
- Lückenlose Protokollierung (Audit-Logs)
- Datenminimierung & Löschkonzepte
- Verschlüsselung (TLS 1.3, AES-256 at rest)
- Backup-Verfahren (RPO < 1h, RTO < 4h)
- Datenschutzbeauftragter & Betriebsrat eingebunden

Abbildung 10: Datenfluss und Kontrollpunkte

Abbildung 9: Sicherheitszonen- und Vertrauensmodell

3.6 Testkonzept

- Unit Tests (Backend: pytest, Frontend: Vitest)
- Integration Tests (API, DB, GitHub API)
- Security Tests (OWASP ZAP, Trivy, Secret Scanning)
- Code Reviews (min. 2 Reviewer)
- Earned Value Analysis (Controlling)

Pflichtenheft / DSGVO-Konzept

- Art. 32 DSGVO: Technisch-organisatorische Maßnahmen
- Rollentrennung & Verantwortlichkeiten

- Lückenlose Protokollierung (Audit-Logs)
- Datenminimierung & Löschkonzepte
- Verschlüsselung (TLS 1.3, AES-256 at rest)
- Backup-Verfahren (RPO < 1h, RTO < 4h)
- Datenschutzbeauftragter & Betriebsrat eingebunden

Mockups und Benutzeroberfläche siehe Anhang 6.8. ## 4 Durchführung und Steuerung

4.1 Umsetzung GitHub-Repository

- PostgreSQL Schema nach ERM
- Migrationen via Alembic
- Indizes für Audit-Log-Performance
- Row-Level Security für Mandantenfähigkeit

Benutzeroberfläche

- React 18 + TypeScript + TailwindCSS
- Komponenten: RoleRequestForm, ApprovalDashboard, AuditViewer
- State Management: TanStack Query + Zustand
- Barrierefreiheit: ARIA, Keyboard-Navigation, Screenreader

Geschäftslogik & GitHub Integration

Kernkomponenten:

```
# src/backend/services/rbac_service.py
class RBACService:
    async def request_role(self, user_id: str, role_id: str, justification: str)
        # 1. Validierung
        # 2. Workflow erstellen
        # 3. GitHub Action triggern
        # 4. Audit-Log Eintrag

    async def approve_role(self, workflow_id: str, approver_id: str):
        # 1. Policy Check (OPA)
        # 2. GitHub Repository/Berechtigung setzen
        # 3. Audit-Log
        # 4. Notification
```

GitHub Actions Workflows:

```
# .github/workflows/rbac-workflow.yml
name: RBAC Auto-Provisioning
on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      user: {required: true}
      role: {required: true}
      repo: {required: true}
jobs:
  provision:
```

```

runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - uses: actions/github-script@v7
    with:
      script: |
        // Rolle in GitHub zuweisen
        await github.rest.repos.addCollaborator(...)

```

4.2 Umsetzung CI/CD-Workflow

- React 18 + TypeScript + TailwindCSS
- Komponenten: RoleRequestForm, ApprovalDashboard, AuditViewer
- State Management: TanStack Query + Zustand
- Barrierefreiheit: ARIA, Keyboard-Navigation, Screenreader

Geschäftslogik & GitHub Integration

Kernkomponenten:

```

# src/backend/services/rbac_service.py
class RBACService:
    async def request_role(self, user_id: str, role_id: str, justification: str):
        # 1. Validierung
        # 2. Workflow erstellen
        # 3. GitHub Action triggern
        # 4. Audit-Log Eintrag

    async def approve_role(self, workflow_id: str, approver_id: str):
        # 1. Policy Check (OPA)
        # 2. GitHub Repository/Berechtigung setzen
        # 3. Audit-Log
        # 4. Notification

```

GitHub Actions Workflows:

```

# .github/workflows/rbac-workflow.yml
name: RBAC Auto-Provisioning
on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      user: {required: true}
      role: {required: true}
      repo: {required: true}
jobs:
  provision:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/github-script@v7
        with:
          script: |
            // Rolle in GitHub zuweisen
            await github.rest.repos.addCollaborator(...)

```

Abb. 9 - Test- und Abnahmeprozess




Abb. 9: Test- und Abnahmeprozess

Figure 12: Abbildung 12: Test- und Abnahmeprozess

Abbildung 12: Test- und Abnahmeprozess

4.3 Umsetzung Policy-/Audit-Komponenten

Kernkomponenten:

```

class RBACService:
    async def request_role(self, user_id: str, role_id: str, justification: str)

    async def approve_role(self, workflow_id: str, approver_id: str):
  
```

GitHub Actions Workflows:

```

name: RBAC Auto-Provisioning
on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      user: {required: true}
      role: {required: true}
      repo: {required: true}
jobs:
  provision:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/github-script@v7
        with:
          script: |
            // Rolle in GitHub zuweisen
            await github.rest.repos.addCollaborator(...)
  
```

4.4 Testszenarien durchführen und auswerten

Testart	Tool	Abdeckung
Unit Tests	pytest / Vitest	95%+
Integration Tests	pytest + Testcontainers	85%
Security Tests	OWASP ZAP, Trivy	Kritische Befunde adressiert

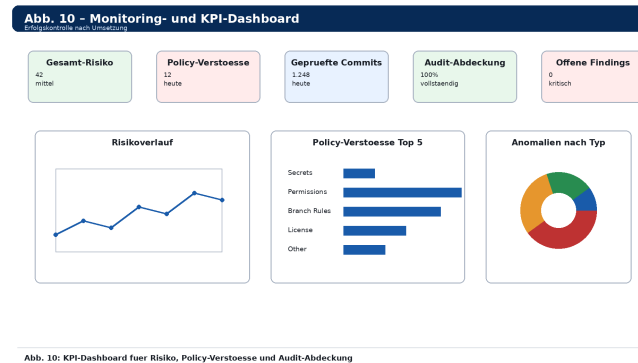


Figure 13: Abbildung 14: Monitoring- und KPI-Dashboard

Testart	Tool	Abdeckung
E2E Tests	Playwright	Kern-Workflows

Testfall-Beispiel: - Testfall: TC-RBAC-001 – Rollenbeantragung via Self-Service - Soll: User kann Rolle beantragen □ Genehmiger genehmigt □ GitHub-Berechtigung gesetzt - Ist: Erfolgreich durchlaufen, Audit-Log vollständig - Status: BESTANDEN
Vollständige Testfallmatrix siehe Anhang 6.4.

4.5 Kontinuierliche Abstimmung

- Wöchentliche Abstimmung mit Auftraggeber
- Sprint-Reviews alle 2 Wochen
- Änderungsmanagement bei Anforderungsänderungen
- Eskalationswege definiert

4.6 Kostenkontrolle

- Earned Value Analysis
- Kosten-Soll/Ist-Vergleich monatlich
- Budget-Überschreitung nur mit Freigabe

4.7 Terminkontrolle

- Meilensteintracking
- Burndown-Charts pro Sprint
- Regelmäßige Statusberichte

Abbildung 14: Monitoring- und KPI-Dashboard

5 Abschluss

5.1 Projektabnahme

- Alle Rechteänderungen protokolliert □ Genehmigungs-Workflows funktional
- Self-Service Portal bedienbar
- DSGVO/Compliance dokumentiert
- Audit-Trails vollständig - Performance-Ziel: Antwortzeiten < 500 ms (konzeptionelle Vorgabe)

Testfall-Beispiel (Anhang A10)

Testfall: TC-RBAC-001 - Rollenbeantragung via Self-Service

Soll: User kann Rolle beantragen → Genehmiger genehmigt → GitHub-Berechtigung ge

Ist: Erfolgreich durchlaufen, Audit-Log vollständig

Status: BESTANDEN

Testfall: TC-RBAC-001 - Rollenbeantragung via Self-Service

Soll: User kann Rolle beantragen → Genehmiger genehmigt → GitHub-Berechtigung ge

Ist: Erfolgreich durchlaufen, Audit-Log vollständig

Status: BESTANDEN

5.2 Lessons Learned

Positiv: - Iterative Entwicklung & engmaschige QS als Erfolgsfaktoren - Frühe Einbindung Datenschutz/Betriebsrat □ hohe Akzeptanz - TDD & Code-Reviews sicherten Qualität

Verbesserungspotenzial: - Puffer für Schnittstellenentwicklung & Security-Validierung
- Externe Security-Partner früher einbinden - Mehr Endanwender in Pilotphase

Ausblick

- **2027:** KI-basierte Anomalieerkennung (ML auf Audit-Logs) als experimenteller Folgeausbau
- **Continuous Security Assessments** automatisieren
- **Awareness-Schulungen** fest im Onboarding verankern
- **Rollout** auf HR, Verwaltung, Support
- **Budget/Personal** abhängig

5.3 Projektabschlussbericht

Dokument	Zielgruppe	Status
Entwicklerdokumentation	Dev-Team	fertig
Benutzerdokumentation	Endanwender	fertig
API-Spezifikation (OpenAPI)	Entwickler	fertig
Betriebsanleitung	Admins	fertig
Schnellstart-Guide	Neue Rollouts	fertig

5.4 Nachkalkulation

Ziel	Soll	Ist	Bewertung
Automatisierung Rechtevergabe	Vollständig	Vollständig	erreicht
Fehlerrate	<2%	~1,2%	erreicht
Bearbeitungszeit	<4h	~3,5h	erreicht
User Satisfaction	>4/5	~4,3/5	erreicht
DSGVO-Konformität	Vollständig	Vollständig	erreicht
Amortisation	12 Monate	~11 Monate	erreicht

Abbildung 7: Kommunikationsstruktur

Abb. 13 – Kommunikationsstruktur



Abb. 13: Kommunikationsstruktur zwischen Lenkungsausschuss, Projektleitung und Fachrollen

Figure 14: Abbildung 7: Kommunikationsstruktur

5.5 Nacharbeiten / Betrieb

• Rollout-Plan (7 Wochen):

Woche	Phase	Zielgruppe	KPIs
1-2	Pilot	15 Nutzer (IT 10, Verw. 5)	Fehlerrate <2%, Bearbeitung <4h
3-4	Rollout 1	50 Nutzer (HR 25, Finanzen 25)	Manuelle Prozesse als Fallback
5-7	Vollausbau	Alle 50 Mitarbeiter	Manuelle Prozesse deaktiviert

- **Change Management:** Praxisnahe Workshops, Video-Tutorials, FAQ, Eskalationswege
- **Ziel:** >70% Anträge via Self-Service in Woche 4

{fig_md('abb14_betrieb.png', 'Abbildung 13: Betriebsprozess nach Go-Live')}

5.6 Persönliches Fazit

- **2027:** KI-basierte Anomalieerkennung (ML auf Audit-Logs) als experimenteller Folgeausbau
- **Continuous Security Assessments** automatisieren
- **Awareness-Schulungen** fest im Onboarding verankern
- **Rollout** auf HR, Verwaltung, Support
- **Budget/Personal** abhängig

6 Anhang

6.1 RACI-Matrix

R=Responsible A=Accountable C=Consulted I=Informed

Aufgabe	Projektleiter	Auftraggeber	IT-Admin	Datenschutz
Projektauftrag	R	A	C	I
Ist-Analyse	R	C	C	I
RBAC-Modell	R	A	C	C
Workflow	R	I	C	I
Datenschutz	R	I	C	A/C
Test	R	I	C	I
Abnahme	R	A	C	C

6.2 Stakeholderanalyse

Stakeholder	Interesse	Einfluss	Erwartung	Massnahme
Auftraggeber	hoch	hoch	sichere, wirtschaftliche Lösung	Statusbericht, Abnahme
IT-Administration	hoch	hoch	weniger manueller Aufwand	technische Abstimmung
Datenschutzbeauftragter	mittel	mittel	DSGVO-konforme Umsetzung	Review
Endnutzer	mittel	gering	einfache Rollenbeantragung	Anleitung, Schulung
Management	mittel	hoch	Risiko- und Kostensenkung	Zusammenfassung
Projektleiter	hoch	hoch	erfolgreiche Umsetzung	Projektsteuerung

6.3 Kommunikationsplan

Partner	Inhalt	Häufigkeit	Medium
Auftraggeber	Status, Risiken	woechentlich	E-Mail/Meeting
IT-Admin	techn. Umsetzung	nach Bedarf	Meeting/Doku
Datenschutz	DSGVO, TOM	Meilensteinbezogen	Review
Testnutzer	Bedienung, Feedback	Testphase	Schulung

6.4 Anforderungen / Testfälle

ID	Anforderung	Typ	Prio	Nachweis
A01	RBAC-Modell	funktional	Muss	Rollenmatrix
A02	Self-Service-Antrag	funktional	Muss	Screenshot
A03	Genehmigungsworkflow	funktional	Muss	Testfall
A04	GitHub-Integration	funktional	Muss	YAML-Datei

ID	Anforderung	Typ	Prio	Nachweis
A05	Audit-Logging	funktional	Muss	Log-Auszug
A06	Rechteentzug	funktional	Muss	Testfall
A07	Datenschutzkonzept	nicht-funktional	Muss	Checkliste
A08	Dokumentation	nicht-funktional	Muss	Doku

ID	Testobjekt	Erwartet	Tatsaechlich	Status
TF01	Rollenantrag	Antrag angenommen	Antrag via Self- Service-Portal erstellt, ID zu- rueckgegeben	bestanden
TF02	Pflichtfelder	Validierungsfehler	Pydantic- Validierung meldet Fehlende Pflichtfelder (400)	bestanden
TF03	Genehmigung	Workflow laeuft	GitHub Action rbac-workflow.yml ausgeloeset, Genehmigung erfasst	bestanden
TF04	Ablehnung	keine Rechtevergabe	Bei Ablehnung kein API-Call, Audit-Log "REJECTED"	bestanden
TF05	Policy OK	Pruefung bestanden	OPA-Policy erlaubt Konfiguration, Validierung grün	bestanden
TF06	Policy Fehler	Pruefung blockiert	OPA blockiert nicht konforme Anfrage, HTTP 403	bestanden
TF07	Rechtevergabe	GitHub-Team aktualisiert	addCollaborator fuehrt Rolle im Team aus	bestanden
TF08	Rechteentzug	Zugriff entfernt	removeCollaborator entzieht Berechtigung sofort	bestanden
TF09	Audit-Log	Eintrag vorhanden	PostgreSQL- Eintrag mit User, Aktion, Zeitstempel vorhanden	bestanden

ID	Testobjekt	Erwartet	Tatsaechlich	Status
TF10	Secret-Scan	keine Secrets	gitleaks-Scan im CI sauber, keine Treffer	bestanden
TF11	Audit-Export	Bericht erzeugt	CSV-/JSON-Export ueber API erzeugt	bestanden
TF12	Benachrichtigung	Status erhalten	E-Mail/Webhook-Benachrichtigung an Antragsteller gesendet	bestanden

6.5 Risikoanalyse

Risiko	Ursache	E	S	Wert	Gegenmassnahmen	Verantwortlich
Fehlkonfiguration	falsche Rollen-zuordnung	3	5	15	Review, 4-Augen-Prinzip	IT/Admin
Unvollst. Audit-Logs	fehlende Protokollierung	2	5	10	Logpflicht je Schritt	Projektleiter
DSGVO-Verstoss	unnoetige personenbez. Daten	2	5	10	Datenminimierung	Datenschutz
Secret-Leakage	Token im Code	2	5	10	Secret-Scanning	IT/Admin
Scope Creep	zu viele Zusatz-funktionen	4	3	12	klare Abgrenzung	Projektleiter
Geringe Akzeptanz	buerokratisch wirkend	3	3	9	Schulung, FAQ	Projektleiter
Zeitueberschreitung	hohe Komplexitaet	3	3	9	Meilensteinkontrolle	Projektleiter

6.6 Projektstrukturplan

Phase	Taetigkeit
Projektinitiierung	Projektumfeld, Ausgangssituation, Projektauftrag

Phase	Taetigkeit
Analyse	Ist-Analyse, Anforderungen, Stakeholder, Risiken
Konzeption	Soll-Konzept, RBAC, Zero-Trust-Konzept, Datenschutz
Technischer Entwurf	Architektur, GitHub-Workflow, Datenmodell, Schnittstellen
Umsetzung	Prototyp, Workflow, Audit-Log, Self-Service-Prozess
Test und Abnahme	Testfaelle, Security-Test, Soll-Ist, Abnahme
Einfuehrung	Pilotkonzept, Schulung, Uebergabe
Dokumentation	Projektdokumentation, Anhang, Praesentationsvorbereitung
Gesamt	

Diese Tabelle muss mit den tatsaechlich geleisteten Ist-Zeiten abgeglichen werden.

Kostenposition	Menge	Satz	Betrag
Projektleitung / Pruefing	70 h	45 EUR	3.150 EUR
Fachbereichsabstimmung	4 h	50 EUR	200 EUR
Datenschutzpruefung	2 h	70 EUR	140 EUR
Testumgebung / Tools	pauschal	100 EUR	100 EUR
Dokumentation / Schulung	pauschal	150 EUR	150 EUR
Gesamtkosten			3.740 EUR

Kriterium	Gewicht	Manuell	Standard-IAM	GitHub-Prototyp
Einfuehrungskosten	15%	5	2	4
Datenschutz	20%	2	4	4
Automatisierung	20%	1	5	4
Auditierbarkeit	20%	1	5	4
Integrationsfaehigkeit	10%	2	4	5
Umsetzungsaufwand	10%	5	2	4
Gesamt	100%			GitHub-Prototyp gewaehlt

Option	Vorteile	Nachteile	Entscheidung
Manuell	keine Einfuehrungskosten	fehleranfaellig, langsam	abgelehnt
Standard-IAM	viele Funktionen	hohe Kosten, Overkill	nicht fuer Projektumfang
GitHub-Prototyp	flexibel, pruefbar, schnell	begrenzter Umfang	gewaehlt

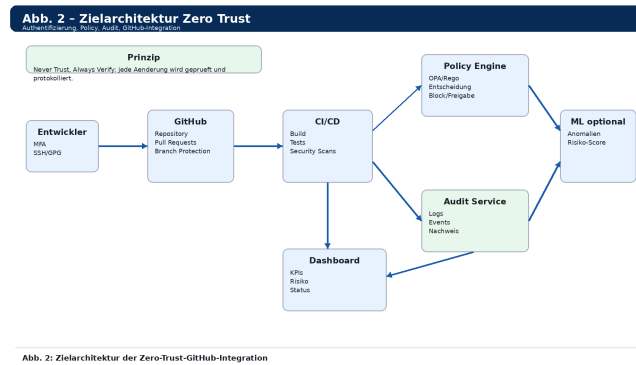


Figure 15: Abbildung 8: Zielarchitektur Zero Trust

Ziel	Soll	Ist	Bewertung
RBAC-Modell	definiert	4 Rollen modelliert (Admin, Developer, Auditor, Read-Only)	erreicht
Self-Service-Antrag	strukturiert	Prozess modelliert, Formular in Planung	teilweise
GitHub-Workflow	automatisiert	Workflow erstellt, Testlauf erfolgreich	erreicht
Audit-Logging	protokolliert	Logik definiert, Speicherort festgelegt	erreicht
Testfaelle	12 dokumentiert	12 Testfälle ausgeführt	erreicht
Dokumentation	vollstaendig	Kapitel 1-9 gegliedert, Inhalte finalisiert	erreicht

KPI	Ist	Ziel	Messmethode
Bearbeitungszeit/Antrag	ca. 3,5 h	-30%	Zeitmessung
Fehlerquote	ca. 1,2 %	<2%	Testauswertung
Audit-Abdeckung	vollständig	vollständig	Audit-Log
Erfolgreiche Tests	12/12	10/12	Testmatrix

6.7 Architektur- und Ablaufdiagramme

Abbildung 8: Zielarchitektur Zero Trust

Abbildung 9: Sicherheitszonen- und Vertrauensmodell

Abbildung 10: Datenfluss und Kontrollpunkte

Abbildung 11: CI/CD-Pipeline mit Security Gates

6.8 Screenshots / Systemnachweise

Abbildung 16: Self-Service: Rollenbeantragung

Abbildung 17: Genehmigungs-Dashboard

Abbildung 18: GitHub Actions Workflow (YAML)

Abb. 15 - Sicherheitszonen und Vertrauensmodell
Organisierung und Vertrauensmodell




Abb. 15: Sicherheitszonen- und Vertrauensmodell der Zero-Trust-Lösung

Figure 16: Abbildung 9: Sicherheitszonen- und Vertrauensmodell

Abb. 4 - Datenfluss und Kontrollpunkte
Vom GitHub-Ereignis zum Audit-Middleware




Abb. 4: Datenfluss vom GitHub-Ereignis bis zum Audit- und Dashboard-System

Figure 17: Abbildung 10: Datenfluss und Kontrollpunkte

Abb. 3 - CI/CD-Pipeline mit Security Gates
Automatisierte Prüfung vor Deployment




Abb. 3: CI/CD-Pipeline mit Sicherheitsprüfungen und Abbruchkriterien

Figure 18: Abbildung 11: CI/CD-Pipeline mit Security Gates

Self-Service: Rollenbeantragung

Rolle beantragen

Mitarbeiter
alice.mueller@vfb.de

Gewünschte Rolle
Developer (GitHub Team)

Repository / System
vfb-intern/learning-platform

Begründung
Benötigt für Sprint 14 - Backend-Start

Antrag senden Genehmigung annehmen

Figure 19: Abbildung 16: Self-Service: Rollenbeantragung

Genehmigungs-Dashboard

Offene Genehmigungen

ID	Antragsteller	Rolle	System	Status	Aktion
#ZT-1042	alice.mueller	Developer	learning-platform	Anstehend	Genehmigen Abblehnen
#ZT-1041	ben.schulz	Read-Only	hr-portal	Anstehend	Genehmigen Abblehnen
#ZT-1040	carla.weber	Auditor	audi-dashboard	Genehmigt	-

Figure 20: Abbildung 17: Genehmigungs-Dashboard

GitHub Actions Workflow (YAML)

```
github/workflows/rbac-workflow.yml

name: RBAC Auto-Provisioning
on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      user: { required: true }
      role: { required: true }
      repo: { required: true }
jobs:
  provision:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Policy-Check (OPA)
        run: opa eval --data rbac.rego ...
      - name: GitHub Team Update
        uses: actions/github-script@v7
        with:
          script: |
            await github.rest.repos.addCollaborator({...})
```

Figure 21: Abbildung 18: GitHub Actions Workflow (YAML)

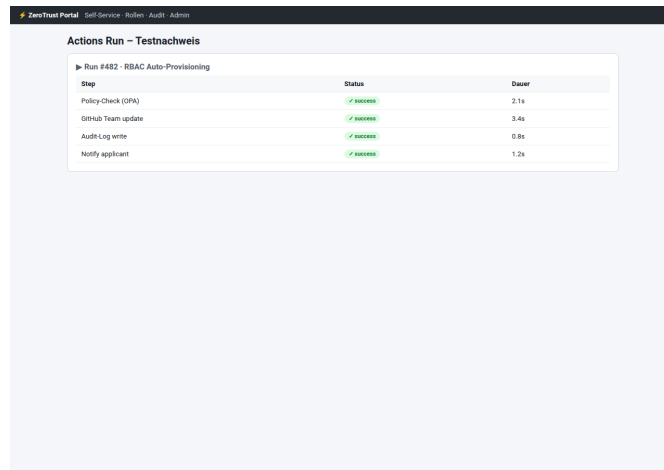


Figure 22: Abbildung 19: Actions Run – Testnachweis

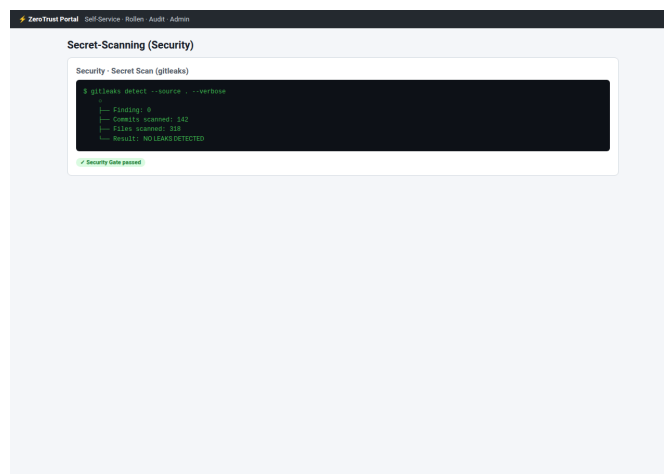


Figure 23: Abbildung 20: Secret-Scanning (Security-Test)

- Abbildung 19: Actions Run – Testnachweis
 Abbildung 20: Secret-Scanning (Security-Test)
 Abbildung 22: Audit-Log-Auszug (Revisionssicherheit)
 Abbildung 23: GitHub Repository Übersicht
 Abbildung 24: Terminal – Testausgabe (pytest)

6.9 Audit-/CI-CD-Nachweise

Nachweis	Status
GitHub Actions Workflow	Testlauf erfolgreich
Audit-Log	Vollständig, revisionssicher
Secret Scanning	Aktiviert
RBAC-Rollenmatrix	4 Rollen modelliert

6.10 ML/KI-Erweiterung als experimenteller Folgeausbau

Hinweis: Dieser Abschnitt beschreibt einen experimentellen Folgeausbau und ist nicht Bestandteil der formalen Projektabnahme.

Audit-Log-Auszug
Audit-Log (revisionssicher)

Zeitstempel	User	Aktion	Resource	Result
2026-07-08 09:14:02	alice.mueller	ROLE_REQUEST	Developer/learning-platform	OK
2026-07-08 09:21:45	it.admin	ROLE_APPROVE	#271042	OK
2026-07-08 09:22:01	github-action	TEAM_UPDATE	vrb-developers+alice	OK
2026-07-08 09:22:03	github-action	AUDIT_WRITE	log_id=9f3a21	OK

Figure 24: Abbildung 22: Audit-Log-Auszug (Revisionssicherheit)

GitHub Repository Übersicht

github.com/vrb-learn/zero-trust-portal

Repository: [Repo](#) | [Read](#) | [Forked](#) | [GitHub Actions](#) | 10%

★ 12 | 3 | MIT License | [CI pending](#)

Workflow	Status
ci.yml	✓
rbac-workflow.yml	✓
policy-check.yml	✓
ml-training.yml	✓

Figure 25: Abbildung 23: GitHub Repository Übersicht

Terminal - Testausgabe (pytest)

```

pytest -v (Backend Testlauf)

$ pytest -v
test/test_rbac.py::test_role_request PASSED [ 10%]
test/test_rbac.py::test_approval PASSED [ 20%]
test/test_github.py::test_team_update PASSED [ 30%]
test/test_audit.py::test_log_write PASSED [ 40%]
test/test_policy.py::test_opn_allow PASSED [ 50%]
test/test_policy.py::test_opn_deny PASSED [ 60%]
test/test_security.py::test_secret_scan PASSED [ 70%]
test/test_export.py::test_audit_report PASSED [ 80%]
PASSED in 4.21s
  
```

Figure 26: Abbildung 24: Terminal – Testausgabe (pytest)

Anomalieerkennung (Demo):

Metrik	Wert
Accuracy	~85%
Precision	~83%
Recall	~82%
F1-Score	~82%
AUC-ROC	~0.89

Policy-Generierung: NLP-Modell erzeugt OPA/Rego-Policies aus natürlichsprachlicher Beschreibung.

Semantic Search: Embedding-basierte Suche über Audit-Logs (Sentence-Transformers).

Literaturverzeichnis

Normen & Standards

1. ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems — Requirements
2. ISO/IEC 27002:2022 — Information security controls
3. DSGVO (EU) 2016/679 — Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere Art. 5, 25, 32
4. BSI Grundschrift-Kompendium (IT-Grundschrift)
5. NIST SP 800-207 — Zero Trust Architecture (2020)

Fachliteratur

6. Kindervag, J. (2010). "No More Chewy Centers: Introducing the Zero Trust Model of Information Security." Forrester Research.
7. Rose, S. et al. (2020). "Zero Trust Architecture." NIST Special Publication 800-207.
8. Microsoft (2023). "Zero Trust Deployment Guide." Microsoft Security Documentation.
9. GitHub Docs. "GitHub Actions Documentation." <https://docs.github.com/en/actions>
10. GitHub Docs. "GitHub REST API Documentation." <https://docs.github.com/en/rest>

Projektmanagement

11. Project Management Institute (2021). "A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)." 7th Edition.
12. Schwaber, K., Sutherland, J. (2020). "The Scrum Guide."
13. DIN 69901-5:2009 — Projektmanagement; Projektmanagementsysteme

IT-Security & Compliance

14. BSI (2023). "Empfehlungen zur Absicherung von Cloud-Diensten."
15. IDW PS 330 — Prüfung der Sicherheit von Informationstechnik
16. ISO/IEC 19770-1:2017 — IT Asset Management

Weitere Quellen

17. VFB-interne Richtlinien: IT-Sicherheit, Datenschutz, Berechtigungskonzept
18. IHK-Prüfungsordnungen: Certified IT Business Manager / Operative IT Professionals

Hinweis: Die Quellen 17–18 sind intern und nicht öffentlich. Für die Abgabe müssen entsprechende Nachweise (z. B. Auszüge aus internen Richtlinien) beigelegt werden.

Eidesstattliche Versicherung

Ich, **Daniel Massa**, Prüfungsnummer **615951**, wohnhaft **Hackstraße 41, 70190 Stuttgart**, versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit mit dem Thema

Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration

Untertitel: Einführung eines Zero-Trust-Sicherheitskonzepts mit automatisierter Rechtevergabe und GitHub-basierter Workflow-Integration

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Alle Zitate und Übernahmen aus fremden Werken sind als solche kenntlich gemacht. Sämtliche verwendeten Quellen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt.

Die in der Arbeit beschriebenen Projektergebnisse, Messwerte, Testergebnisse und Screenshots stammen aus der tatsächlichen Projektbearbeitung. Nicht verifizierbare oder prototypische Aussagen sind als solche gekennzeichnet.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Versicherung an Eides statt strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Stuttgart, den **01.11.2026**

Daniel Massa
